Příloha 2: Harmonogram prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**DUO+MULTIFLEX var.1**	**77 dny**	**01.07. 21**	**15.10. 21**
2	**Stěny bílé vany**	**10 dny**	**01.07. 21**	**14.07. 21**
3	Bednění	1 den	01.07. 21	01.07. 21
4	Armování	2 dny	02.07. 21	05.07. 21
5	Betonáž	1 den	06.07. 21	06.07. 21
6	Odbednění	1 den	14.07. 21	14.07. 21
7	**Stěny kolektoru**	**10 dny**	**15.07. 21**	**28.07. 21**
8	Bednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
9	Armování	2 dny	16.07. 21	19.07. 21
10	Betonáž	1 den	20.07. 21	20.07. 21
11	Odbednění	1 den	28.07. 21	28.07. 21
12	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**29.07. 21**	**13.08. 21**
13	Bednění	2 dny	29.07. 21	30.07. 21
14	Armování	3 dny	02.08. 21	04.08. 21
15	Betonáž	1 den	05.08. 21	05.08. 21
16	Odbednění	1 den	13.08. 21	13.08. 21
17	**Stěny podchodu**	**19 dny**	**16.08. 21**	**09.09. 21**
18	Bednění	2 dny	16.08. 21	17.08. 21
19	Armování	9 dny	18.08. 21	30.08. 21
20	Betonáž	2 dny	31.08. 21	01.09. 21
21	Odbednění	1 den	09.09. 21	09.09. 21
22	**Strop podchodu**	**14 dny**	**10.09. 21**	**29.09. 21**
23	Bednění	2 dny	10.09. 21	13.09. 21
24	Armování	5 dny	14.09. 21	20.09. 21
25	Betonáž	1 den	21.09. 21	21.09. 21
26	Odbednění	1 den	29.09. 21	29.09. 21
27	**Zábradlí**	**12 dny**	**30.09. 21**	**15.10. 21**
28	Bednění	2 dny	30.09. 21	01.10. 21
29	Armování	3 dny	04.10. 21	06.10. 21
30	Betonáž	1 den	07.10. 21	07.10. 21
31	Odbednění	1 den	15.10. 21	15.10. 21
32	**DUO+SKYDECK var.1**	**76 dny**	**01.07. 21**	**14.10. 21**
33	**Stěny bílé vany**	**10 dny**	**01.07. 21**	**14.07. 21**
34	Bednění	1 den	01.07. 21	01.07. 21
35	Armování	2 dny	02.07. 21	05.07. 21
36	Betonáž	1 den	06.07. 21	06.07. 21
37	Odbednění	1 den	14.07. 21	14.07. 21
38	**Stěny kolektoru**	**10 dny**	**15.07. 21**	**28.07. 21**
39	Bednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
40	Armování	2 dny	16.07. 21	19.07. 21
41	Betonáž	1 den	20.07. 21	20.07. 21
42	Odbednění	1 den	28.07. 21	28.07. 21
43	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**29.07. 21**	**13.08. 21**
44	Bednění	2 dny	29.07. 21	30.07. 21
45	Armování	3 dny	02.08. 21	04.08. 21
46	Betonáž	1 den	05.08. 21	05.08. 21
47	Odbednění	1 den	13.08. 21	13.08. 21
48	**Stěny podchodu**	**19 dny**	**16.08. 21**	**09.09. 21**
49	Bednění	2 dny	16.08. 21	17.08. 21
50	Armování	9 dny	18.08. 21	30.08. 21
51	Betonáž	2 dny	31.08. 21	01.09. 21
52	Odbednění	1 den	09.09. 21	09.09. 21
53	**Strop podchodu**	**13 dny**	**10.09. 21**	**28.09. 21**
54	Bednění	1 den	10.09. 21	10.09. 21
55	Armování	5 dny	13.09. 21	17.09. 21
56	Betonáž	1 den	20.09. 21	20.09. 21
57	Odbednění	1 den	28.09. 21	28.09. 21
58	**Zábradlí**	**12 dny**	**29.09. 21**	**14.10. 21**
59	Bednění	2 dny	29.09. 21	30.09. 21
60	Armování	3 dny	01.10. 21	05.10. 21
61	Betonáž	1 den	06.10. 21	06.10. 21
62	Odbednění	1 den	14.10. 21	14.10. 21
63	**DUO+MULTIFLEX var.2**	**68 dny**	**01.07. 21**	**04.10. 21**
64	**Stěny bílé vany**	**10 dny**	**01.07. 21**	**14.07. 21**
65	Bednění	1 den	01.07. 21	01.07. 21
66	Armování	2 dny	02.07. 21	05.07. 21
67	Betonáž	1 den	06.07. 21	06.07. 21
68	Odbednění	1 den	14.07. 21	14.07. 21
69	**Stěny kolektoru**	**10 dny**	**15.07. 21**	**28.07. 21**
70	Bednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
71	Armování	2 dny	16.07. 21	19.07. 21
72	Betonáž	1 den	20.07. 21	20.07. 21
73	Odbednění	1 den	28.07. 21	28.07. 21
74	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**29.07. 21**	**13.08. 21**
75	Bednění	2 dny	29.07. 21	30.07. 21
76	Armování	3 dny	02.08. 21	04.08. 21
77	Betonáž	1 den	05.08. 21	05.08. 21
78	Odbednění	1 den	13.08. 21	13.08. 21
79	**Stěny a strop podchodu**	**24 dny**	**16.08. 21**	**16.09. 21**
80	Bednění	3 dny	16.08. 21	18.08. 21
81	Armování	14 dny	19.08. 21	07.09. 21
82	Betonáž	1 den	08.09. 21	08.09. 21
83	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
84	**Zábradlí**	**12 dny**	**17.09. 21**	**04.10. 21**
85	Bednění	2 dny	17.09. 21	20.09. 21
86	Armování	3 dny	21.09. 21	23.09. 21
87	Betonáž	1 den	24.09. 21	24.09. 21
88	Odbednění	1 den	04.10. 21	04.10. 21
89	**DUO+SKYDECK var.2**	**68 dny**	**01.07. 21**	**04.10. 21**
90	**Stěny bílé vany**	**10 dny**	**01.07. 21**	**14.07. 21**
91	Bednění	1 den	01.07. 21	01.07. 21
92	Armování	2 dny	02.07. 21	05.07. 21
93	Betonáž	1 den	06.07. 21	06.07. 21
94	Odbednění	1 den	14.07. 21	14.07. 21
95	**Stěny kolektoru**	**10 dny**	**15.07. 21**	**28.07. 21**
96	Bednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
97	Armování	2 dny	16.07. 21	19.07. 21

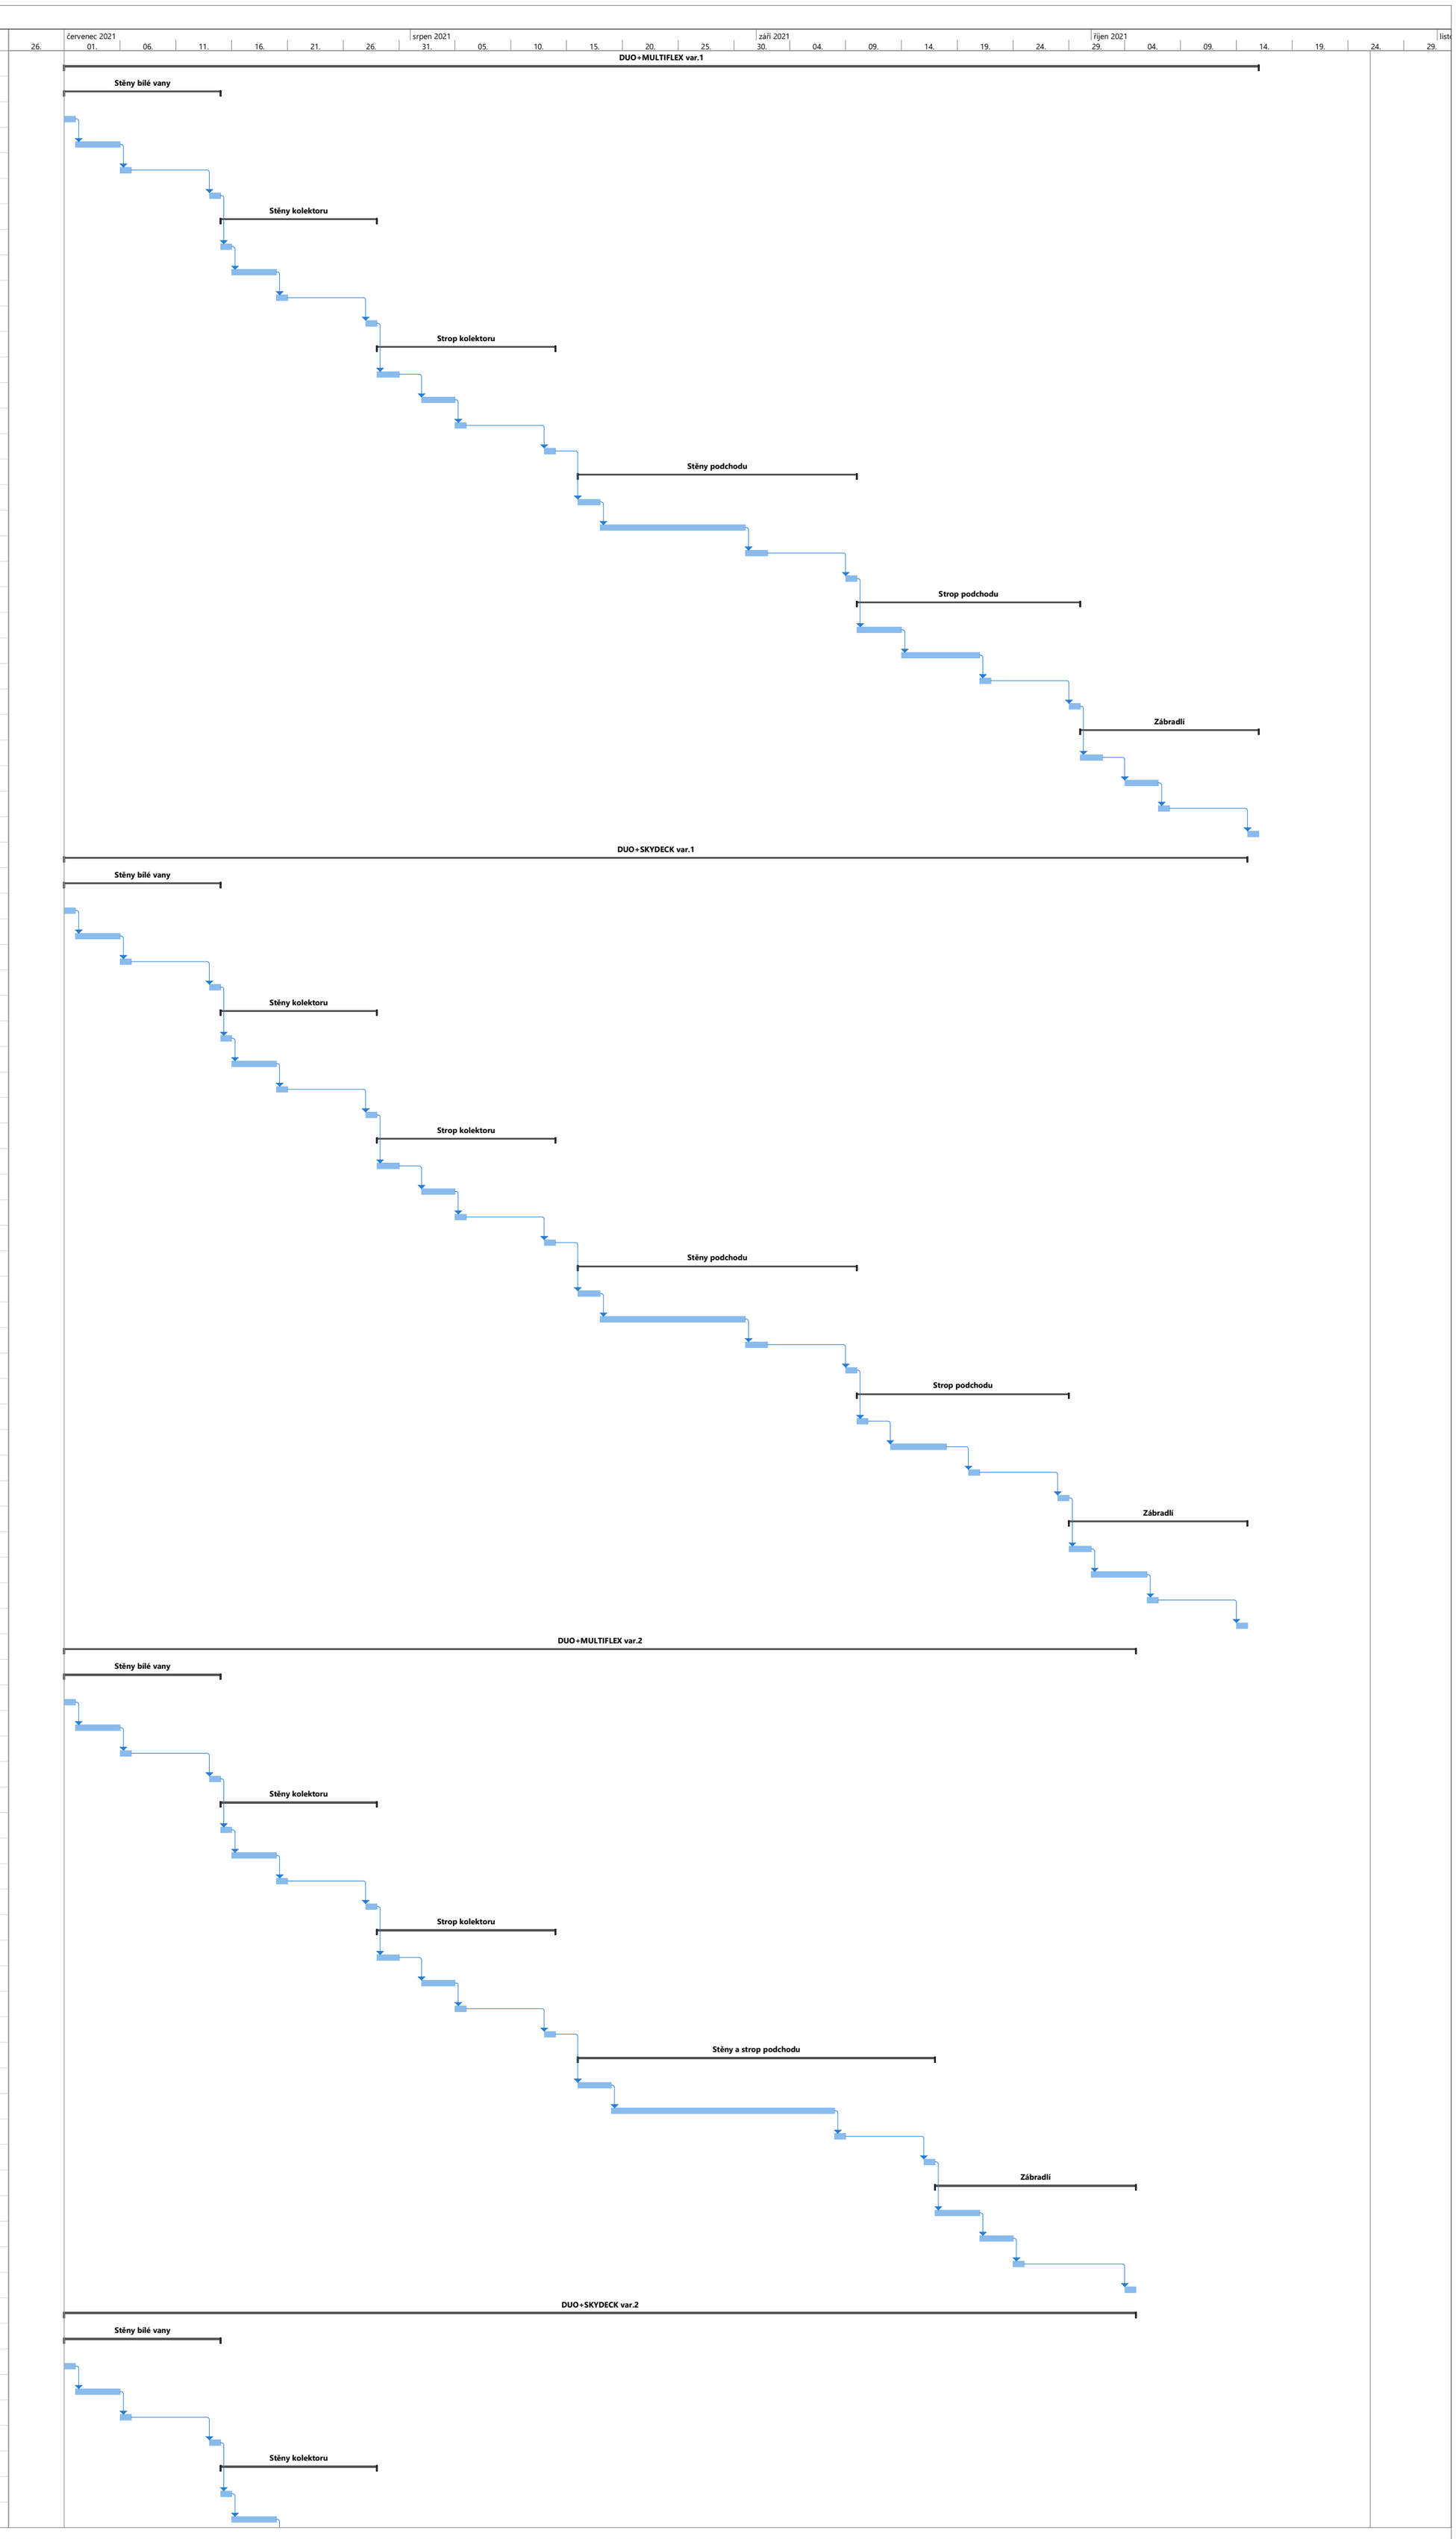

Harmonogram prací
Bc. Jakub Rašovec

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	

Příloha 2: Harmonogram prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
98	Betonáž	1 den	20.07. 21	20.07. 21
99	Odbednění	1 den	28.07. 21	28.07. 21
100	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**29.07. 21**	**13.08. 21**
101	Bednění	2 dny	29.07. 21	30.07. 21
102	Armování	3 dny	02.08. 21	04.08. 21
103	Betonáž	1 den	05.08. 21	05.08. 21
104	Odbednění	1 den	13.08. 21	13.08. 21
105	**Stěny a strop podchodu**	**24 dny**	**16.08. 21**	**16.09. 21**
106	Bednění	3 dny	16.08. 21	18.08. 21
107	Armování	14 dny	19.08. 21	07.09. 21
108	Betonáž	1 den	08.09. 21	08.09. 21
109	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
110	**Zábradlí**	**12 dny**	**17.09. 21**	**04.10. 21**
111	Bednění	2 dny	17.09. 21	20.09. 21
112	Armování	3 dny	21.09. 21	23.09. 21
113	Betonáž	1 den	24.09. 21	24.09. 21
114	Odbednění	1 den	04.10. 21	04.10. 21
115	**DOMINO+MULTIFLEX var.1**	**83 dny**	**01.07. 21**	**25.10. 21**
116	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
117	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
118	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
119	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
120	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
121	**Stěny kolektoru**	**12 dny**	**16.07. 21**	**02.08. 21**
122	Bednění	1 den	16.07. 21	16.07. 21
123	Armování	4 dny	19.07. 21	22.07. 21
124	Betonáž	1 den	23.07. 21	23.07. 21
125	Odbednění	1 den	02.08. 21	02.08. 21
126	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**03.08. 21**	**18.08. 21**
127	Bednění	2 dny	03.08. 21	04.08. 21
128	Armování	3 dny	05.08. 21	09.08. 21
129	Betonáž	1 den	10.08. 21	10.08. 21
130	Odbednění	1 den	18.08. 21	18.08. 21
131	**Stěny podchodu**	**21 dny**	**19.08. 21**	**16.09. 21**
132	Bednění	4 dny	19.08. 21	24.08. 21
133	Armování	9 dny	25.08. 21	06.09. 21
134	Betonáž	2 dny	07.09. 21	08.09. 21
135	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
136	**Strop podchodu**	**14 dny**	**17.09. 21**	**06.10. 21**
137	Bednění	2 dny	17.09. 21	20.09. 21
138	Armování	5 dny	21.09. 21	27.09. 21
139	Betonáž	1 den	28.09. 21	28.09. 21
140	Odbednění	1 den	06.10. 21	06.10. 21
141	**Zábradlí**	**13 dny**	**07.10. 21**	**25.10. 21**
142	Bednění	3 dny	07.10. 21	11.10. 21
143	Armování	3 dny	12.10. 21	14.10. 21
144	Betonáž	1 den	15.10. 21	15.10. 21
145	Odbednění	1 den	25.10. 21	25.10. 21
146	**DOMINO+SKYDECK var.1**	**82 dny**	**01.07. 21**	**22.10. 21**
147	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
148	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
149	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
150	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
151	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
152	**Stěny kolektoru**	**12 dny**	**16.07. 21**	**02.08. 21**
153	Bednění	1 den	16.07. 21	16.07. 21
154	Armování	4 dny	19.07. 21	22.07. 21
155	Betonáž	1 den	23.07. 21	23.07. 21
156	Odbednění	1 den	02.08. 21	02.08. 21
157	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**03.08. 21**	**18.08. 21**
158	Bednění	2 dny	03.08. 21	04.08. 21
159	Armování	3 dny	05.08. 21	09.08. 21
160	Betonáž	1 den	10.08. 21	10.08. 21
161	Odbednění	1 den	18.08. 21	18.08. 21
162	**Stěny podchodu**	**21 dny**	**19.08. 21**	**16.09. 21**
163	Bednění	4 dny	19.08. 21	24.08. 21
164	Armování	9 dny	25.08. 21	06.09. 21
165	Betonáž	2 dny	07.09. 21	08.09. 21
166	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
167	**Strop podchodu**	**13 dny**	**17.09. 21**	**05.10. 21**
168	Bednění	1 den	17.09. 21	17.09. 21
169	Armování	5 dny	20.09. 21	24.09. 21
170	Betonáž	1 den	27.09. 21	27.09. 21
171	Odbednění	1 den	05.10. 21	05.10. 21
172	**Zábradlí**	**13 dny**	**06.10. 21**	**22.10. 21**
173	Bednění	3 dny	06.10. 21	08.10. 21
174	Armování	3 dny	11.10. 21	13.10. 21
175	Betonáž	1 den	14.10. 21	14.10. 21
176	Odbednění	1 den	22.10. 21	22.10. 21
177	**DOMINO+MULTIFLEX var.2**	**74 dny**	**01.07. 21**	**12.10. 21**
178	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
179	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
180	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
181	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
182	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
183	**Stěny kolektoru**	**12 dny**	**16.07. 21**	**02.08. 21**
184	Bednění	1 den	16.07. 21	16.07. 21
185	Armování	4 dny	19.07. 21	22.07. 21
186	Betonáž	1 den	23.07. 21	23.07. 21
187	Odbednění	1 den	02.08. 21	02.08. 21
188	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**03.08. 21**	**18.08. 21**
189	Bednění	2 dny	03.08. 21	04.08. 21
190	Armování	3 dny	05.08. 21	09.08. 21
191	Betonáž	1 den	10.08. 21	10.08. 21
192	Odbednění	1 den	18.08. 21	18.08. 21
193	**Stěny a strop podchodu**	**26 dny**	**19.08. 21**	**23.09. 21**
194	Bednění	5 dny	19.08. 21	25.08. 21

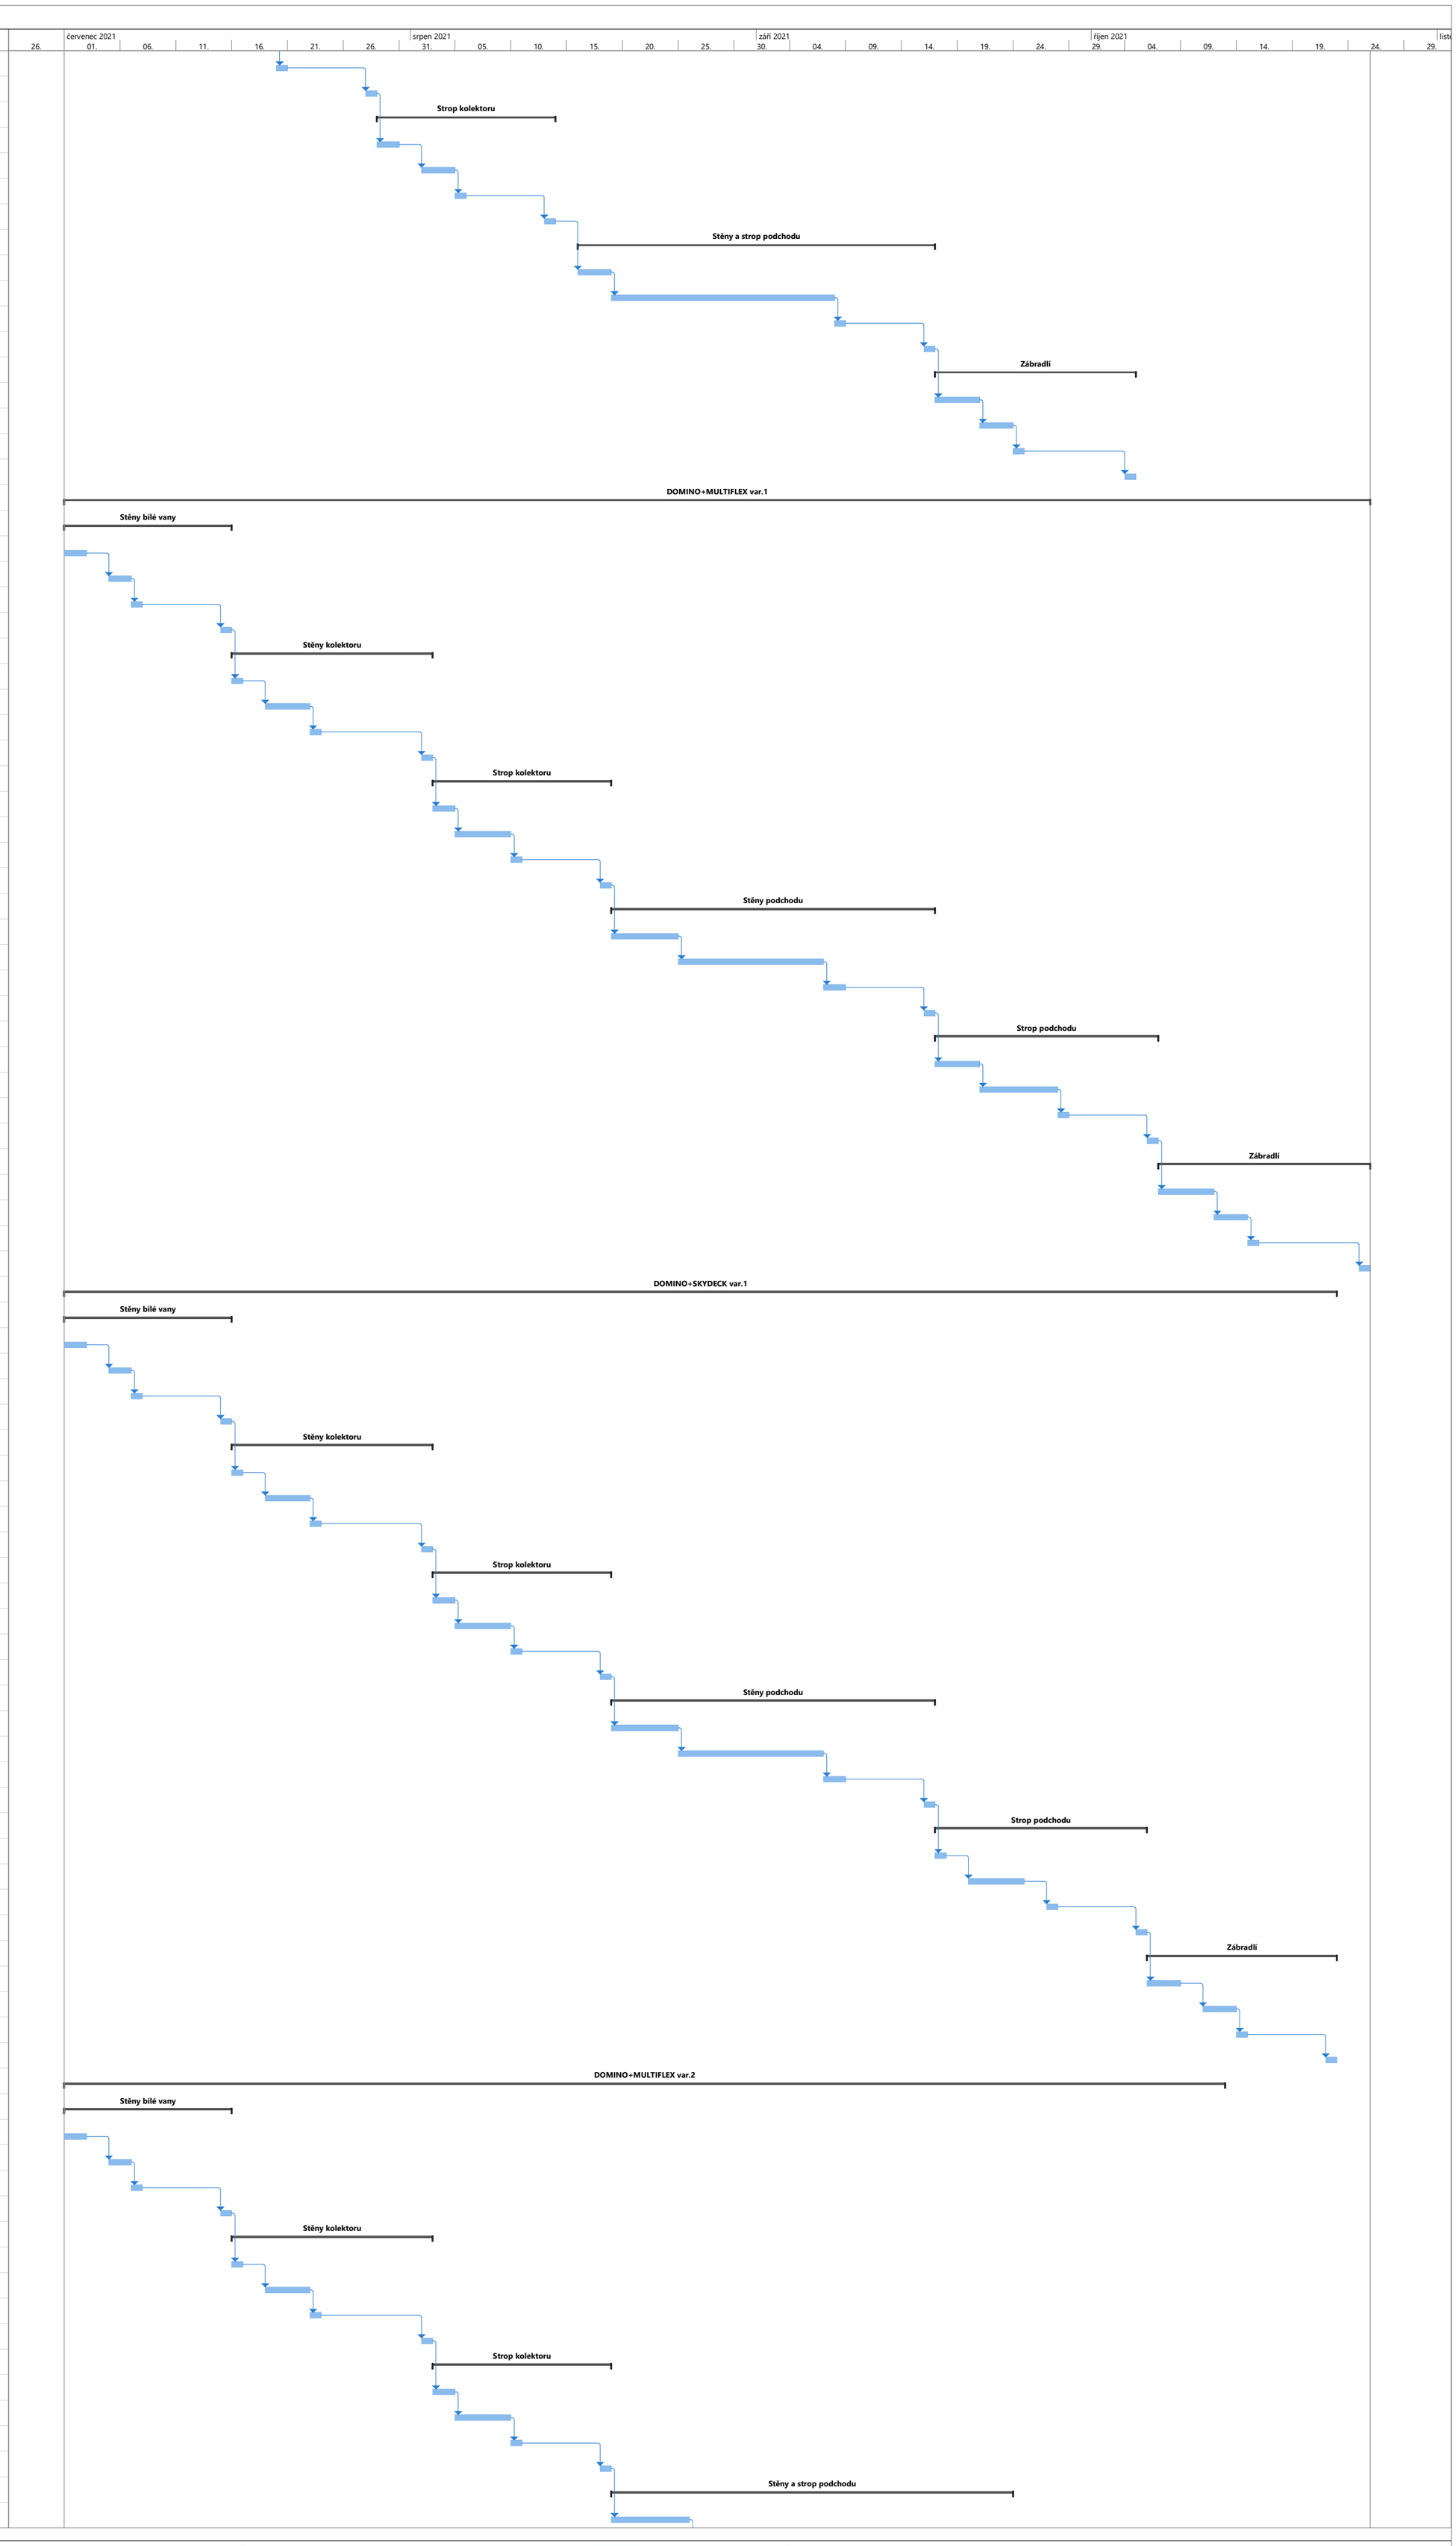

Harmonogram prací
Bc. Jakub Rašovec

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Průběh

Příloha 2: Harmonogram prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
195	Armování	14 dny	26.08. 21	14.09. 21
196	Betonáž	1 den	15.09. 21	15.09. 21
197	Odbednění	1 den	23.09. 21	23.09. 21
198	**Zábradlí**	**13 dny**	**24.09. 21**	**12.10. 21**
199	Bednění	3 dny	24.09. 21	28.09. 21
200	Armování	3 dny	29.09. 21	01.10. 21
201	Betonáž	1 den	04.10. 21	04.10. 21
202	Odbednění	1 den	12.10. 21	12.10. 21
203	**DOMINO+SKYDECK var.2**	**74 dny**	**01.07. 21**	**12.10. 21**
204	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
205	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
206	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
207	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
208	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
209	**Stěny kolektoru**	**12 dny**	**16.07. 21**	**02.08. 21**
210	Bednění	1 den	16.07. 21	16.07. 21
211	Armování	4 dny	19.07. 21	22.07. 21
212	Betonáž	1 den	23.07. 21	23.07. 21
213	Odbednění	1 den	02.08. 21	02.08. 21
214	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**03.08. 21**	**18.08. 21**
215	Bednění	2 dny	03.08. 21	04.08. 21
216	Armování	3 dny	05.08. 21	09.08. 21
217	Betonáž	1 den	10.08. 21	10.08. 21
218	Odbednění	1 den	18.08. 21	18.08. 21
219	**Stěny a strop podchodu**	**26 dny**	**19.08. 21**	**23.09. 21**
220	Bednění	5 dny	19.08. 21	25.08. 21
221	Armování	14 dny	26.08. 21	14.09. 21
222	Betonáž	1 den	15.09. 21	15.09. 21
223	Odbednění	1 den	23.09. 21	23.09. 21
224	**Zábradlí**	**13 dny**	**24.09. 21**	**12.10. 21**
225	Bednění	3 dny	24.09. 21	28.09. 21
226	Armování	3 dny	29.09. 21	01.10. 21
227	Betonáž	1 den	04.10. 21	04.10. 21
228	Odbednění	1 den	12.10. 21	12.10. 21
229	**TRIO+MULTIFLEX**	**82 dny**	**01.07. 21**	**22.10. 21**
230	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
231	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
232	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
233	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
234	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
235	**Stěny kolektoru**	**13 dny**	**16.07. 21**	**03.08. 21**
236	Bednění	2 dny	16.07. 21	19.07. 21
237	Armování	4 dny	20.07. 21	23.07. 21
238	Betonáž	1 den	26.07. 21	26.07. 21
239	Odbednění	1 den	03.08. 21	03.08. 21
240	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**04.08. 21**	**19.08. 21**
241	Bednění	2 dny	04.08. 21	05.08. 21
242	Armování	3 dny	06.08. 21	10.08. 21
243	Betonáž	1 den	11.08. 21	11.08. 21
244	Odbednění	1 den	19.08. 21	19.08. 21
245	**Stěny podchodu**	**20 dny**	**20.08. 21**	**16.09. 21**
246	Bednění	4 dny	20.08. 21	25.08. 21
247	Armování	9 dny	26.08. 21	07.09. 21
248	Betonáž	1 den	08.09. 21	08.09. 21
249	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
250	**Strop podchodu**	**14 dny**	**17.09. 21**	**06.10. 21**
251	Bednění	2 dny	17.09. 21	20.09. 21
252	Armování	5 dny	21.09. 21	27.09. 21
253	Betonáž	1 den	28.09. 21	28.09. 21
254	Odbednění	1 den	06.10. 21	06.10. 21
255	**Zábradlí**	**12 dny**	**07.10. 21**	**22.10. 21**
256	Bednění	2 dny	07.10. 21	08.10. 21
257	Armování	3 dny	11.10. 21	13.10. 21
258	Betonáž	1 den	14.10. 21	14.10. 21
259	Odbednění	1 den	22.10. 21	22.10. 21
260	**TRIO+SKYDECK**	**81 dny**	**01.07. 21**	**21.10. 21**
261	**Stěny bílé vany**	**11 dny**	**01.07. 21**	**15.07. 21**
262	Bednění	2 dny	01.07. 21	02.07. 21
263	Armování	2 dny	05.07. 21	06.07. 21
264	Betonáž	1 den	07.07. 21	07.07. 21
265	Odbednění	1 den	15.07. 21	15.07. 21
266	**Stěny kolektoru**	**13 dny**	**16.07. 21**	**03.08. 21**
267	Bednění	2 dny	16.07. 21	19.07. 21
268	Armování	4 dny	20.07. 21	23.07. 21
269	Betonáž	1 den	26.07. 21	26.07. 21
270	Odbednění	1 den	03.08. 21	03.08. 21
271	**Strop kolektoru**	**12 dny**	**04.08. 21**	**19.08. 21**
272	Bednění	2 dny	04.08. 21	05.08. 21
273	Armování	3 dny	06.08. 21	10.08. 21
274	Betonáž	1 den	11.08. 21	11.08. 21
275	Odbednění	1 den	19.08. 21	19.08. 21
276	**Stěny podchodu**	**20 dny**	**20.08. 21**	**16.09. 21**
277	Bednění	4 dny	20.08. 21	25.08. 21
278	Armování	9 dny	26.08. 21	07.09. 21
279	Betonáž	1 den	08.09. 21	08.09. 21
280	Odbednění	1 den	16.09. 21	16.09. 21
281	**Strop podchodu**	**13 dny**	**17.09. 21**	**05.10. 21**
282	Bednění	1 den	17.09. 21	17.09. 21
283	Armování	5 dny	20.09. 21	24.09. 21
284	Betonáž	1 den	27.09. 21	27.09. 21
285	Odbednění	1 den	05.10. 21	05.10. 21
286	**Zábradlí**	**12 dny**	**06.10. 21**	**21.10. 21**
287	Bednění	2 dny	06.10. 21	07.10. 21
288	Armování	3 dny	08.10. 21	12.10. 21
289	Betonáž	1 den	13.10. 21	13.10. 21
290	Odbednění	1 den	21.10. 21	21.10. 21

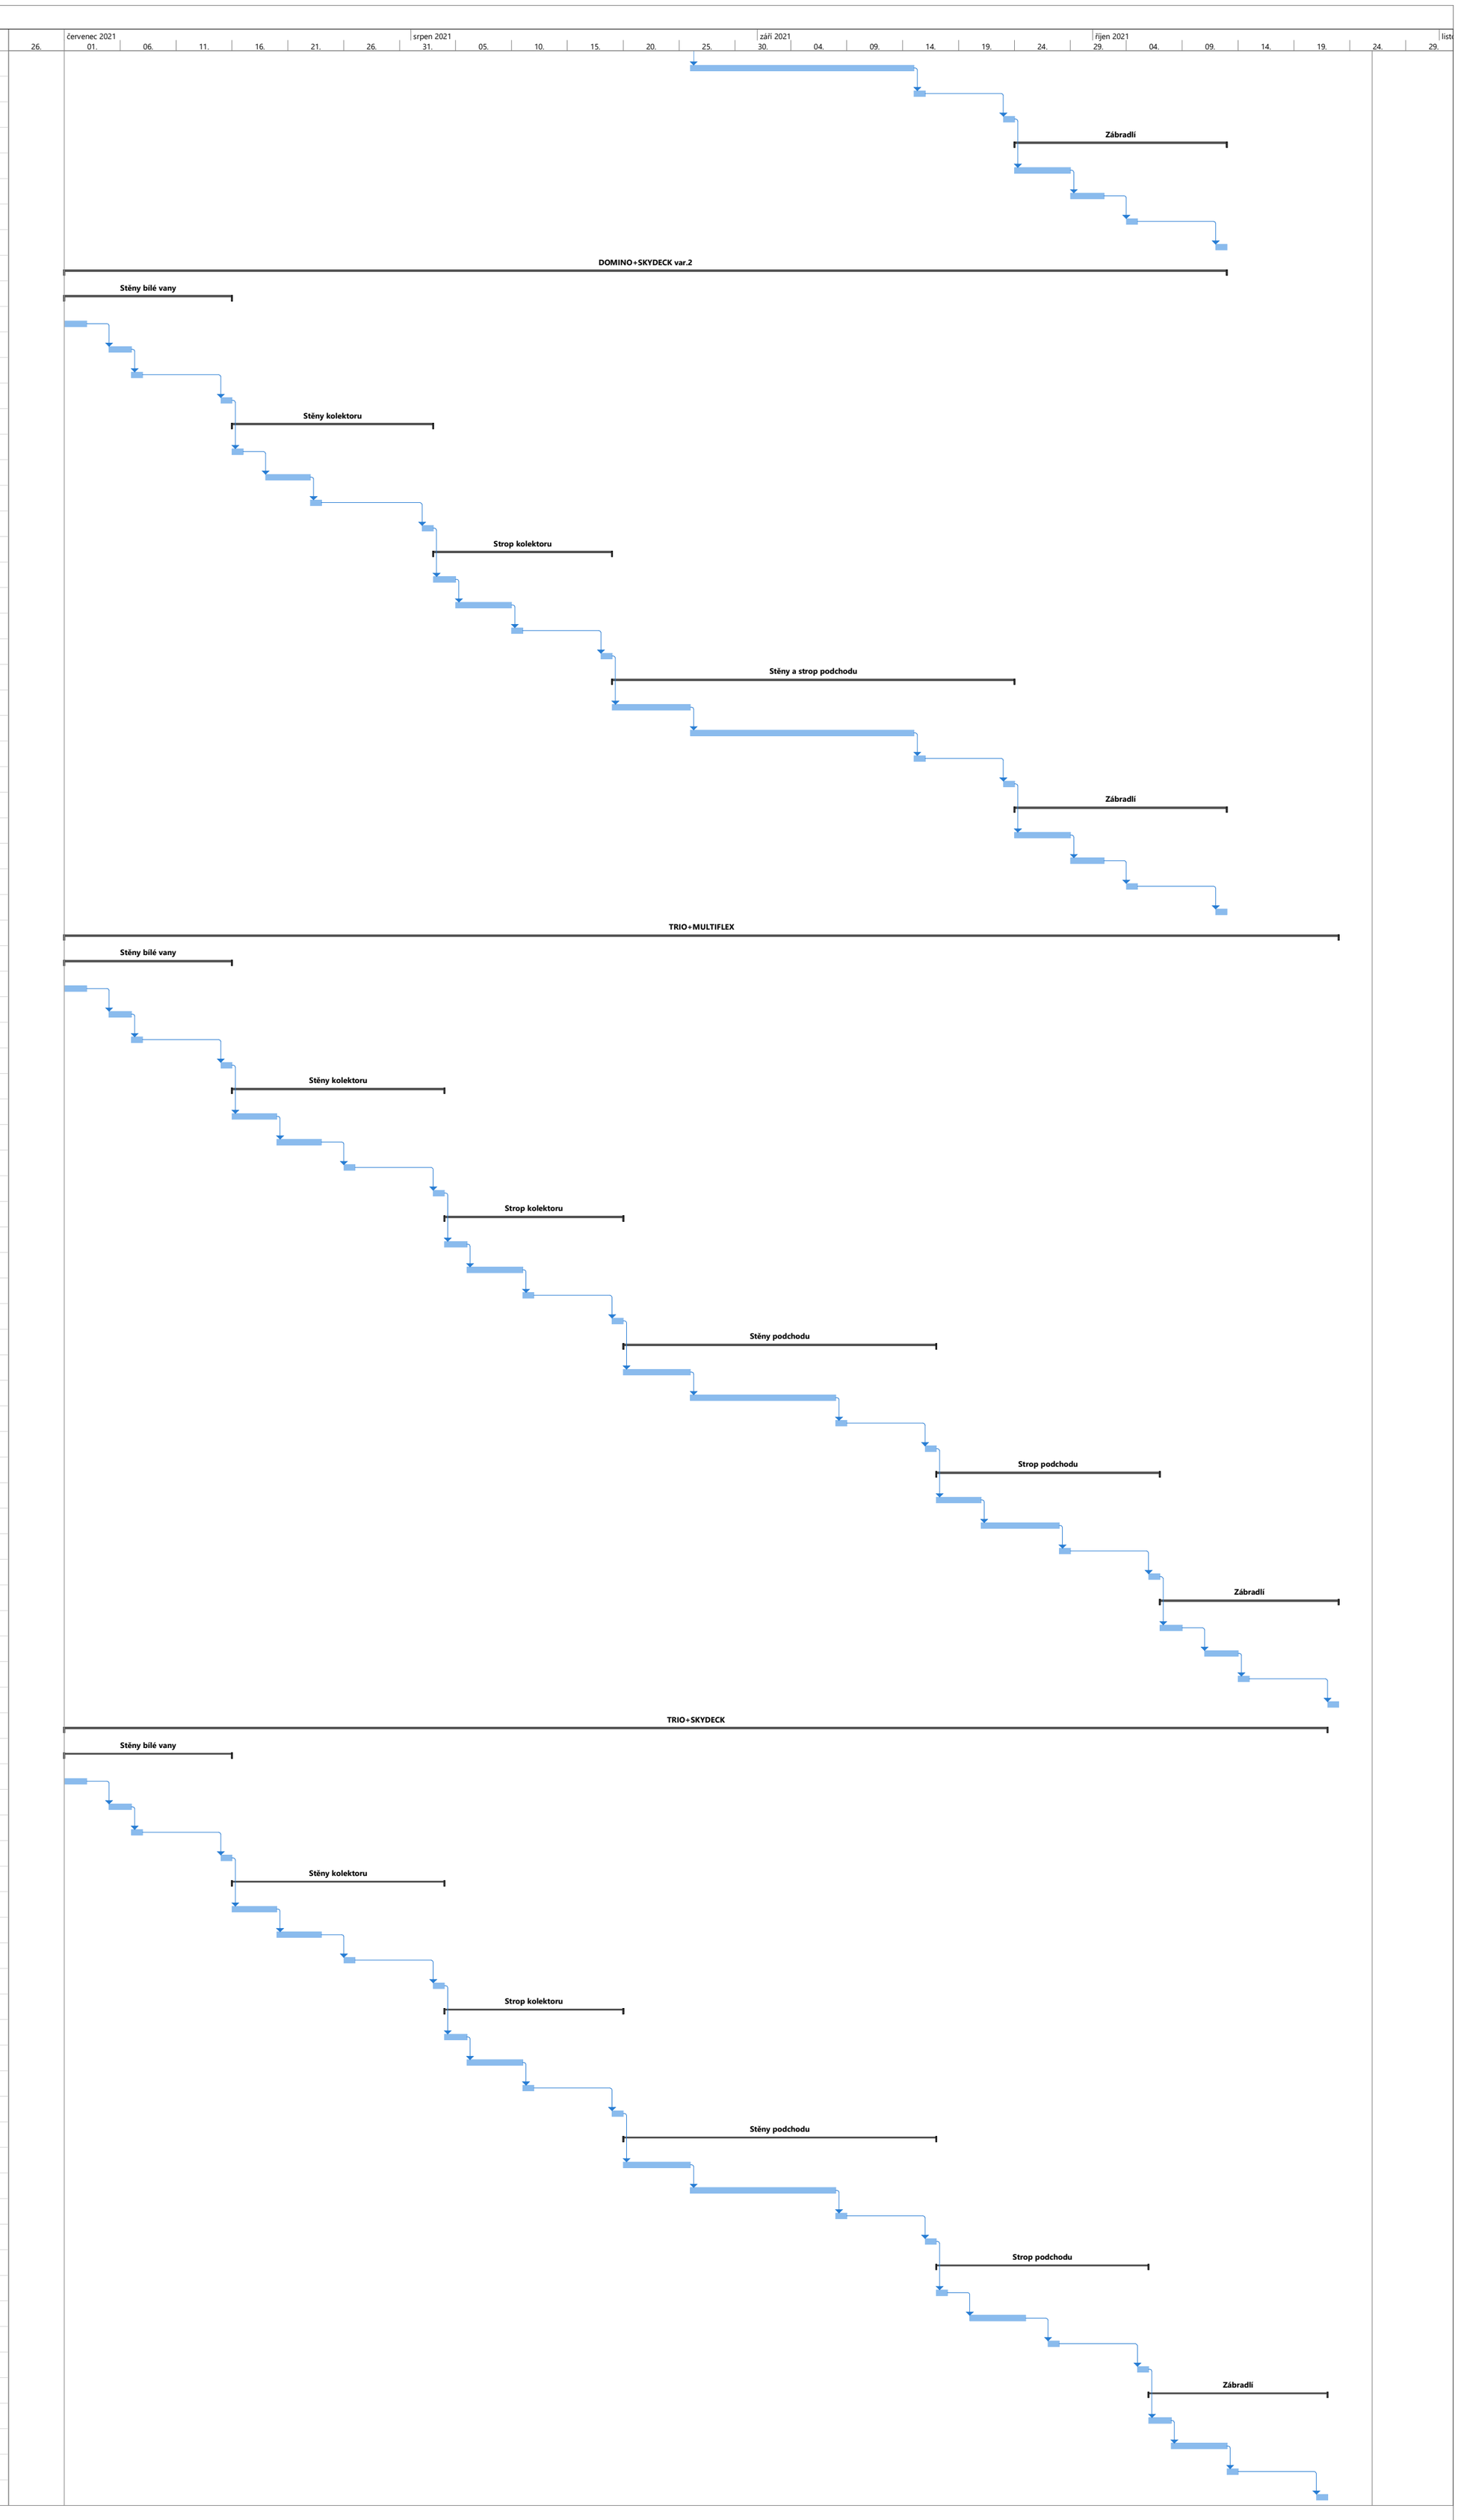

Harmonogram prací
Bc. Jakub Rašovec

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu
