CONTEC - Časový graf akce: 00010003 KÚ JIHLAVA

2.1.22

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
10	PŘÍPOJKA KAN 1	9	11	0	29.11.21	11.2.22
20	PŘIP. VOD 1	5	7	0	20.12.21	4.2.22
30	PŘÍPOJKA PLYN 1	5	4	0	3.1.22	28.1.22
40	PŘÍPOJKA NN 1	11	9	0	20.12.21	18.2.22
50	SO 01 KÚ 1	68	77	0	24.1.22	14.7.23
60	PŘÍPOJKA SLP 1	3	8	3	24.4.23	16.6.23
70	VO 1	6	6	2	24.4.23	2.6.23
80	ČTÚ 1	3	86	1	8.11.21	30.6.23
90	SEJMUTÍ ORNICE 1	2	3	2	8.11.21	26.11.21
100	MILNÍK 1 PŘEDÁNÍ STAVBY	1	1	0	17.7.23	21.7.23

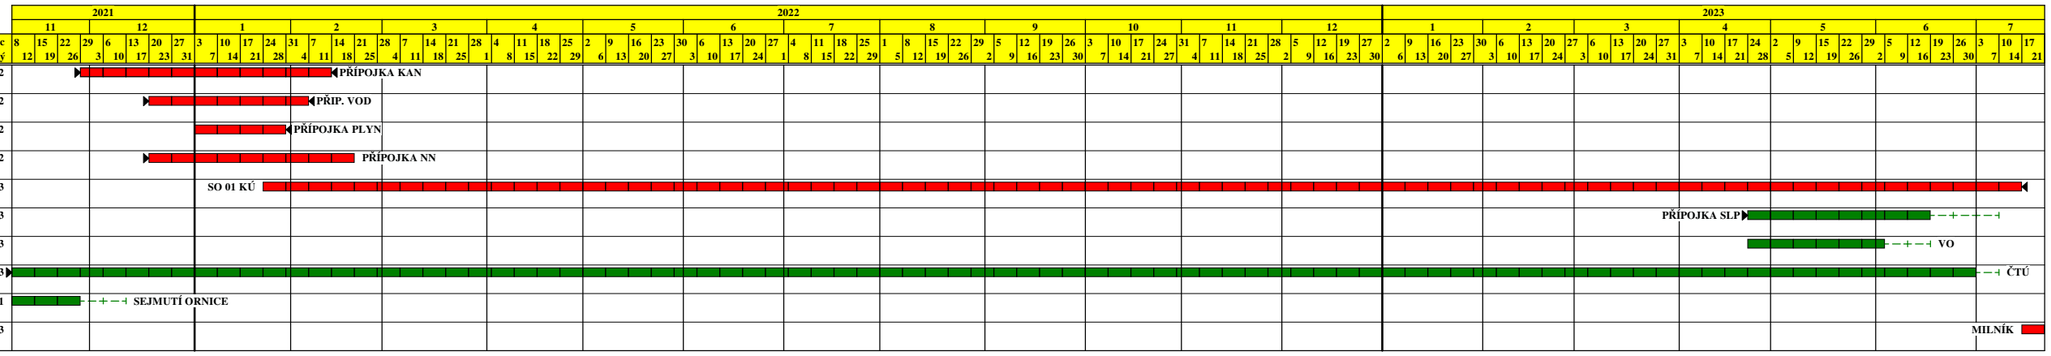

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

Studentská verze
