CONTEC - Časový graf akce: 1000SO04 Bytový dům Hodkovičky

29.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
	SO04 Kanalizace					
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO04 Kanalizace	1	2	0	4.4.22	16.4.22
501	PAŽENÍ 1 SO04 Kanalizace	8	2	1	4.4.22	16.4.22
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO04 Kanalizace	2	1	3	4.4.22	9.4.22
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO04 Kanalizace	2	1	0	18.4.22	23.4.22
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO04 Kanalizace	9	3	0	25.4.22	14.5.22
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 SO04 Kanalizace	4	2	0	16.5.22	28.5.22
6559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 SO04 Kanalizace	3	1	0	30.5.22	4.6.22
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO04 Kanalizace	2	1	0	30.5.22	4.6.22
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO04 Kanalizace	1	1	0	6.6.22	11.6.22
	SO05 Vodovod					
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 SO05 Vodovod	3	1	2	4.4.22	9.4.22
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO05 Vodovod	3	1	1	18.4.22	23.4.22
10407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 1 SO05 Vodovod	2	1	2	18.4.22	23.4.22
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO05 Vodovod	3	4	2	4.4.22	30.4.22
10501	PAŽENÍ 1 SO05 Vodovod	6	2	1	18.4.22	30.4.22
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO05 Vodovod	2	1	2	25.4.22	30.4.22
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO05 Vodovod	2	1	1	2.5.22	7.5.22
13808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO05 Vodovod	3	1	0	16.5.22	21.5.22
16118	POTRUBÍ BETONOVÉ 1 SO05 Vodovod	4	1	1	23.5.22	28.5.22
16158	POTRUBÍ LITINOVÉ 1 SO05 Vodovod	4	2	0	23.5.22	4.6.22
16178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO05 Vodovod	3	1	1	23.5.22	28.5.22
16608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 SO05 Vodovod	2	1	0	6.6.22	11.6.22
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 SO05 Vodovod	2	1	2	23.5.22	28.5.22
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO05 Vodovod	2	1	0	6.6.22	11.6.22
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 SO05 Vodovod	3	1	0	13.6.22	18.6.22
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO05 Vodovod	1	1	0	13.6.22	18.6.22

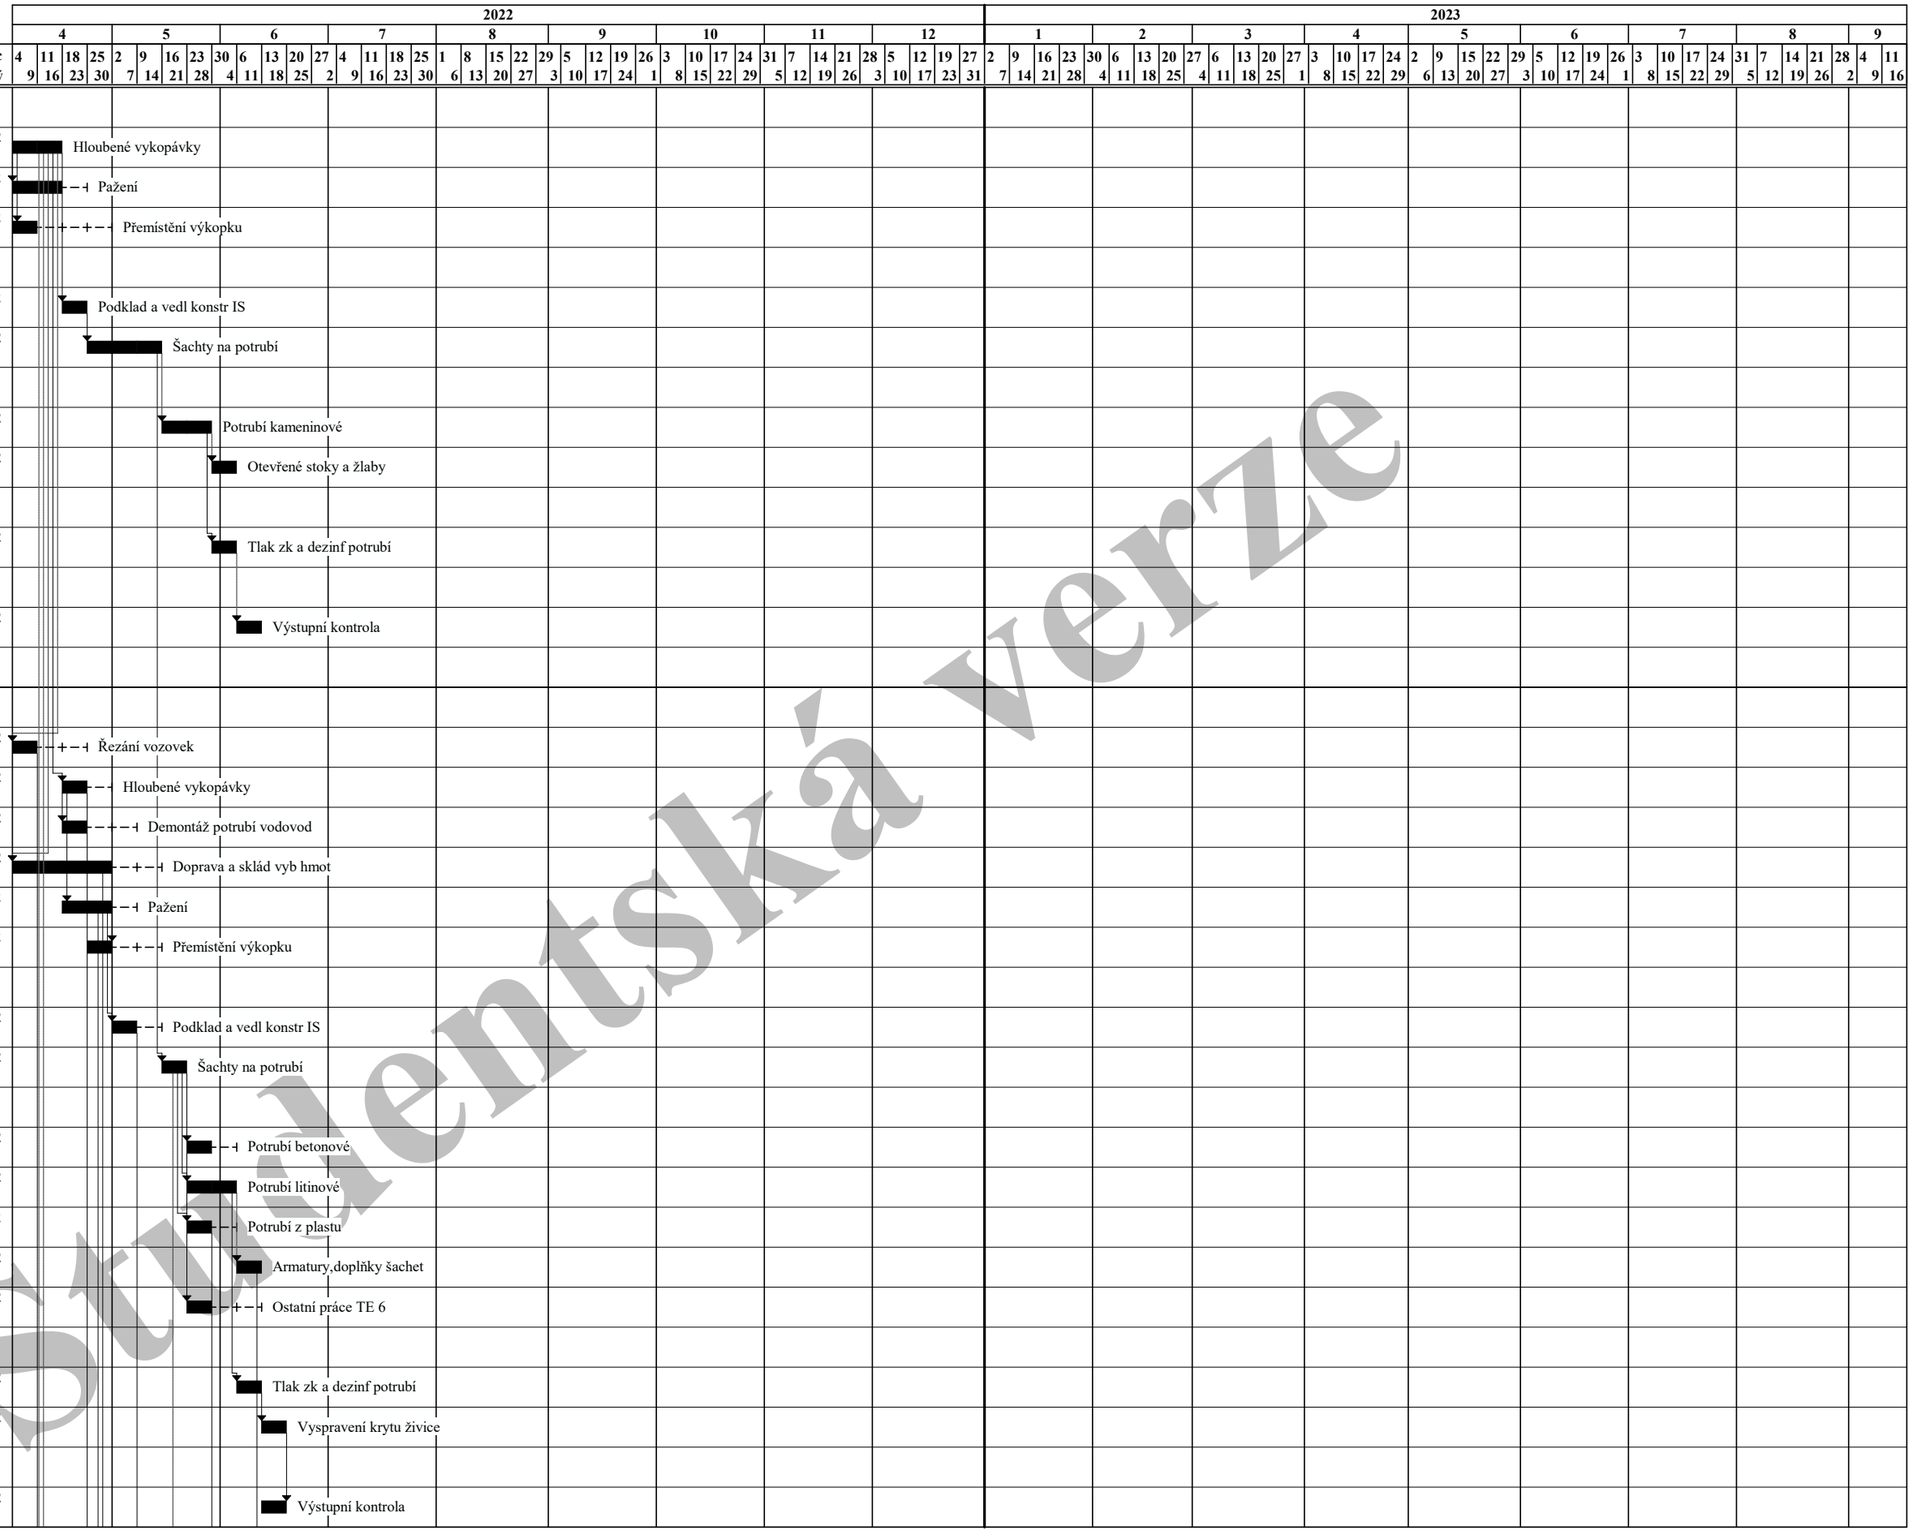

Studentská verze

Činnost: kritická - ▬, zpožděná - ▬, s rezervou - ▬, rezerva - ⊢—⊣, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

29.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO06 Plynovod						
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 SO06 Plynovod	3	1	6	11.4.22	16.4.22
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO06 Plynovod	3	1	4	25.4.22	30.4.22
30459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO06 Plynovod	3	2	4	2.5.22	14.5.22
30501	PAŽENÍ 1 SO06 Plynovod	2	1	5	2.5.22	7.5.22
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO06 Plynovod	2	1	4	9.5.22	14.5.22
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO06 Plynovod	2	1	3	9.5.22	14.5.22
33859	PŘESUN HMOT TE 3 / 1 SO06 Plynovod	3	1	4	9.5.22	14.5.22
36108	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO06 Plynovod	3	1	1	30.5.22	4.6.22
36158	POTRUBÍ OCELOVÉ 1 SO06 Plynovod	3	1	2	23.5.22	28.5.22
36258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 SO06 Plynovod	2	1	0	13.6.22	18.6.22
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 SO06 Plynovod	2	1	2	30.5.22	4.6.22
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO06 Plynovod	2	1	0	13.6.22	18.6.22
39705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 SO06 Plynovod	3	1	0	20.6.22	25.6.22
39859	PŘESUN HMOT TE 9 / 1 SO06 Plynovod	2	1	0	20.6.22	25.6.22
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA / 1 SO06 Plynovod	1	1	0	20.6.22	25.6.22
Bytový dům A+B						
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 Bytový dům A+B	3	1	3	27.6.22	2.7.22
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Bytový dům A+B	6	4	3	27.6.22	23.7.22
40501	PAŽENÍ 1 Bytový dům A+B	2	1	5	4.7.22	9.7.22
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Bytový dům A+B	3	2	51	27.6.22	9.7.22
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Bytový dům A+B	1	1	51	27.6.22	2.7.22
41155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH / 1 Bytový dům A+B	2	1	62	4.7.22	9.7.22
41402	PILOTY 1 Bytový dům A+B	9	2	3	25.7.22	6.8.22
41502	ZÁKLADY 1 Bytový dům A+B	12	3	3	8.8.22	27.8.22
41801	ODPAŽENÍ 1 Bytový dům A+B	2	1	17	5.9.22	10.9.22
42103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 1 Bytový dům A+B	4	12	3	12.9.22	3.12.22
42253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY 1 Bytový dům A+B	5	2	12	12.9.22	24.9.22
42354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1 Bytový dům A+B	4	2	6	21.11.22	3.12.22

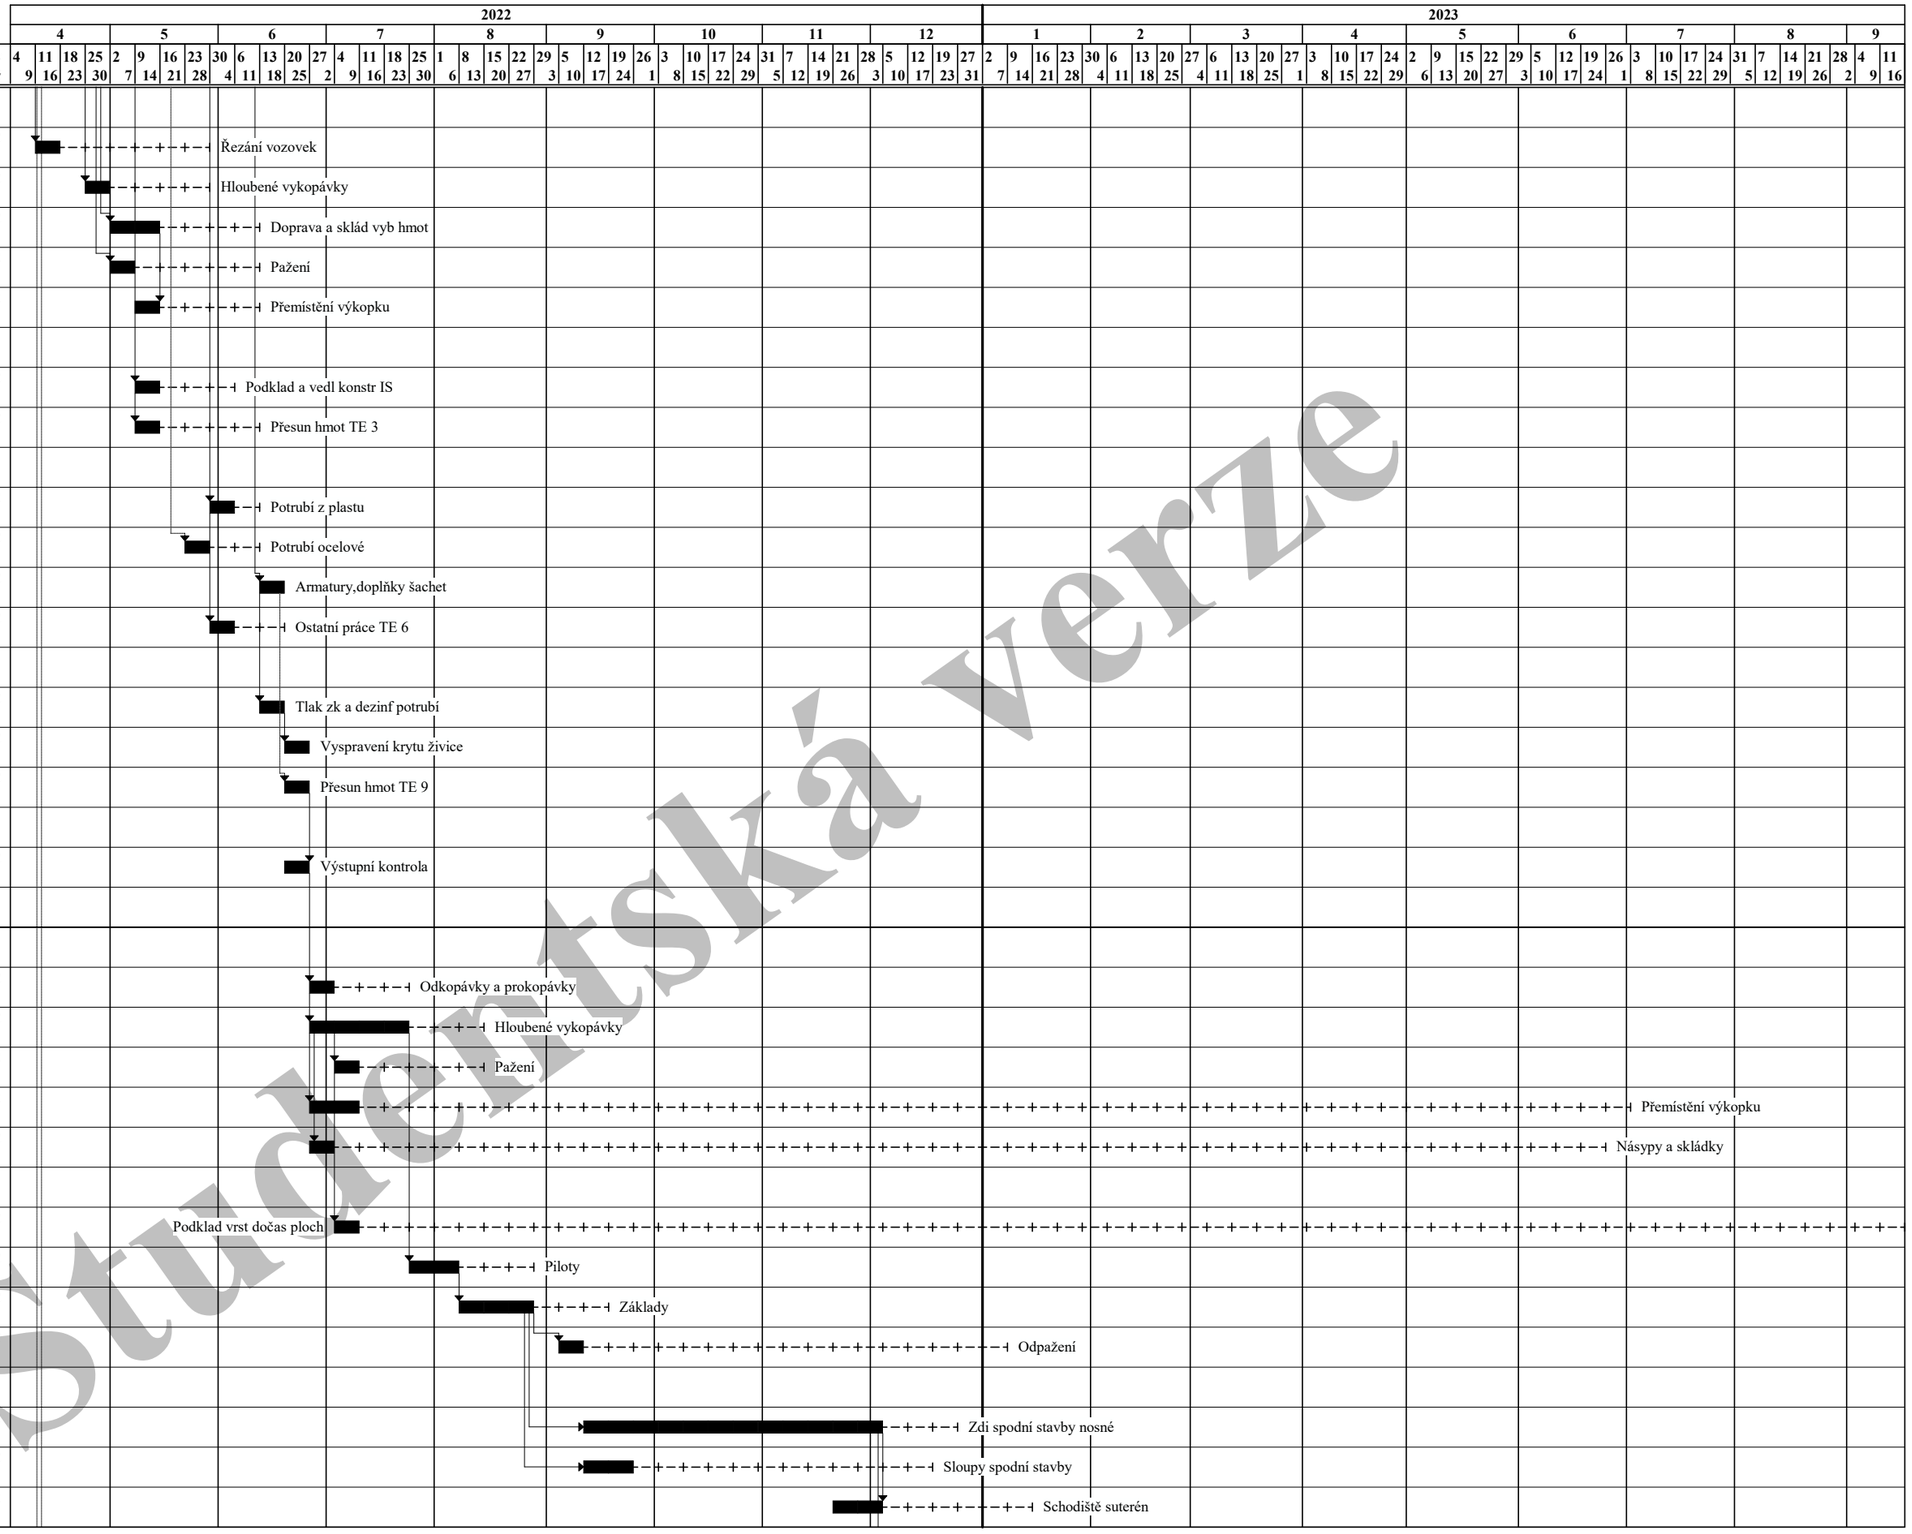

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Časový graf akce: 1000SO04 Bytový dům Hodkovičky

29.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
42404	STROP SUTERÉN 1 Bytový dům A+B	3	3	3	28.11.22	17.12.22
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 Bytový dům A+B	4	3	28	12.12.22	31.12.22
43103	ZDI NOSNÉ 1 Bytový dům A+B	10	10	3	12.12.22	18.2.23
43303	SLOUPY A PILÍŘE 1 Bytový dům A+B	3	3	13	12.12.22	31.12.22
43404	STROPY 1 Bytový dům A+B	15	10	3	2.1.23	11.3.23
43504	SCHODIŠTĚ 1 Bytový dům A+B	4	1	4	13.2.23	18.2.23
44307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 Bytový dům A+B	4	2	11	13.3.23	25.3.23
44457	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 Bytový dům A+B	1	1	11	20.3.23	25.3.23
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 Bytový dům A+B	2	1	11	20.3.23	25.3.23
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 1 Bytový dům A+B	4	5	11	20.3.23	22.4.23
44807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 Bytový dům A+B	3	3	11	3.4.23	22.4.23
44821	VEGETEČNÍ STŘECHY 1 Bytový dům A+B	4	2	11	10.4.23	22.4.23
45103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 Bytový dům A+B	5	8	4	27.2.23	22.4.23
45127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 Bytový dům A+B	3	3	8	6.3.23	25.3.23
45153	OBEZDÍVKY A PŘIZDÍVKY 1 Bytový dům A+B	3	1	7	20.3.23	25.3.23
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 Bytový dům A+B	2	1	10	24.4.23	29.4.23
45327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Bytový dům A+B	4	1	17	24.4.23	29.4.23
45357	TRUHLÁŘI OKNA 1 Bytový dům A+B	3	1	17	24.4.23	29.4.23
45387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 1 Bytový dům A+B	2	1	17	24.4.23	29.4.23
45407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ 1 Bytový dům A+B	2	2	18	2.5.23	13.5.23
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 Bytový dům A+B	4	8	14	27.2.23	22.4.23
45527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Bytový dům A+B	6	10	12	13.3.23	20.5.23
45557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 Bytový dům A+B	2	1	7	17.4.23	22.4.23
45607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 Bytový dům A+B	9	7	7	13.3.23	29.4.23
45627	ARMATURY ÚT 1 Bytový dům A+B	2	1	24	20.3.23	25.3.23
45647	OTOPNÁ TĚLESA 1 Bytový dům A+B	4	2	17	2.5.23	13.5.23
45667	KOTELNY ÚT 1 Bytový dům A+B	2	1	17	15.5.23	20.5.23
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 Bytový dům A+B	3	4	7	3.4.23	29.4.23
45727	SILNOPROUD VODIČE 1 Bytový dům A+B	5	6	9	10.4.23	20.5.23
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 Bytový dům A+B	2	1	9	15.5.23	20.5.23
45767	SLABOPROUD TRUBKY 1 Bytový dům A+B	2	2	4	10.4.23	22.4.23
45787	SLABOPROUD VODIČE 1 Bytový dům A+B	5	4	4	17.4.23	13.5.23
45807	VZDUCHOTECHNIKA 1 Bytový dům A+B	4	3	21	3.4.23	22.4.23

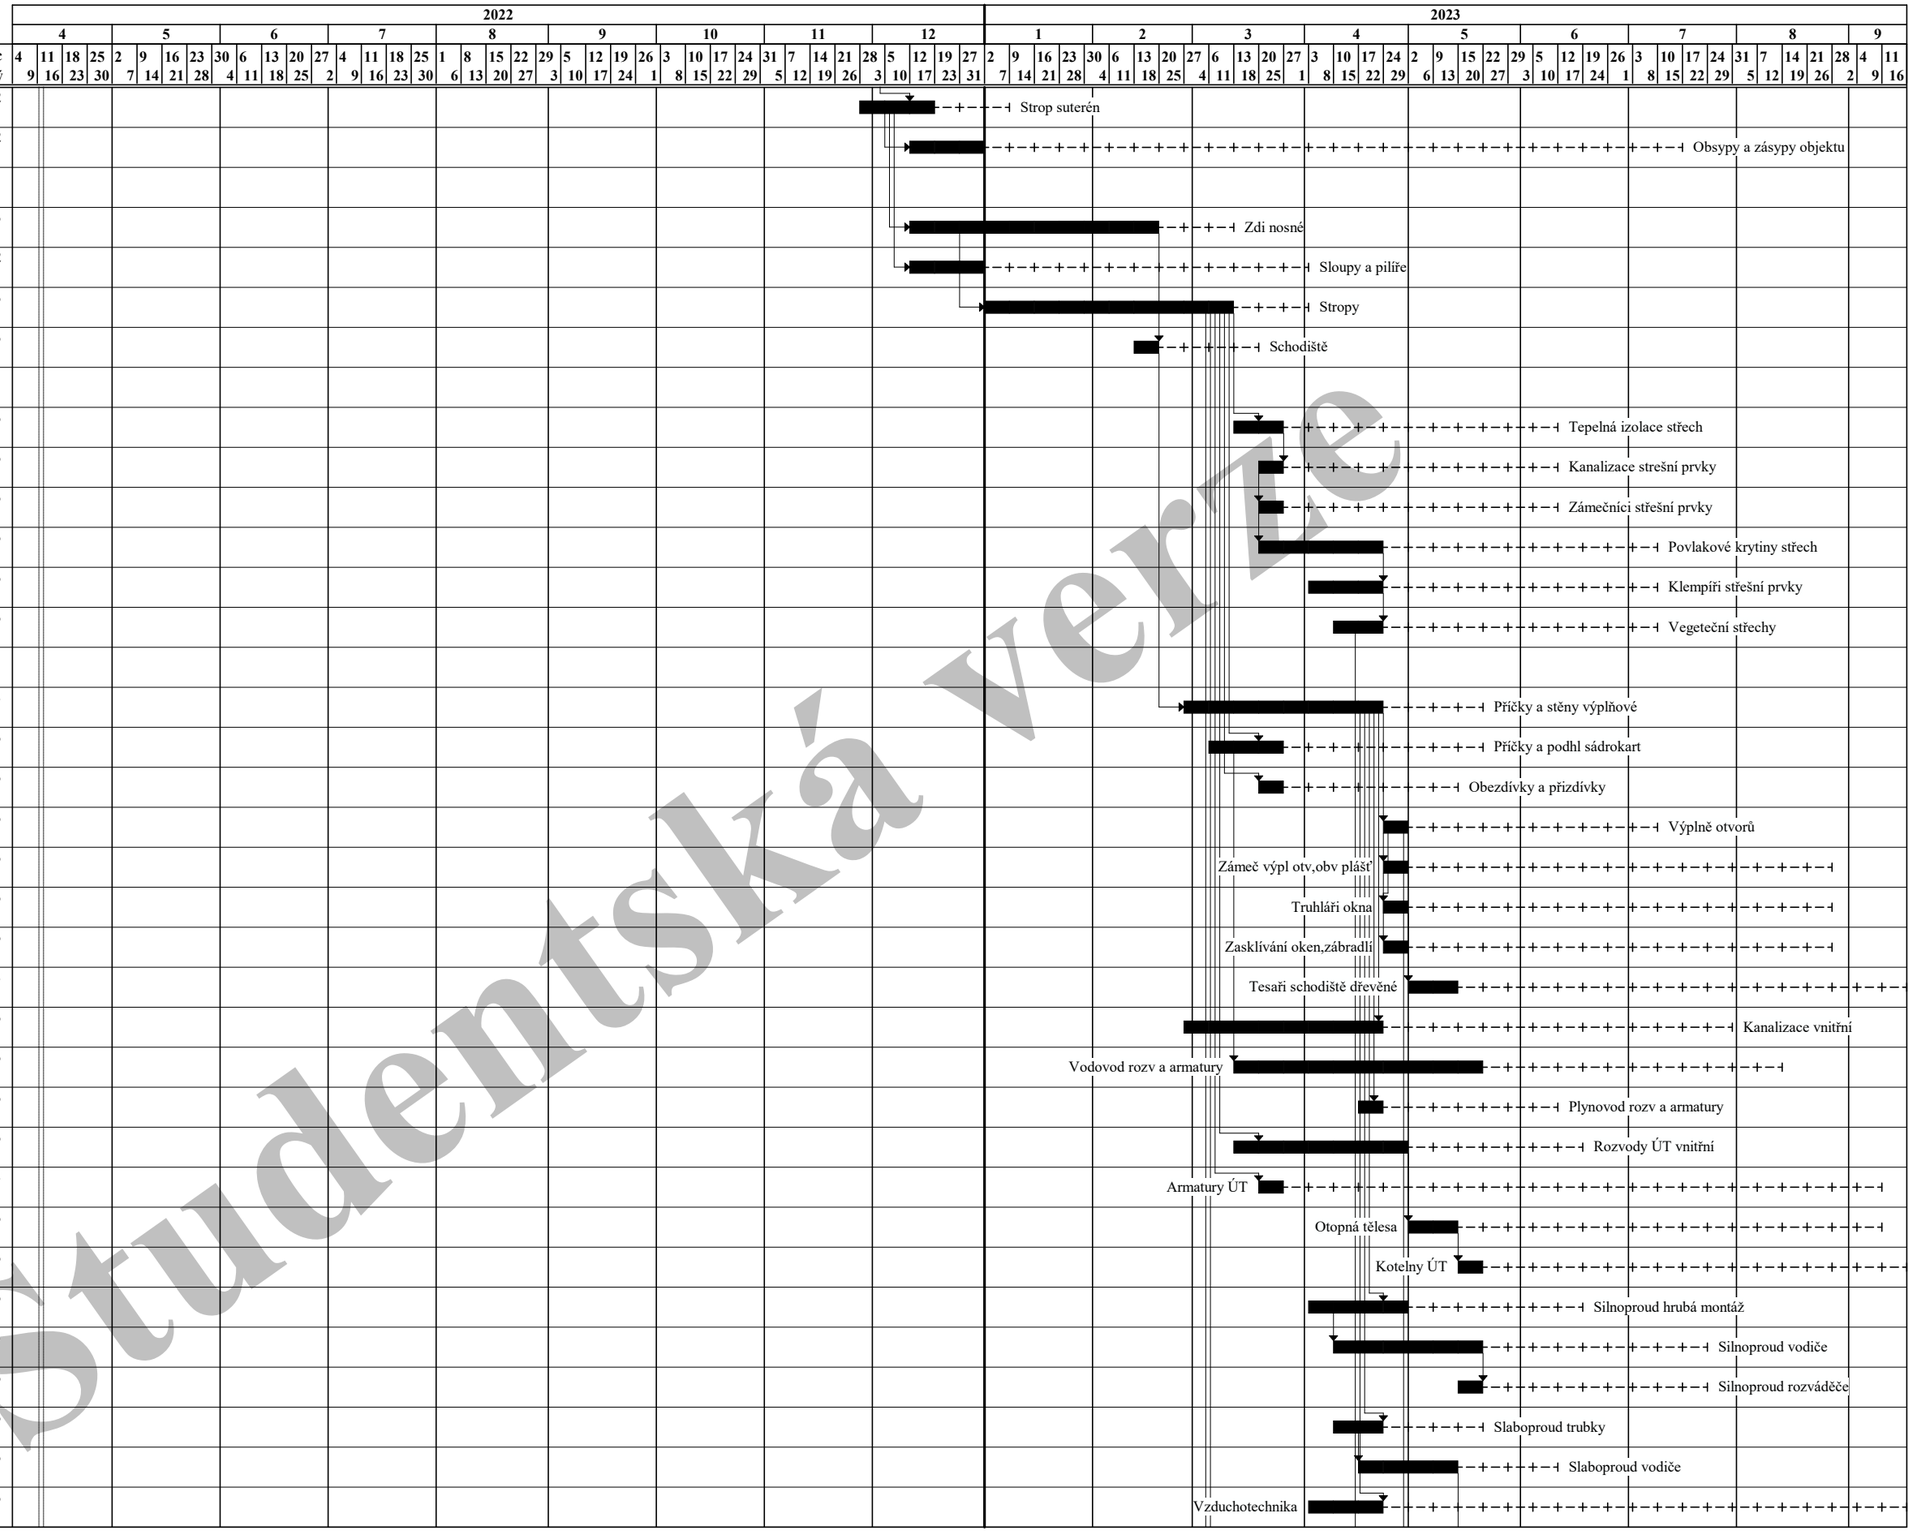

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Časový graf akce: 1000SO04 Bytový dům Hodkovičky

29.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
46109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 Bytový dům A+B	2	1	3	20.3.23	25.3.23
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 Bytový dům A+B	4	5	3	27.3.23	29.4.23
46208	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 Bytový dům A+B	4	5	3	17.4.23	20.5.23
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 Bytový dům A+B	20	3	3	22.5.23	10.6.23
47303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 Bytový dům A+B	2	1	4	15.5.23	20.5.23
47357	OBKLADY VNITŘNÍ 1 Bytový dům A+B	6	6	3	29.5.23	8.7.23
47407	PODLAHY SYNTETICKÉ 1 Bytový dům A+B	7	4	6	10.7.23	5.8.23
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Bytový dům A+B	13	3	4	15.5.23	3.6.23
67707	MALBY VNITŘNÍ 1 Bytový dům A+B	6	5	0	26.6.23	29.7.23
68109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 Bytový dům A+B	1	2	8	29.5.23	10.6.23
68159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 Bytový dům A+B	2	1	6	31.7.23	5.8.23
68307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 1 Bytový dům A+B	7	4	0	31.7.23	26.8.23
68357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Bytový dům A+B	4	2	2	24.7.23	5.8.23
68507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Bytový dům A+B	3	5	6	12.6.23	15.7.23
68657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 Bytový dům A+B	2	4	2	7.8.23	2.9.23
68707	SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Bytový dům A+B	4	3	3	17.7.23	5.8.23
68809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 Bytový dům A+B	16	3	0	7.8.23	26.8.23
68900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 1 Bytový dům A+B	4	5	8	29.5.23	1.7.23
69109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ / 1 Bytový dům A+B	3	3	17	6.3.23	25.3.23
69189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 1 Bytový dům A+B	3	1	11	17.4.23	22.4.23
69207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 Bytový dům A+B	5	7	10	2.5.23	17.6.23
69257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 Bytový dům A+B	2	1	12	19.6.23	24.6.23
69306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 Bytový dům A+B	8	3	10	5.6.23	24.6.23
69527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 1 Bytový dům A+B	2	3	11	12.6.23	1.7.23
69587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 Bytový dům A+B	2	2	11	19.6.23	1.7.23
69609	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 1 Bytový dům A+B	2	2	11	19.6.23	1.7.23
69627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Bytový dům A+B	2	2	10	26.6.23	8.7.23
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA / 1 Bytový dům A+B	1	1	0	28.8.23	2.9.23

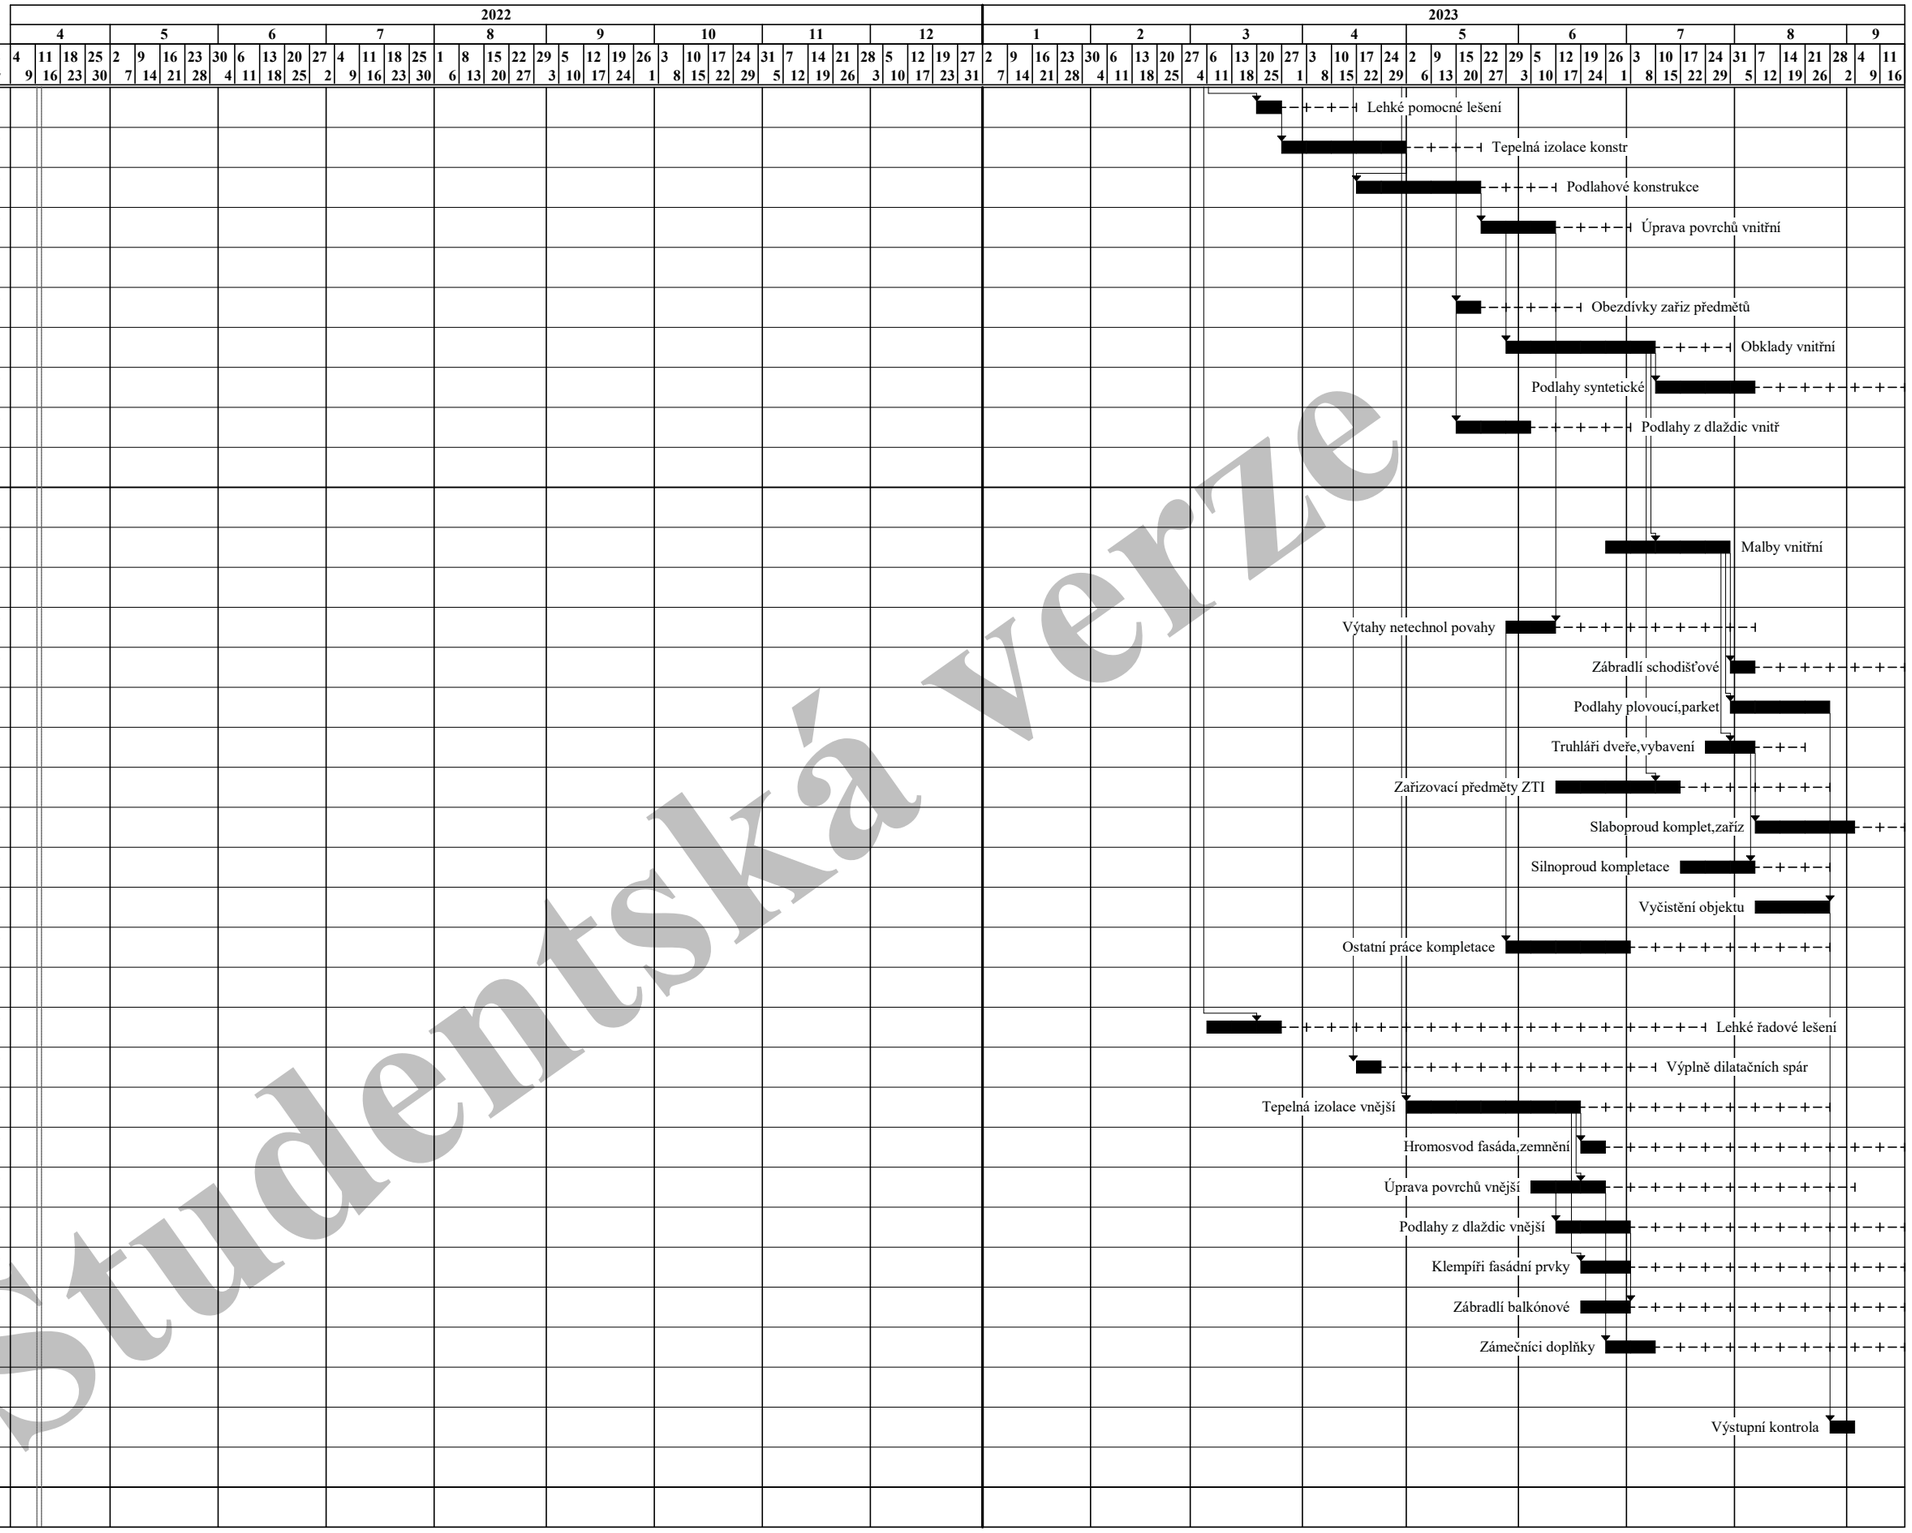

Studentská verze

Činnost: kritická - ▬, zpožděná - ▬, s rezervou - ▬, rezerva - ⊢ — ⊣, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO02 Komunikace						
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO02 Komunikace	3	1	0	24.7.23	29.7.23
70409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 SO02 Komunikace	5	1	1	24.7.23	29.7.23
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO02 Komunikace	5	2	0	24.7.23	5.8.23
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO02 Komunikace	1	1	1	31.7.23	5.8.23
70751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 SO02 Komunikace	2	1	1	31.7.23	5.8.23
73155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO02 Komunikace	3	1	0	7.8.23	12.8.23
73509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO02 Komunikace	2	1	0	14.8.23	19.8.23
73624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO02 Komunikace	2	1	2	7.8.23	12.8.23
73778	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO02 Komunikace	3	1	2	14.8.23	19.8.23
76105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO02 Komunikace	3	1	0	14.8.23	19.8.23
76255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 1 SO02 Komunikace	3	1	1	14.8.23	19.8.23
76305	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO02 Komunikace	5	3	0	14.8.23	2.9.23
76900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 SO02 Komunikace	2	1	1	21.8.23	26.8.23
79309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 1 SO02 Komunikace	3	1	2	28.8.23	2.9.23
79759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 SO02 Komunikace	2	1	0	4.9.23	9.9.23
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO02 Komunikace	15	2	2	21.8.23	2.9.23
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO02 Komunikace	1	1	0	11.9.23	16.9.23

Činnost: kritická - ▬, zpožděná - ▬, s rezervou - ▬, rezerva - ⊢ — ⊣, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Studentská verze
