ID	OS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		zahájení prací na stavbě	0 dny	2.2. 15	2.2. 15
3	**D1001**	**zajištění příjezdů na staveniště**	**65,4 dny**	**2.2. 15**	**7.4. 15**
8	D1002	ostrha staveniště a přístupový	870 dny	7.4. 15	15.9. 17
9	**D2000**	**Shell & core**	**895 dny**	**7.4. 15**	**9.10. 17**
10		zahájení prací na OS	0 dny	7.4. 15	7.4. 15
11		zařízení staveniště a výkopy	895 dny	7.4. 15	9.10. 17
12		**Přestavba objekt E**	**174 dny**	**7.4. 15**	**24.9. 15**
13		zahaeni	0 dny	7.4. 15	7.4. 15
14		L-1	0 dny	17.7. 15	17.7. 15
15		L-M	0 dny	24.9. 15	24.9. 15
16		Propojení krytá rampa a	0 dny	24.9. 15	24.9. 15
17		dokončena přestavba E	0 dny	24.9. 15	24.9. 15
18		uzavření povrchového parkoviště	0 dny	15.10. 15	15.10. 15
19		**obj D - založení a skelet včt. MK a**	**355 dny**	**18.6. 15**	**20.6. 16**
20		zahajeni	0 dny	18.6. 15	18.6. 15
21		dokončení betonáže ŽB skelet	0 dny	1.5. 16	1.5. 16
22		ukončení montáže OK kin včt	0 dny	10.6. 16	10.6. 16
23		ostraněno veškeré bednění a	0 dny	20.6. 16	20.6. 16
24		**opláštění**	**535 dny**	**25.2. 16**	**24.8. 17**
25		zahajeni	0 dny	25.2. 16	25.2. 16
26		střecha obj D a A vodotěsná a	0 dny	1.8. 16	1.8. 16
27		střecha kin vodotěsná	0 dny	10.9. 16	10.9. 16
28		dokončení opláštění kin	0 dny	20.9. 16	20.9. 16
29		uzavřeno opláštění proti	0 dny	30.9. 16	30.9. 16
30		dokončeno kompletní	0 dny	24.8. 17	24.8. 17
31		dokončení prací na Os	0 dny	10.10. 17	10.10. 17
32	D4000	sádrokartonové kce	319 dny	30.9. 16	24.8. 17
33	D4100	ostatní dokončovací kce	451 dny	21.5. 16	24.8. 17
34	A4101	WC západ obj A	75 dny	1.7. 15	14.9. 15
35	D4200	shopfrots	141 dny	8.12. 16	14.11. 17
36	D4300	betonové podlahy	175 dny	13.5. 16	7.7. 17
37	D4400	epoxy podlahy	74 dny	22.12. 16	24.8. 17
38	D4500	kamenné podlahy	147 dny	25.11. 16	21.9. 17
39	D4600	koberce	61 dny	13.1. 17	21.9. 17
40	D4700	dřevěné podlahy	119 dny	2.1. 17	21.9. 17
41	D5000	cinema fitout	118 dny	20.8. 16	16.12. 16
42	D5100	foodcourt speciální zařízení	13 dny	2.2. 17	14.2. 17
43	D5500	nábytek	86 dny	2.1. 17	21.9. 17
44	D5700	orientační systém	93 dny	8.1. 17	21.9. 17
45	D5800	Wow prvek	66 dny	19.7. 17	21.9. 17
46	D5900	odpdové a úklidové hospodářství	31 dny	12.1. 17	11.2. 17
47	D6000	HVAC- vytápění, ventilace a chlazení	451 dny	21.5. 16	24.8. 17
48	D6001	Měření a regulace	351 dny	29.8. 16	24.8. 17
49	D6500	Sprinklery	420 dny	20.6. 16	24.8. 17
50	D6700	Speciální technika	174 dny	2.10. 15	30.1. 17
51	D7000	Elektro instalace- silnoproud Vna NN	402 dny	10.7. 16	24.8. 17
52	D7100	Osvětlovací tělesa	107 dny	2.1. 17	24.8. 17
53	D7500	Vertikální doprava	138 dny	6.4. 16	24.8. 17
54	D7700	Elektro instalace - slaboproud	351 dny	29.8. 16	24.8. 17
55	D7800	Parkovací systém	94 dny	30.10. 16	11.2. 17
56	D9000	Venkovní práce	252 dny	7.12. 16	24.8. 17
57	D9500	Sadové úpravy	77 dny	8.7. 17	21.9. 17
58		dokončení prací v podzemním	0 dny	11.2. 17	11.2. 17
59		dokončení prací v části zážitkové	0 dny	11.2. 17	11.2. 17
60		předání prostor fitout 1:	0 dny	30.9. 16	30.9. 16
61		předání prostor fitout 3: kina	0 dny	16.12. 16	16.12. 16
62		předání rostor pro fitout 3: Velké NJ	0 dny	14.4. 17	14.4. 17
63		předání rostor pro fitout 3:	0 dny	13.6. 17	13.6. 17
64		fyzické dokončení bez VaN - u	0 dny	24.8. 17	24.8. 17
65		fyzické dokončení bez VaN - u OS	0 dny	21.9. 17	21.9. 17
66		přebírání, zprovozňování, příprava	29 dny	24.8. 17	21.9. 17
67		Připravenost ke kolaudaci	0 dny	21.9. 17	21.9. 17

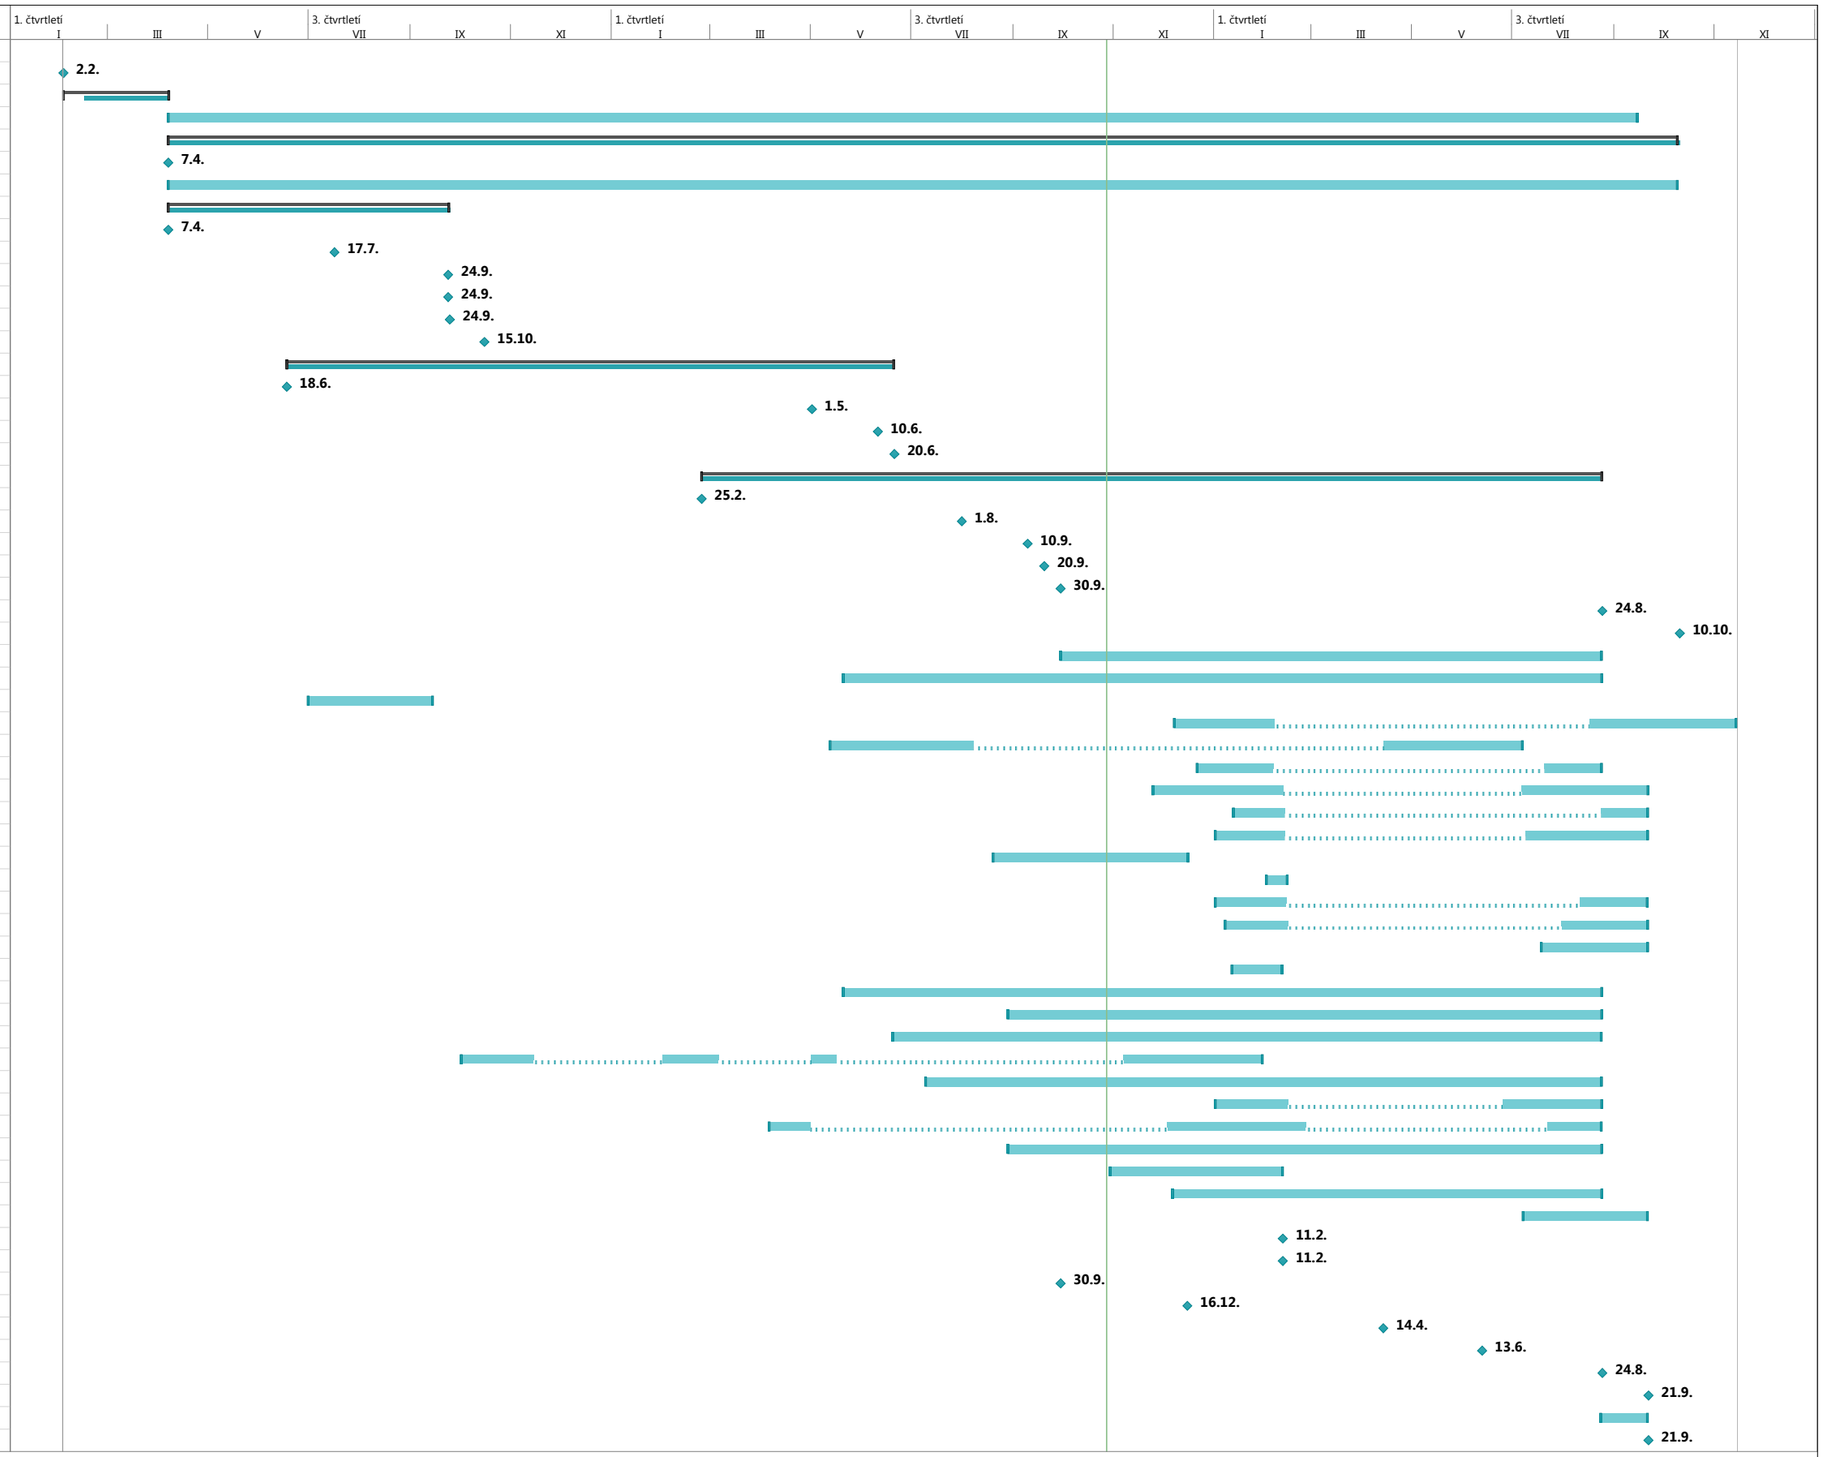

Projekt: Projekt1

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			
