HARMONOGRAM ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
1	**Investiční projekt TWY-G, TWY-F, křížení TWY-F a RWY 12-30**	**278 dny**	**26.8. 16**	**31.5. 17**		
2	**I. Fáze schválení IŽ**	**124 dny**	**26.8. 16**	**28.12. 16**		
3	Založení IŽ	0 dny	26.8. 16	26.8. 16		4
4	Schvalování ve WF1	6 dny	26.8. 16	1.9. 16	3	5
5	Schvalování IŽ ve WF3	0 dny	28.12. 16	28.12. 16	4	17
6	**Schvalování změn v IŽ**	**65 dny**	**1.2. 17**	**7.4. 17**		
7	Změna investiční žádosti	0 dny	1.2. 17	1.2. 17		8
8	Schvalování změn IŽ ve WF3	65 dny	1.2. 17	7.4. 17	7	
9	**II. Fáze VŘ na PD**	**14 dny**	**9.11. 16**	**23.11. 16**		
10	Poptávání v rámci souhrnné poptávky pro LP	14 dny	9.11. 16	23.11. 16		12
11	**III. Fáze vypracování PD**	**64 dny**	**23.11. 16**	**26.1. 17**		
12	Vypracování PD	35 dny	23.11. 16	28.12. 16	10	13
13	Obdržení čistopisů	0 dny	28.12. 16	28.12. 16	12	17
14	Oprava PD dle poznámky uchazečů ve VŘ na realizaci	0 dny	26.1. 17	26.1. 17		
15	**V. Fáze VŘ na Realizaci**	**119 dny**	**15.11. 16**	**14.3. 17**		
16	Zadáno na CNL - požadavek na zahájení VŘ	0 dny	15.11. 16	15.11. 16		17
17	Zveřejnění ZD	0 dny	28.12. 16	28.12. 16	16;5;13	18
18	Poptávání zhotovitele	58 dny	28.12. 16	24.2. 17	17	19
19	Schválení zápisu z komise	0 dny	24.2. 17	24.2. 17	18	20
20	Podpis SOD - Skanska	0 dny	6.3. 17	6.3. 17	19	21
21	Podpis SOD - ČAH	0 dny	14.3. 17	14.3. 17	20	23FS+1 den
22	**VI. Fáze Realizace**	**77 dny**	**15.3. 17**	**31.5. 17**		
23	Předání staveniště	1 den	15.3. 17	16.3. 17	21FS+1 den	24
24	Realizace	75 dny	16.3. 17	30.5. 17	23	25
25	Předání díla	1 den	30.5. 17	31.5. 17	24	

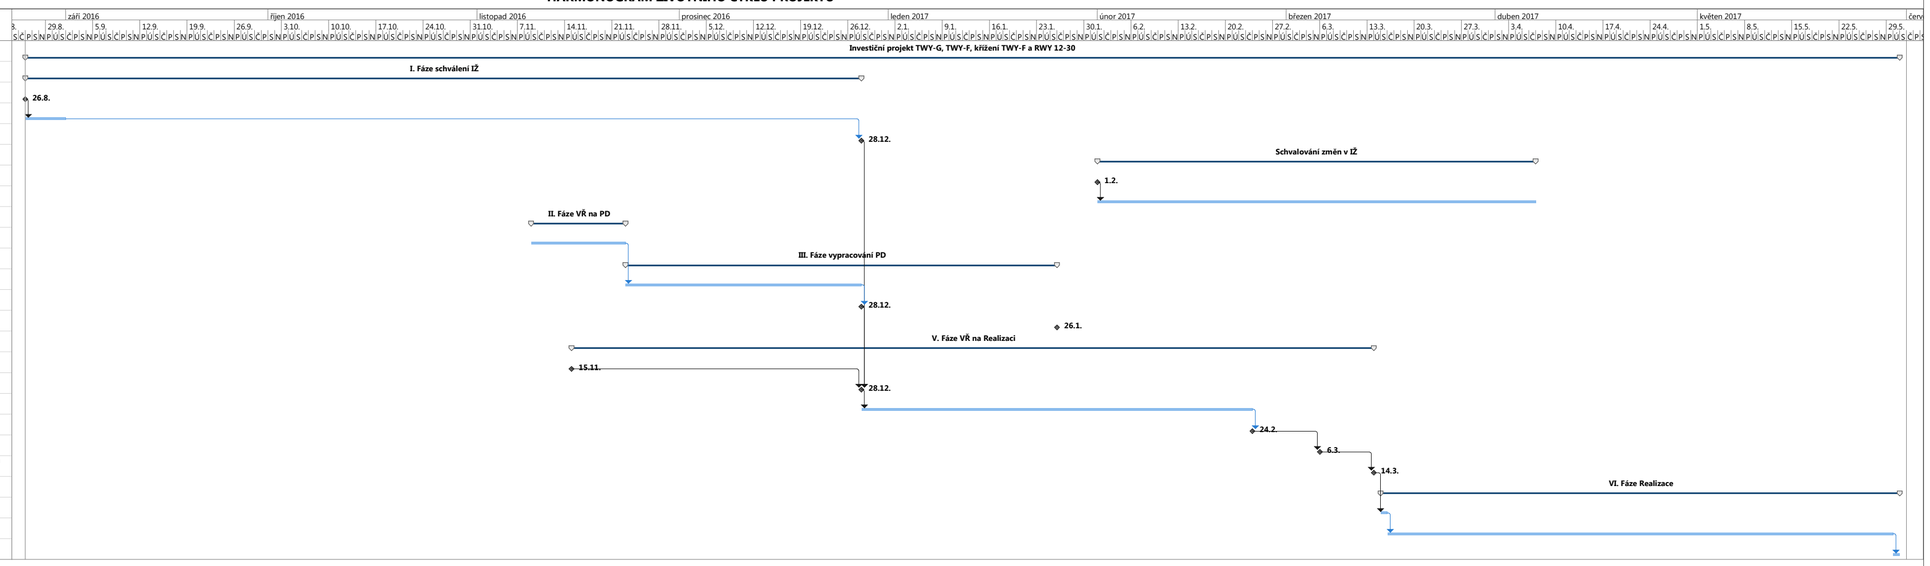

Projekt: HMG Skutečnost | Úkol | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Ruční úkol

Příloha č.4
