CONTEC - Časový graf akce: 00ZS0VRN Polyfunkční dům - AFI Vokovice

26.12.17

ZS+VRN

Index Dodav.	Název činnosti Smlouva	Pracovníků	Doba [Hd]	Rez.	Začátek	Konec model	Konec model
10	VODLIŠÍ IO2P NÁKLADY	10	2	0	2.5.18	11.5.18	11.5.18
20	KAČENÍ POROSTU	2	1	0	14.5.18	18.5.18	
30	Přeložka VN	5	6	0	21.5.18	29.6.18	
40	TRAFO	6	13	0	21.5.18	17.8.18	
50	Přelož. SLABO	5	8	0	2.7.18	24.8.18	
60	Přelož. KAN	7	15	0	9.7.18	19.10.18	
70	Přelož. VOD	4	15	0	16.7.18	26.10.18	
80	Přelož. PLYN NTL	3	15	0	23.7.18	2.11.18	
90	Přelož. PLYN STL	3	15	0	30.7.18	9.11.18	
100	Demolice A	12	19	0	22.10.18	1.3.19	
110	Demolice B	16	23	0	22.10.18	29.3.19	
120	OBJEKT A	56	160	0	1.4.19	22.4.22	
130	OBJEKT B	27	87	0	13.4.20	10.12.21	
140	VODOV. PŘÍP.	5	8	0	13.4.20	5.6.20	
150	Retenční nádrže	5	11	0	13.4.20	26.6.20	
160	Kanal příp	5	9	0	29.6.20	28.8.20	
170	Data přípojka	5	6	0	31.8.20	9.10.20	
180	Plyn. přípojka	5	7	0	12.10.20	27.11.20	
190	Opětná stěna	9	8	0	21.6.21	13.8.21	
200	Aval. ověření	5	5	0	16.8.21	17.9.21	
210	Kontrukace	14	11	0	20.9.21	3.12.21	
220	Sadové úpravy	3	3	0	6.12.21	23.12.21	

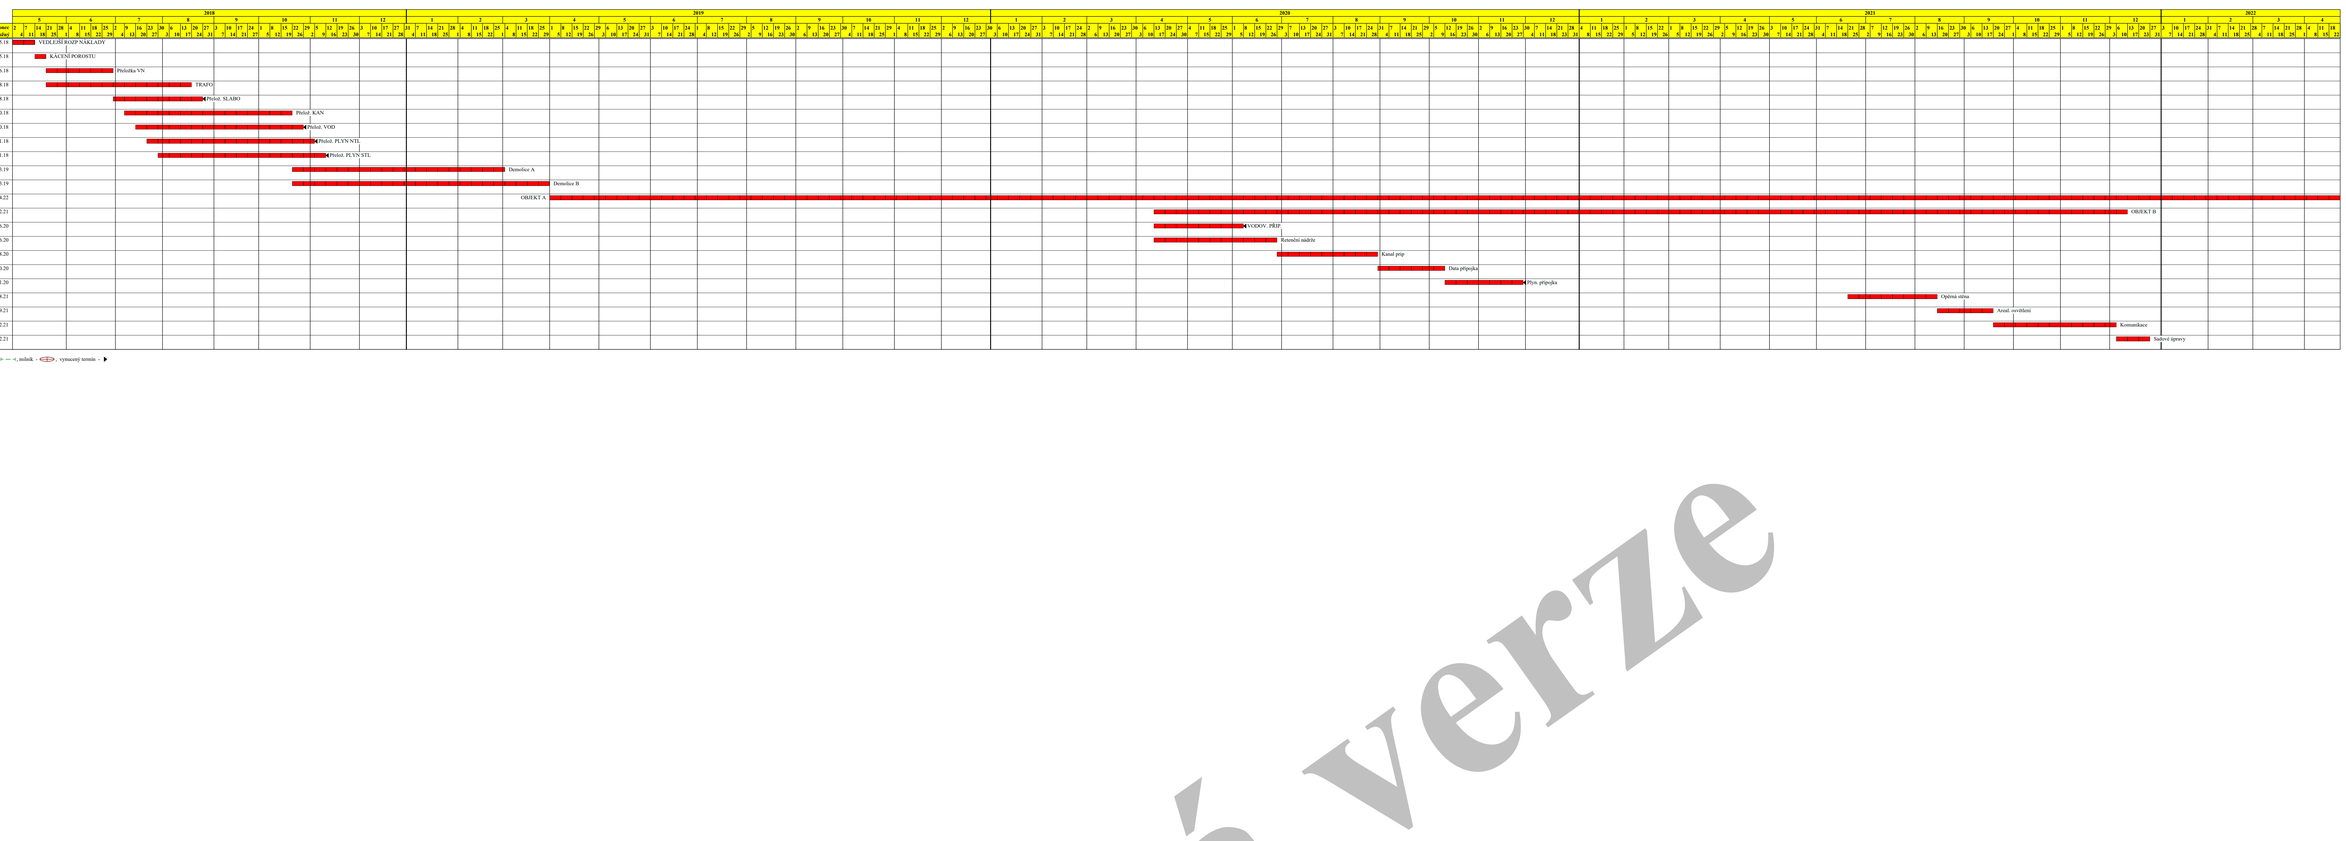

Činnost: kritická - , zpožděná , s rezervou , rezerva - > - -4, milník - , vymezený termín -

Studentská verze
