CONTEC - Časový graf akce: 1BDRFINN Rekonstrukce Bytového domu Roháčova

8.12.18 PŘELOŽKA KANALIZ

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
5	Zemní práce, bourání 1 PŘELOŽKA KANALIZ	8	1	1	1.3.18	3.3.18
30	Hrubá vrchní stavba 1 PŘELOŽKA KANALIZ	5	1	0	5.3.18	10.3.18
60	Omítky a potěry 1 PŘELOŽKA KANALIZ	6	3	0	12.3.18	31.3.18
90	Vnější úpravy 1 PŘELOŽKA KANALIZ	4	3	0	19.3.18	7.4.18
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘELOŽKA KANALIZ	1	1	0	2.4.18	7.4.18
10005	Zemní práce, bourání 1 PŘELOŽKA VODA	8	1	1	1.3.18	3.3.18
10030	Hrubá vrchní stavba 1 PŘELOŽKA VODA	5	1	0	5.3.18	10.3.18
10060	Omítky a potěry 1 PŘELOŽKA VODA	5	3	1	12.3.18	31.3.18
10090	Vnější úpravy 1 PŘELOŽKA VODA	4	3	0	19.3.18	7.4.18
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘELOŽKA VODA	1	1	0	2.4.18	7.4.18
20005	Zemní práce, bourání 1 PŘELOŽKA PLYN	8	1	1	1.3.18	3.3.18
20030	Hrubá vrchní stavba 1 PŘELOŽKA PLYN	5	1	0	5.3.18	10.3.18
20060	Omítky a potěry 1 PŘELOŽKA PLYN	4	3	0	12.3.18	31.3.18
20090	Vnější úpravy 1 PŘELOŽKA PLYN	4	3	0	19.3.18	7.4.18
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘELOŽKA PLYN	1	1	0	2.4.18	7.4.18
30005	Zemní práce, bourání 1 PŘELOŽKA VN	8	1	1	1.3.18	3.3.18
30030	Hrubá vrchní stavba 1 PŘELOŽKA VN	5	2	0	5.3.18	17.3.18
30060	Omítky a potěry 1 PŘELOŽKA VN	3	3	0	26.3.18	14.4.18
30090	Vnější úpravy 1 PŘELOŽKA VN	5	1	0	16.4.18	21.4.18
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘELOŽKA VN	1	1	0	16.4.18	21.4.18
40005	Zemní práce, bourání 1 PŘELOŽKA NN	8	1	1	1.3.18	3.3.18
40030	Hrubá vrchní stavba 1 PŘELOŽKA NN	5	2	0	5.3.18	17.3.18
40060	Omítky a potěry 1 PŘELOŽKA NN	3	3	0	26.3.18	14.4.18
40090	Vnější úpravy 1 PŘELOŽKA NN	2	3	0	2.4.18	21.4.18
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘELOŽKA NN	1	1	0	16.4.18	21.4.18
50005	Zemní práce, bourání 1 SO-01	8	42	0	1.3.18	15.12.18
50010	Zakládání 1 SO-01	2	4	2	16.4.18	12.5.18
50020	Spodní stavba 1 SO-01	1	6	13	7.5.18	16.6.18
50030	Hrubá vrchní stavba 1 SO-01	5	15	0	12.3.18	23.6.18
50040	Střecha 1 SO-01	9	14	0	9.4.18	14.7.18
50050	Příčky,hrubé instalace 1 SO-01	4	34	0	26.3.18	16.11.18

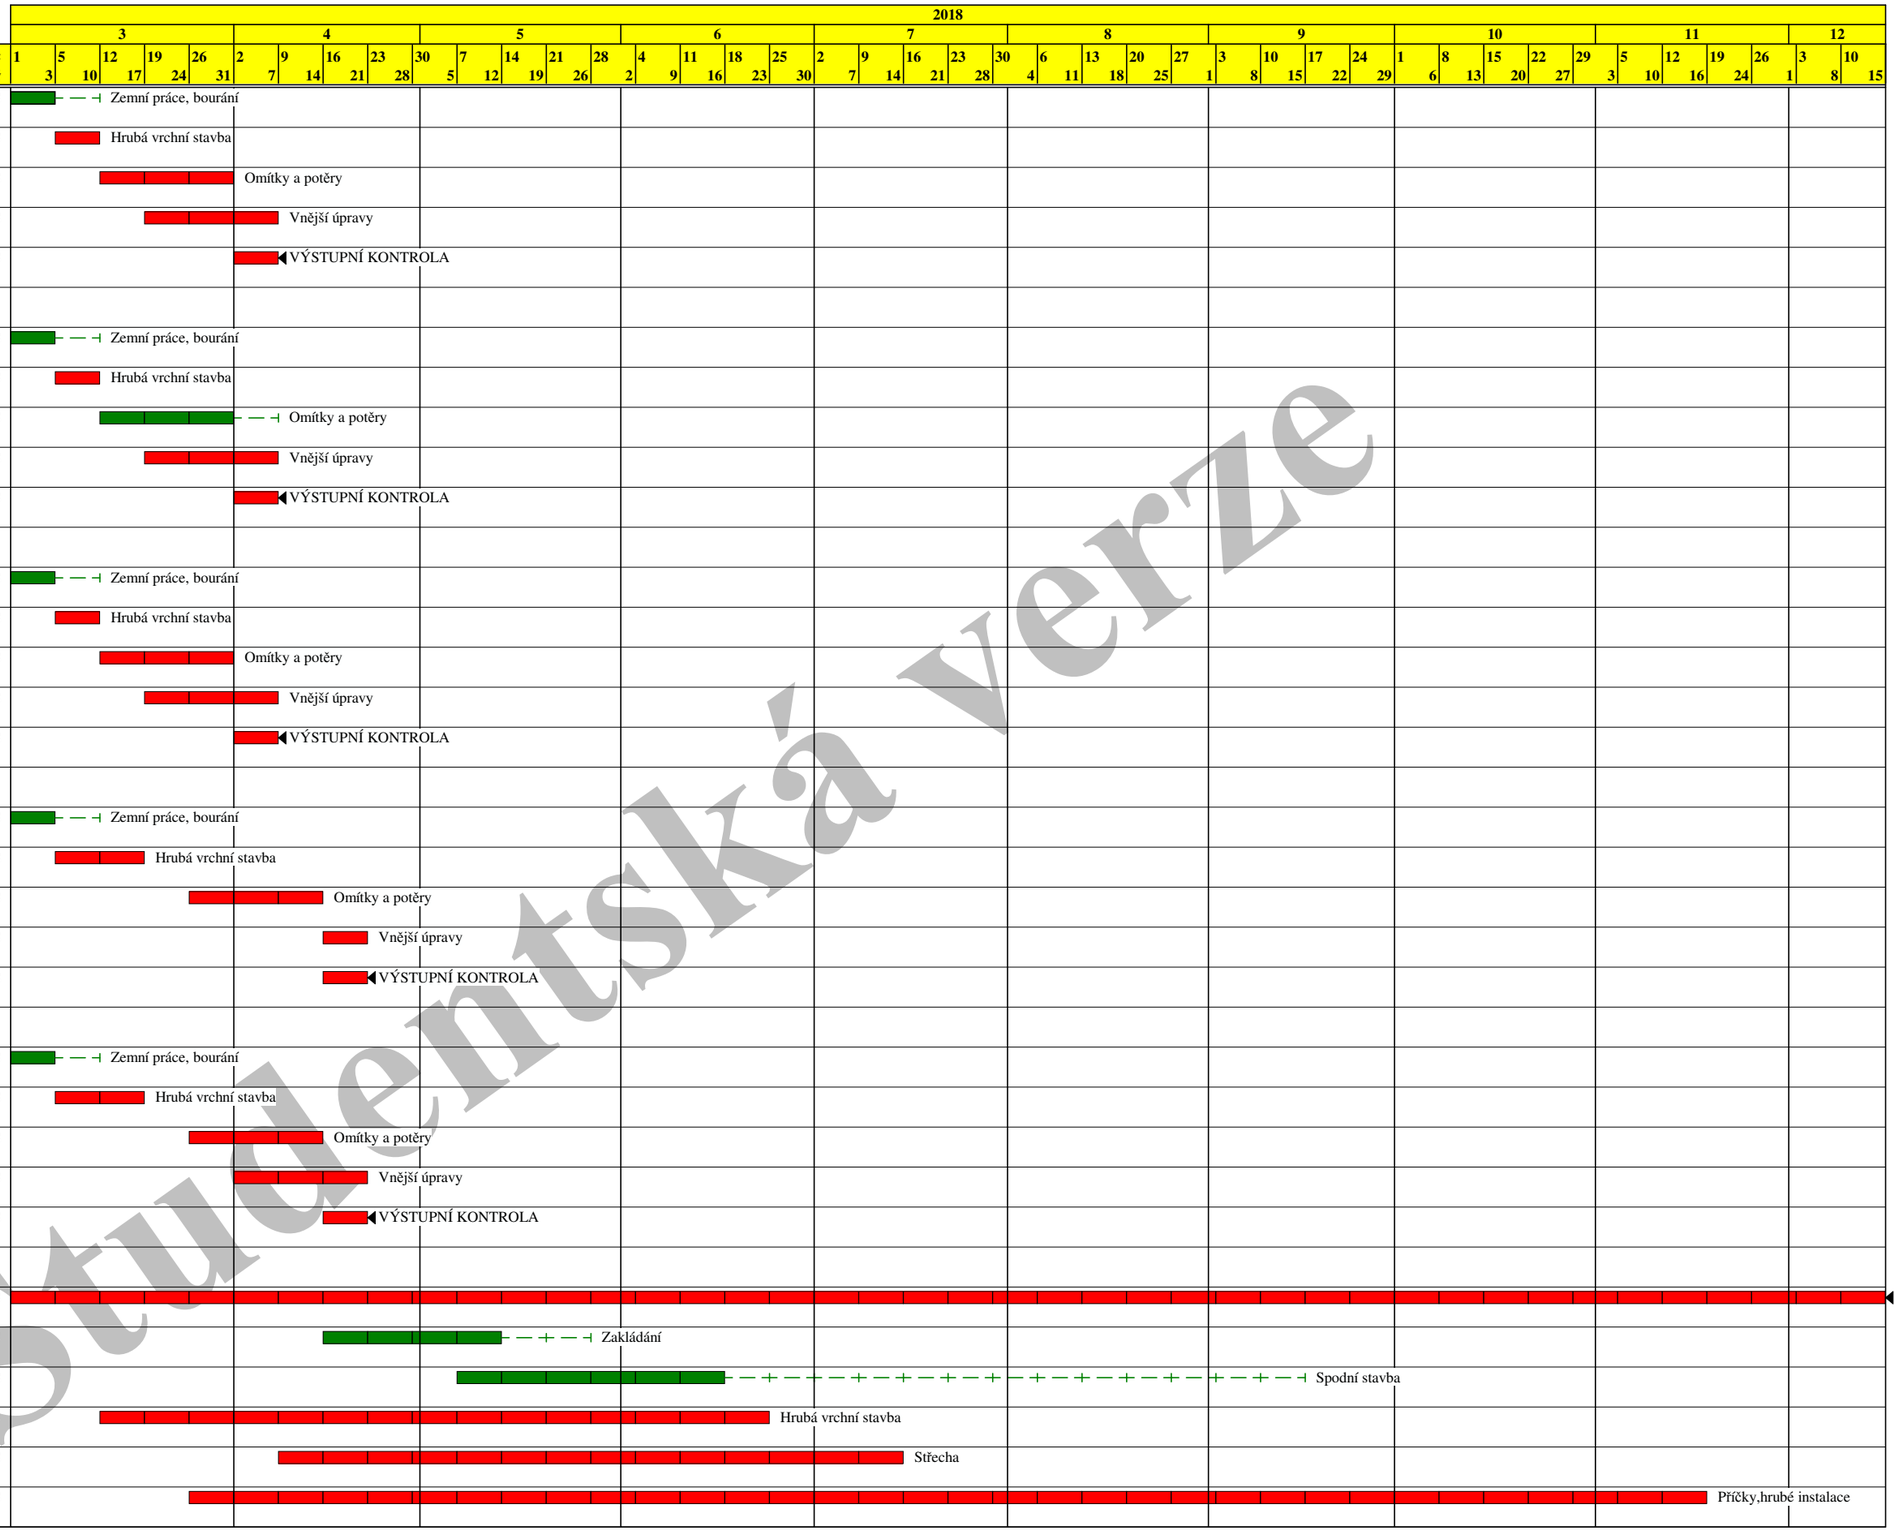

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

8.12.18 SO-01

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
50060	Omítky a potěry 1 SO-01	8	9	0	30.7.18	29.9.18
50070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO-01	3	15	0	16.7.18	27.10.18
50080	Vnitřní kompletace 1 SO-01	2	22	0	2.7.18	1.12.18
50090	Vnější úpravy 1 SO-01	7	35	2	2.4.18	1.12.18
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO-01	2	2	0	26.11.18	8.12.18
60005	Zemní práce, bourání 1 SO-02	5	3	0	2.4.18	21.4.18
60010	Zakládání 1 SO-02	2	2	0	23.4.18	5.5.18
60020	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO-02	1	1	1	7.5.18	12.5.18
60030	Hrubá vrchní stavba 1 SO-02	5	4	0	7.5.18	2.6.18
60050	Příčky,hrubé instalace 1 SO-02	2	6	1	14.5.18	23.6.18
60060	Omítky a potěry 1 SO-02	3	6	0	7.5.18	16.6.18
60070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO-02	3	5	0	18.6.18	21.7.18
60080	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 SO-02	2	1	4	18.6.18	23.6.18
60090	Vnější úpravy 1 SO-02	3	6	1	4.6.18	14.7.18
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO-02	1	2	0	23.7.18	4.8.18
70005	Zemní práce, bourání 1 SO-03	4	3	0	2.4.18	21.4.18
70010	Zakládání 1 SO-03	2	5	0	16.4.18	19.5.18
70020	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 1 SO-03	1	2	1	21.5.18	2.6.18
70030	Hrubá vrchní stavba 1 SO-03	7	2	0	21.5.18	2.6.18
70090	Vnější úpravy 1 SO-03	2	2	0	11.6.18	23.6.18
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO-03	1	2	0	25.6.18	7.7.18
80005	Zemní práce, bourání 1 SO-04	6	2	1	15.10.18	27.10.18
80030	Hrubá vrchní stavba 1 SO-04	3	3	0	29.10.18	16.11.18
80060	Omítky a potěry 1 SO-04	4	2	0	19.11.18	1.12.18
80090	Vnější úpravy 1 SO-04	1	8	0	15.10.18	8.12.18
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO-04	1	2	0	26.11.18	8.12.18
90005	Zemní práce, bourání 1 SO-05	4	1	0	15.10.18	20.10.18
90030	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO-05	2	1	0	22.10.18	27.10.18
90060	Omítky a potěry 1 SO-05	4	1	1	29.10.18	3.11.18
90090	Vnější úpravy 1 SO-05	3	2	0	5.11.18	16.11.18
90095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO-05	1	2	0	19.11.18	1.12.18

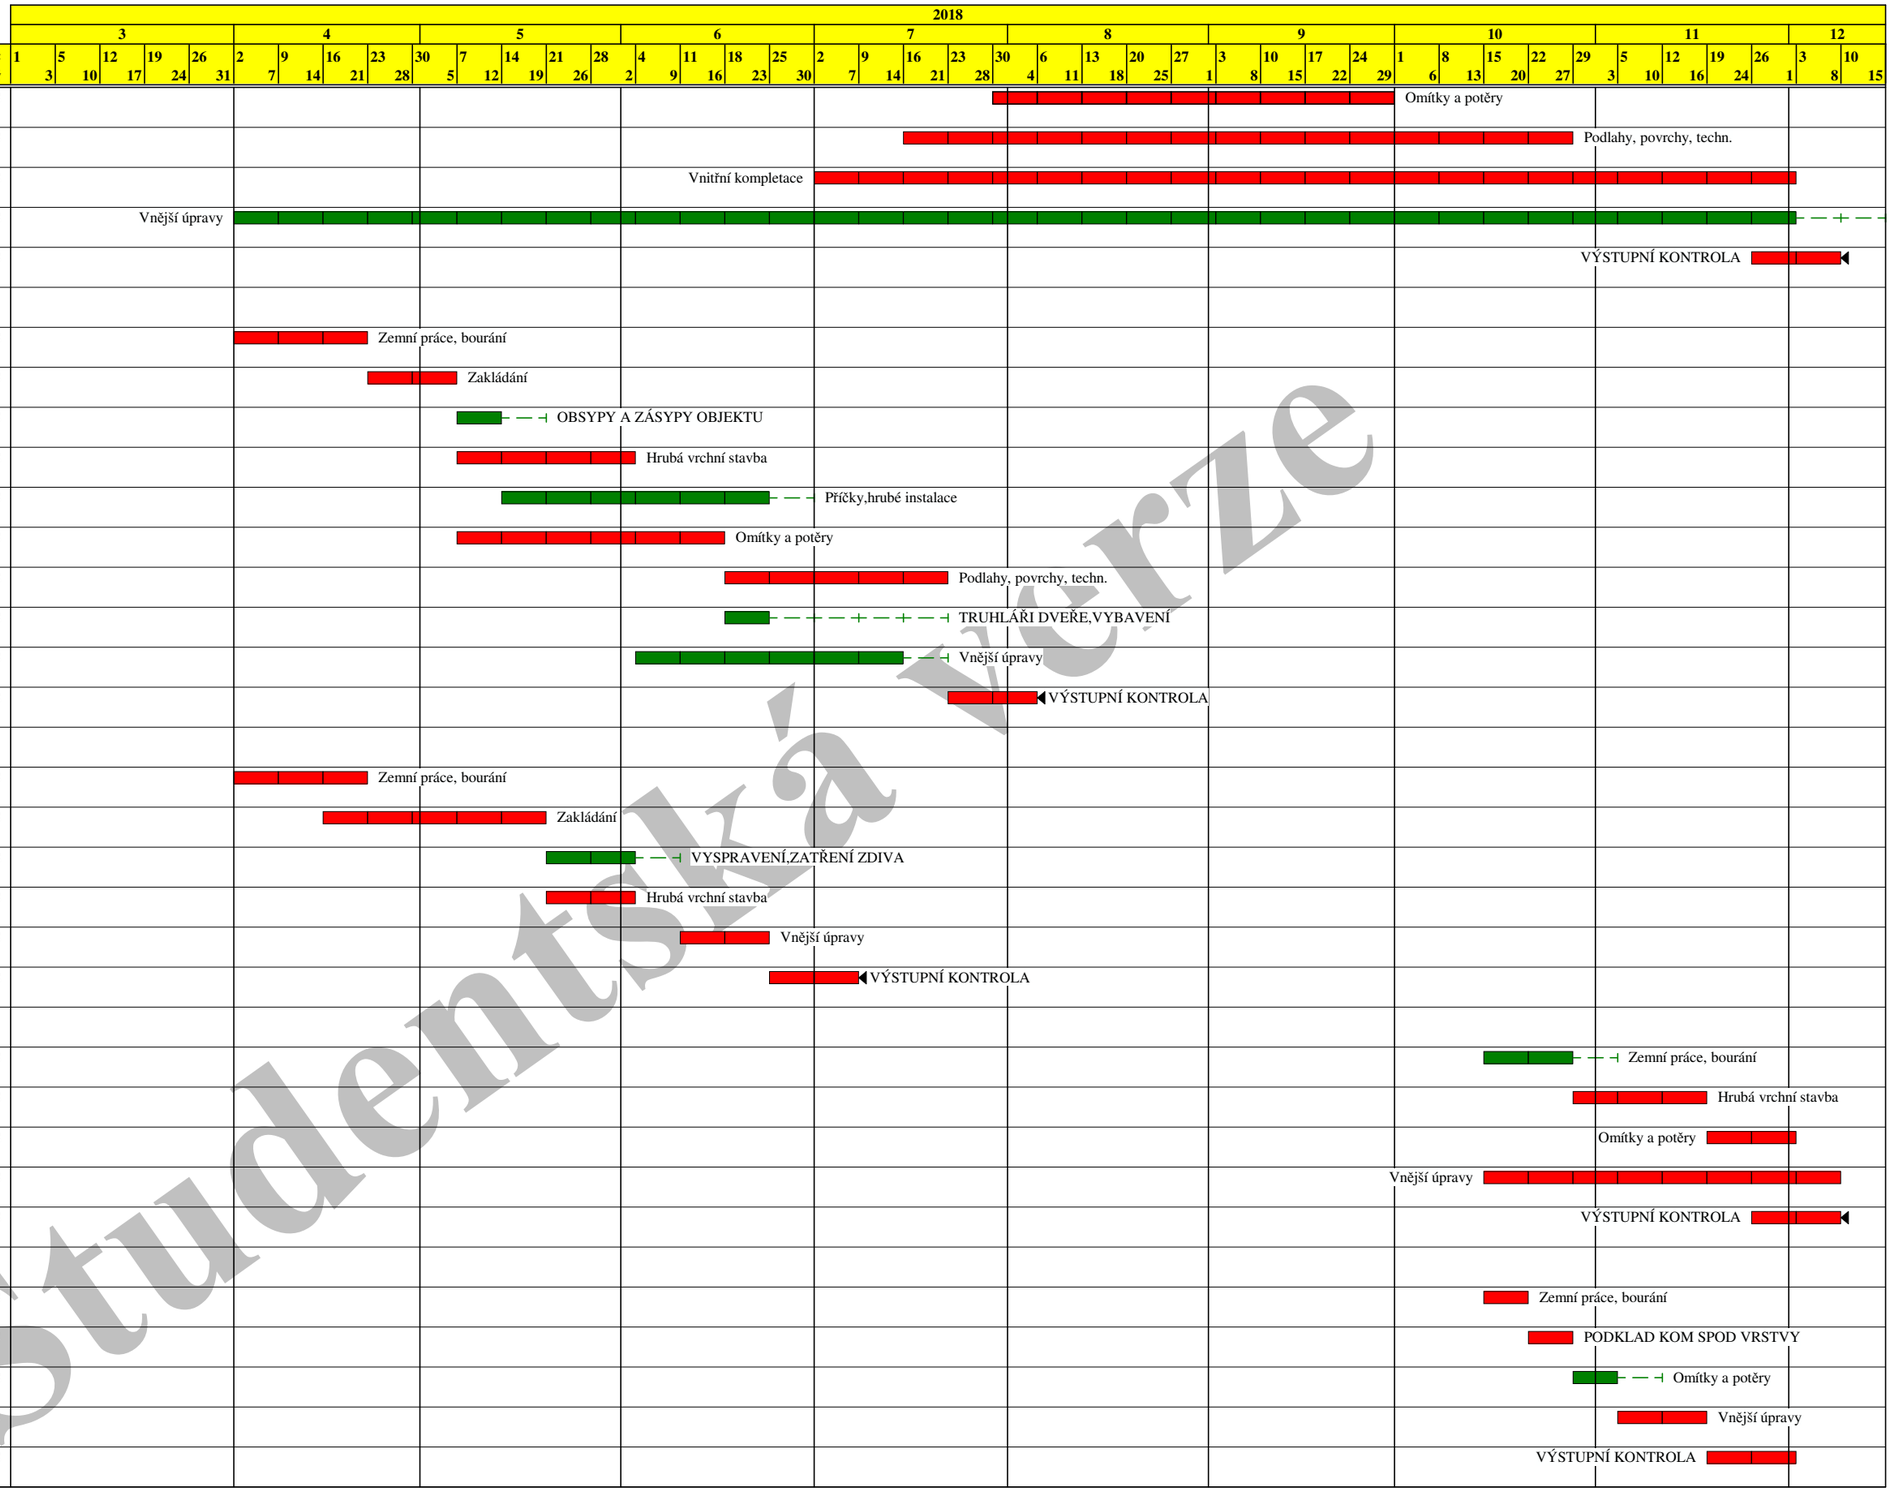

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -
