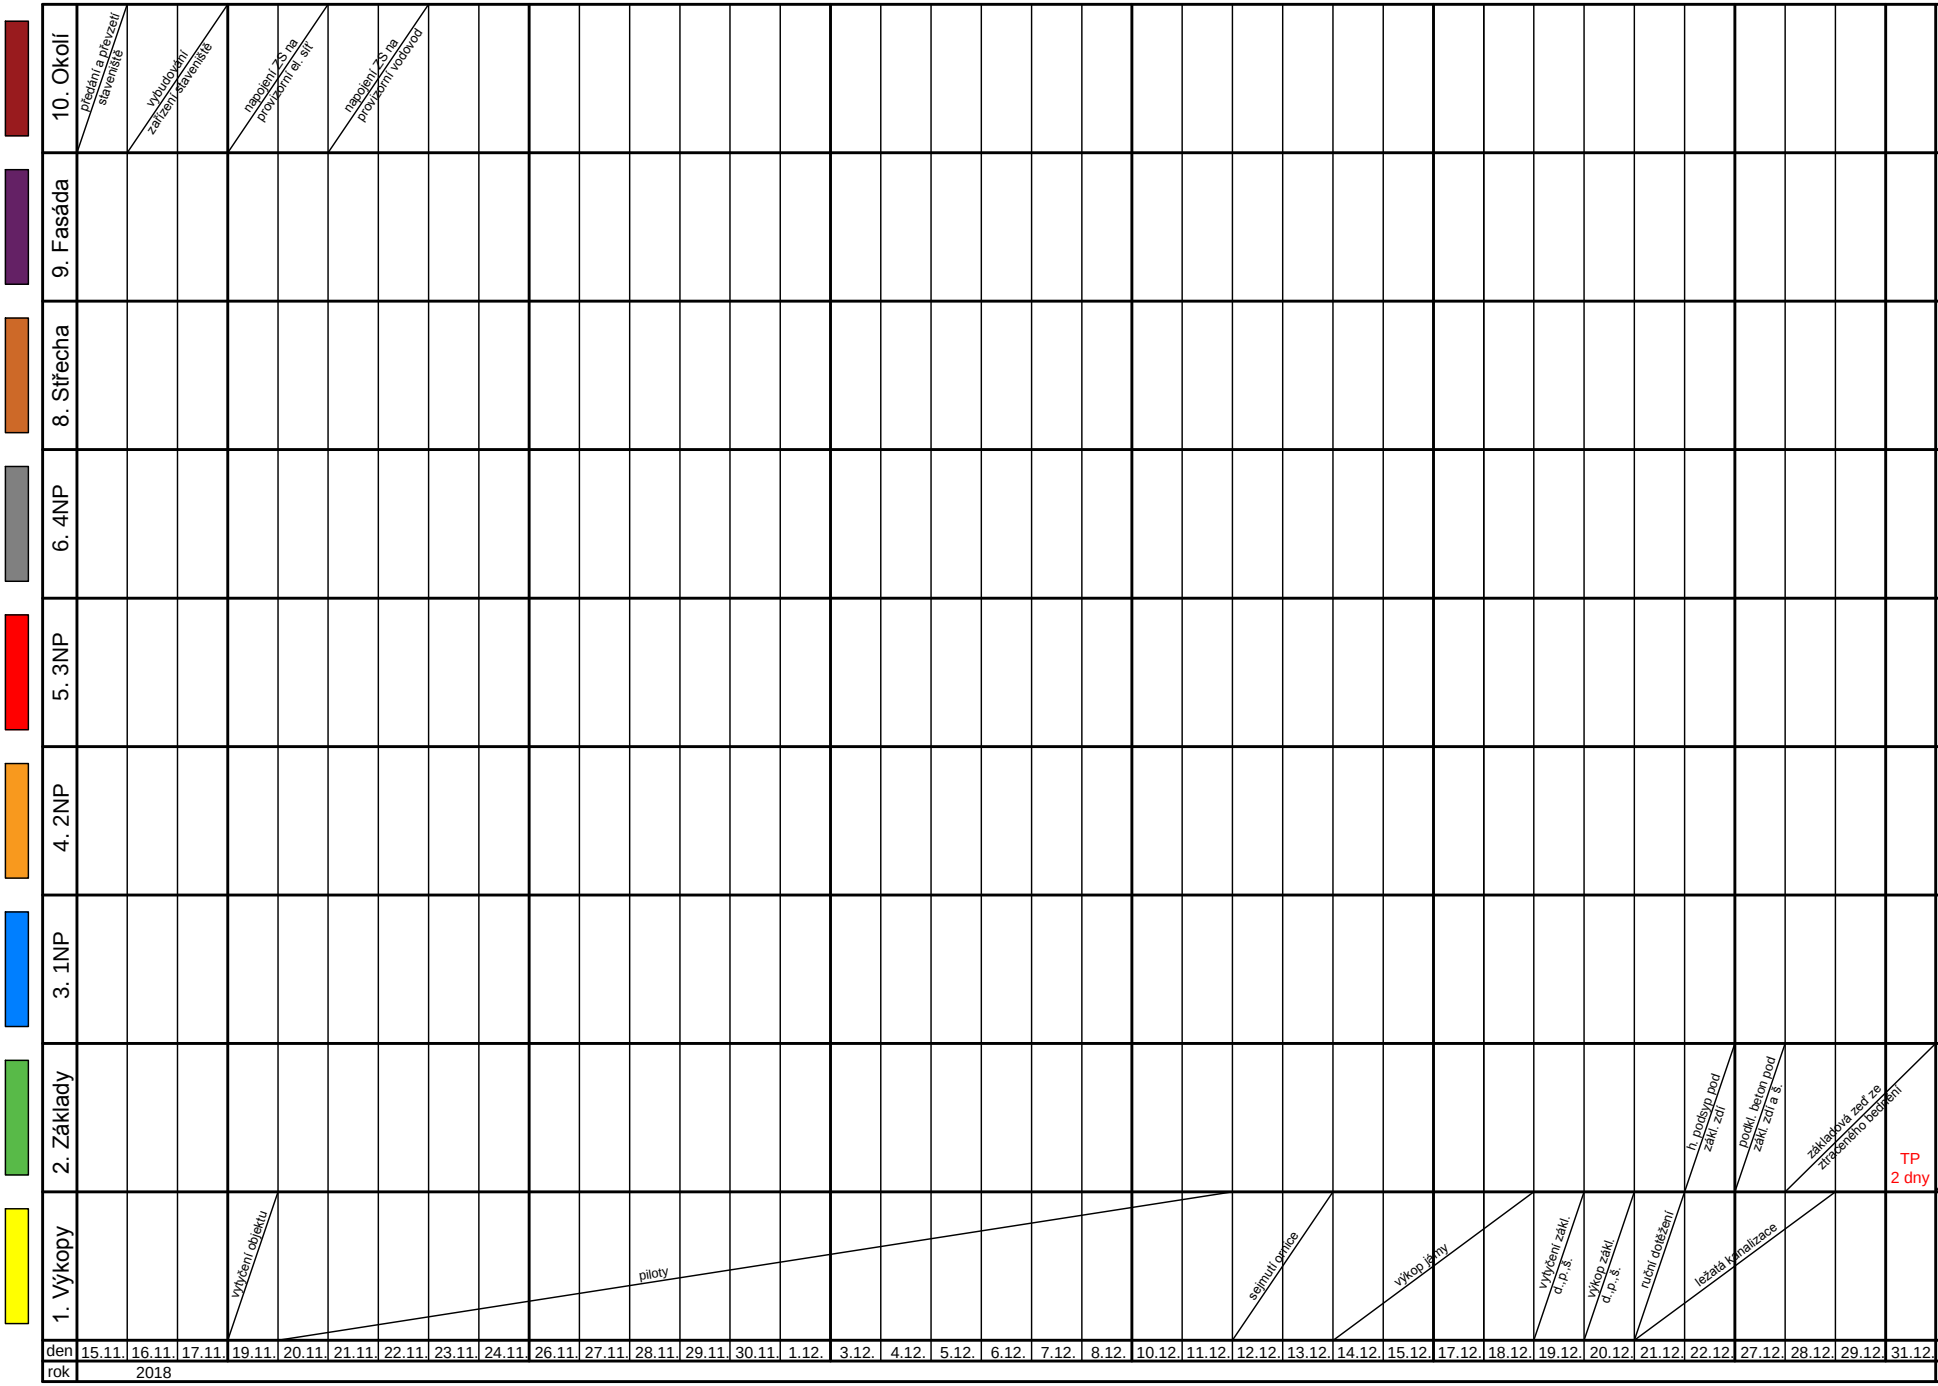

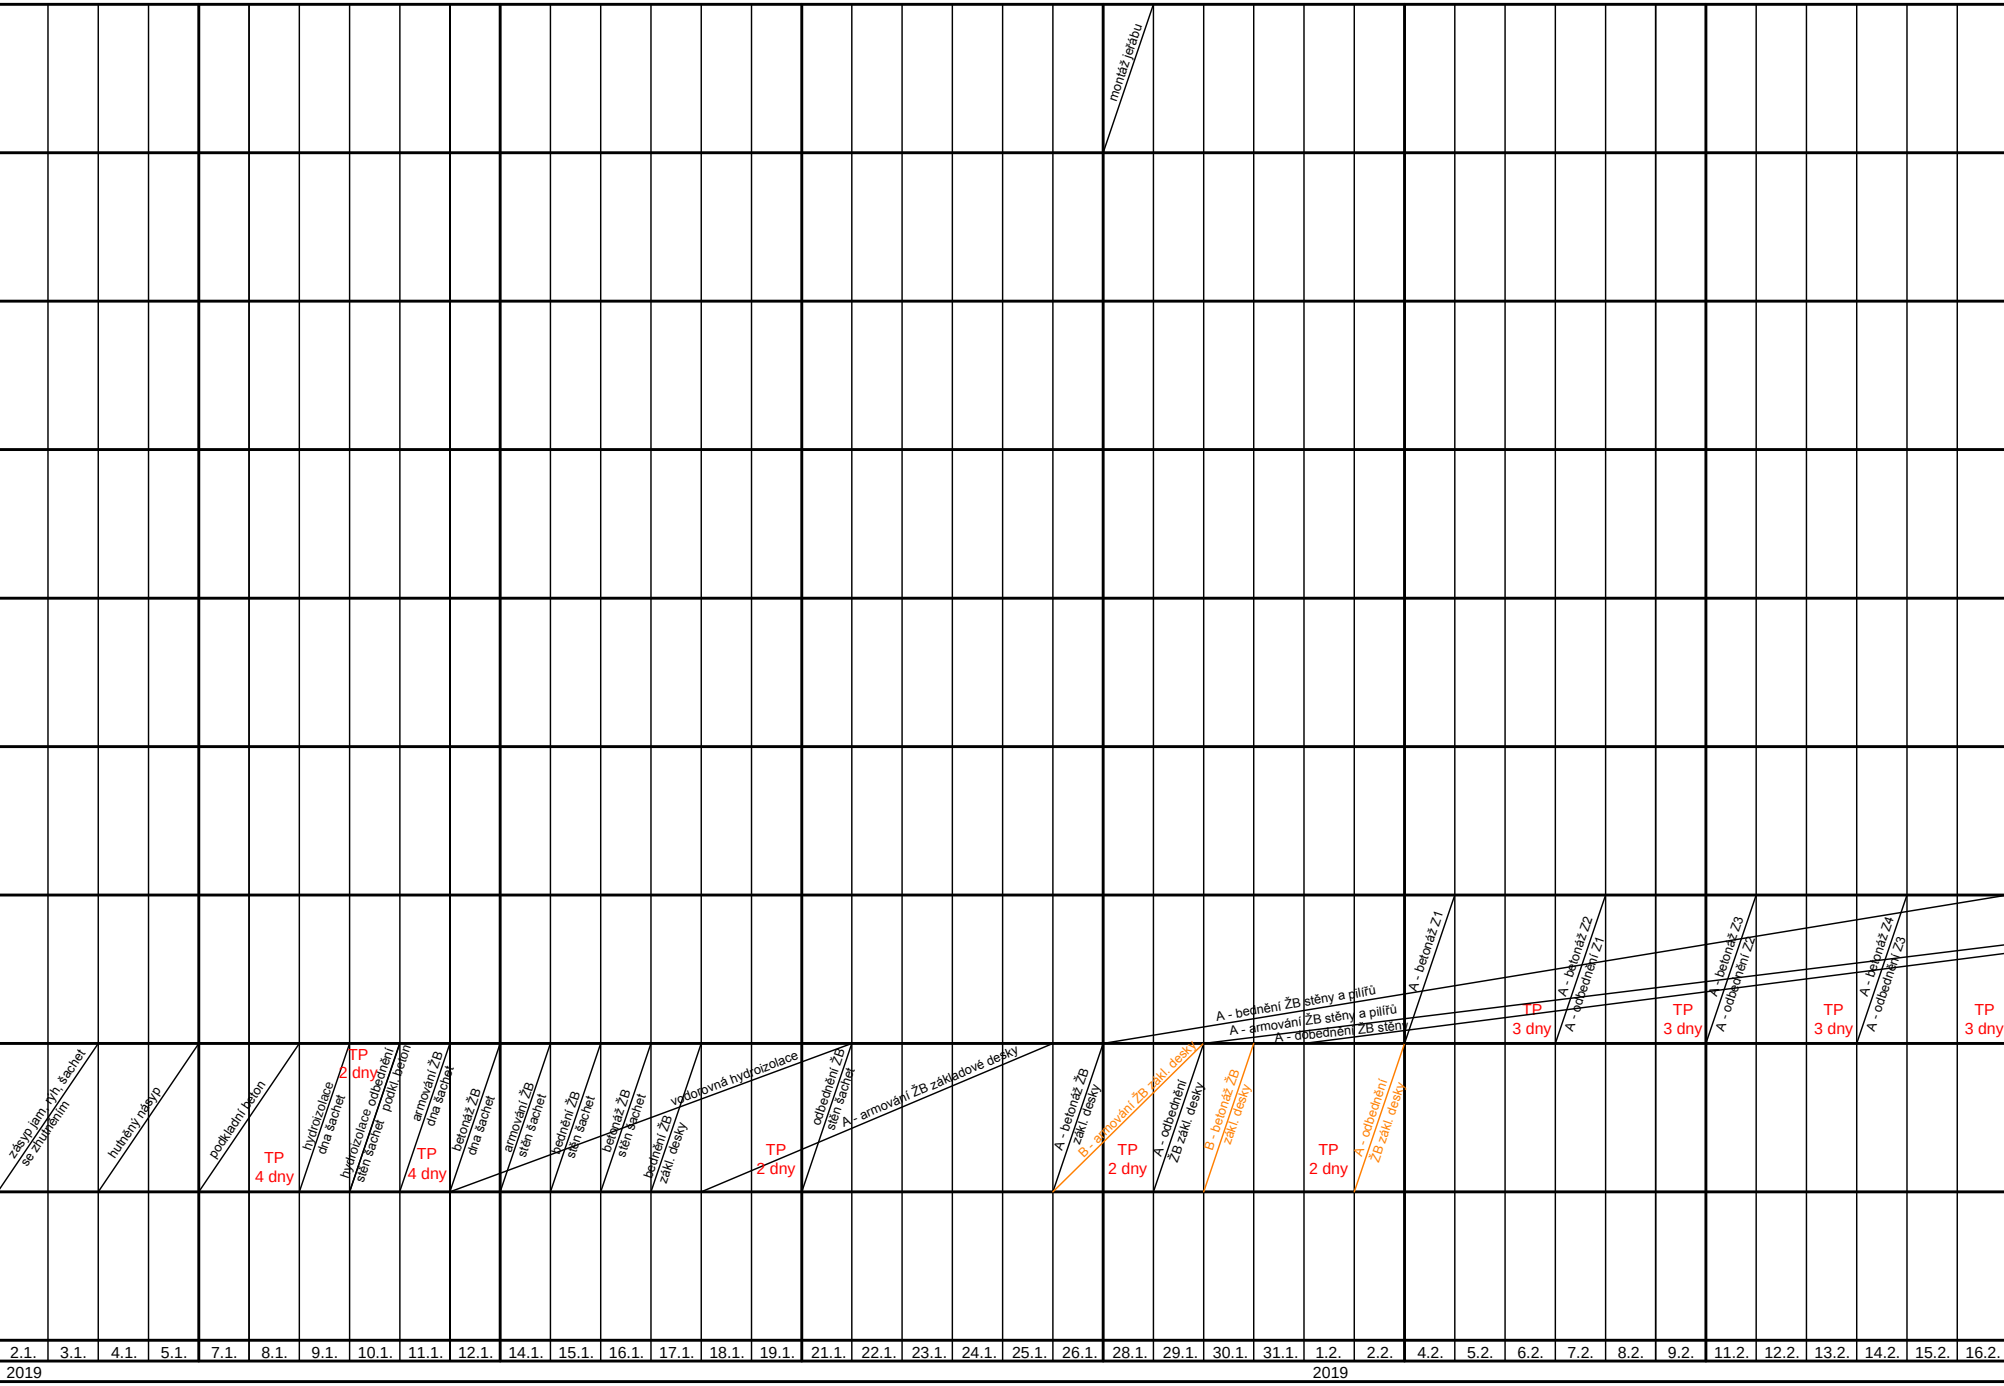

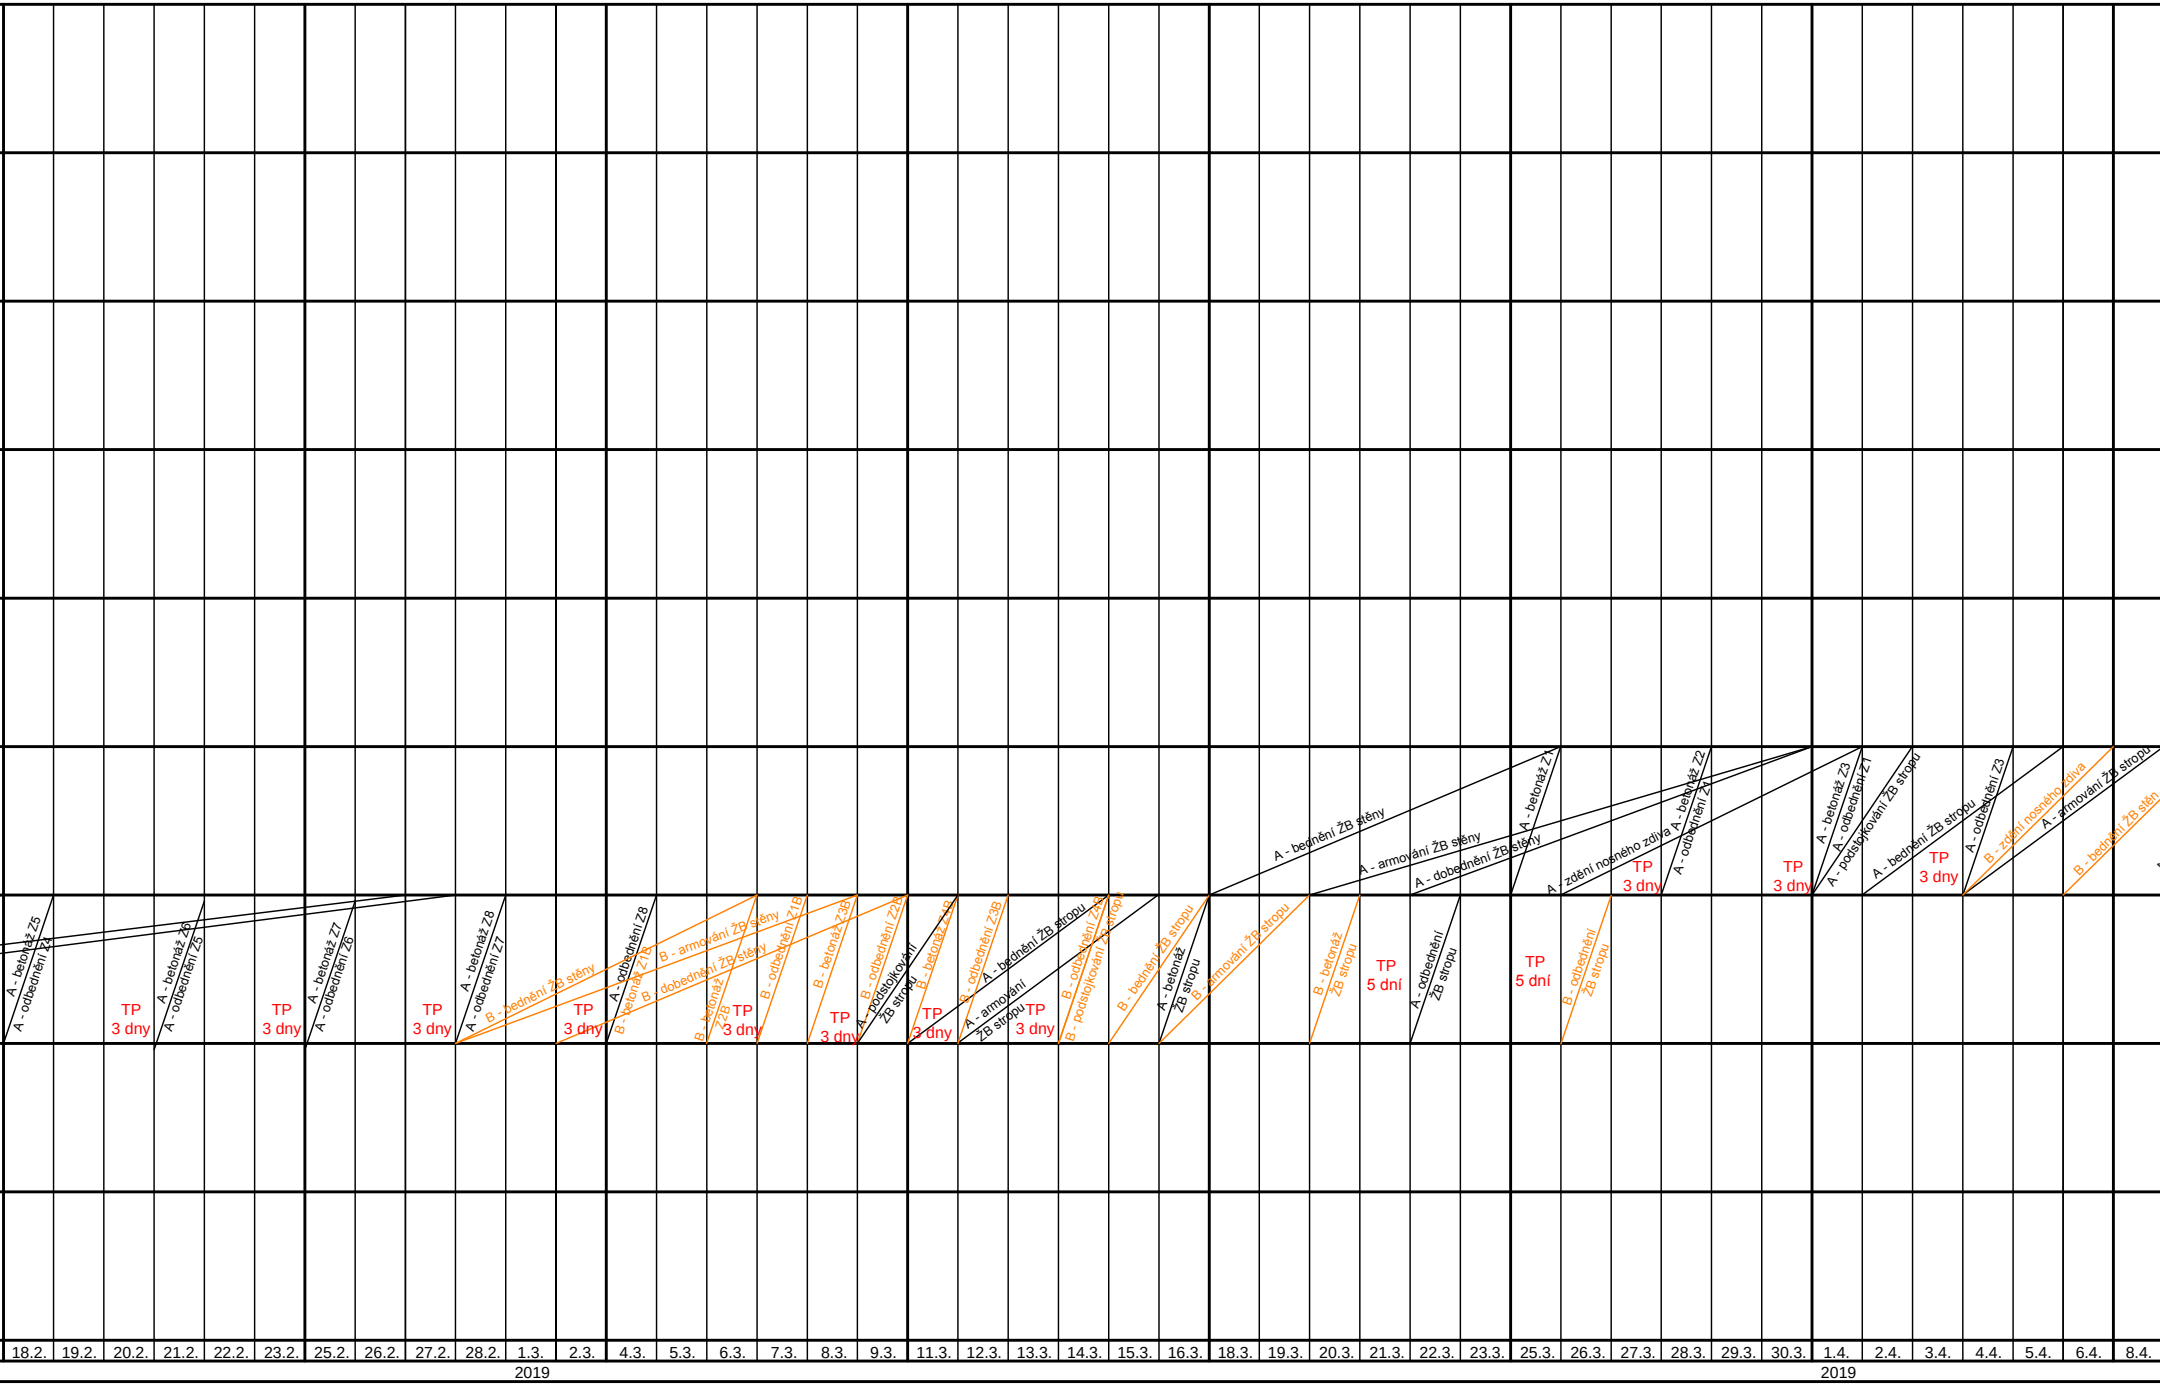

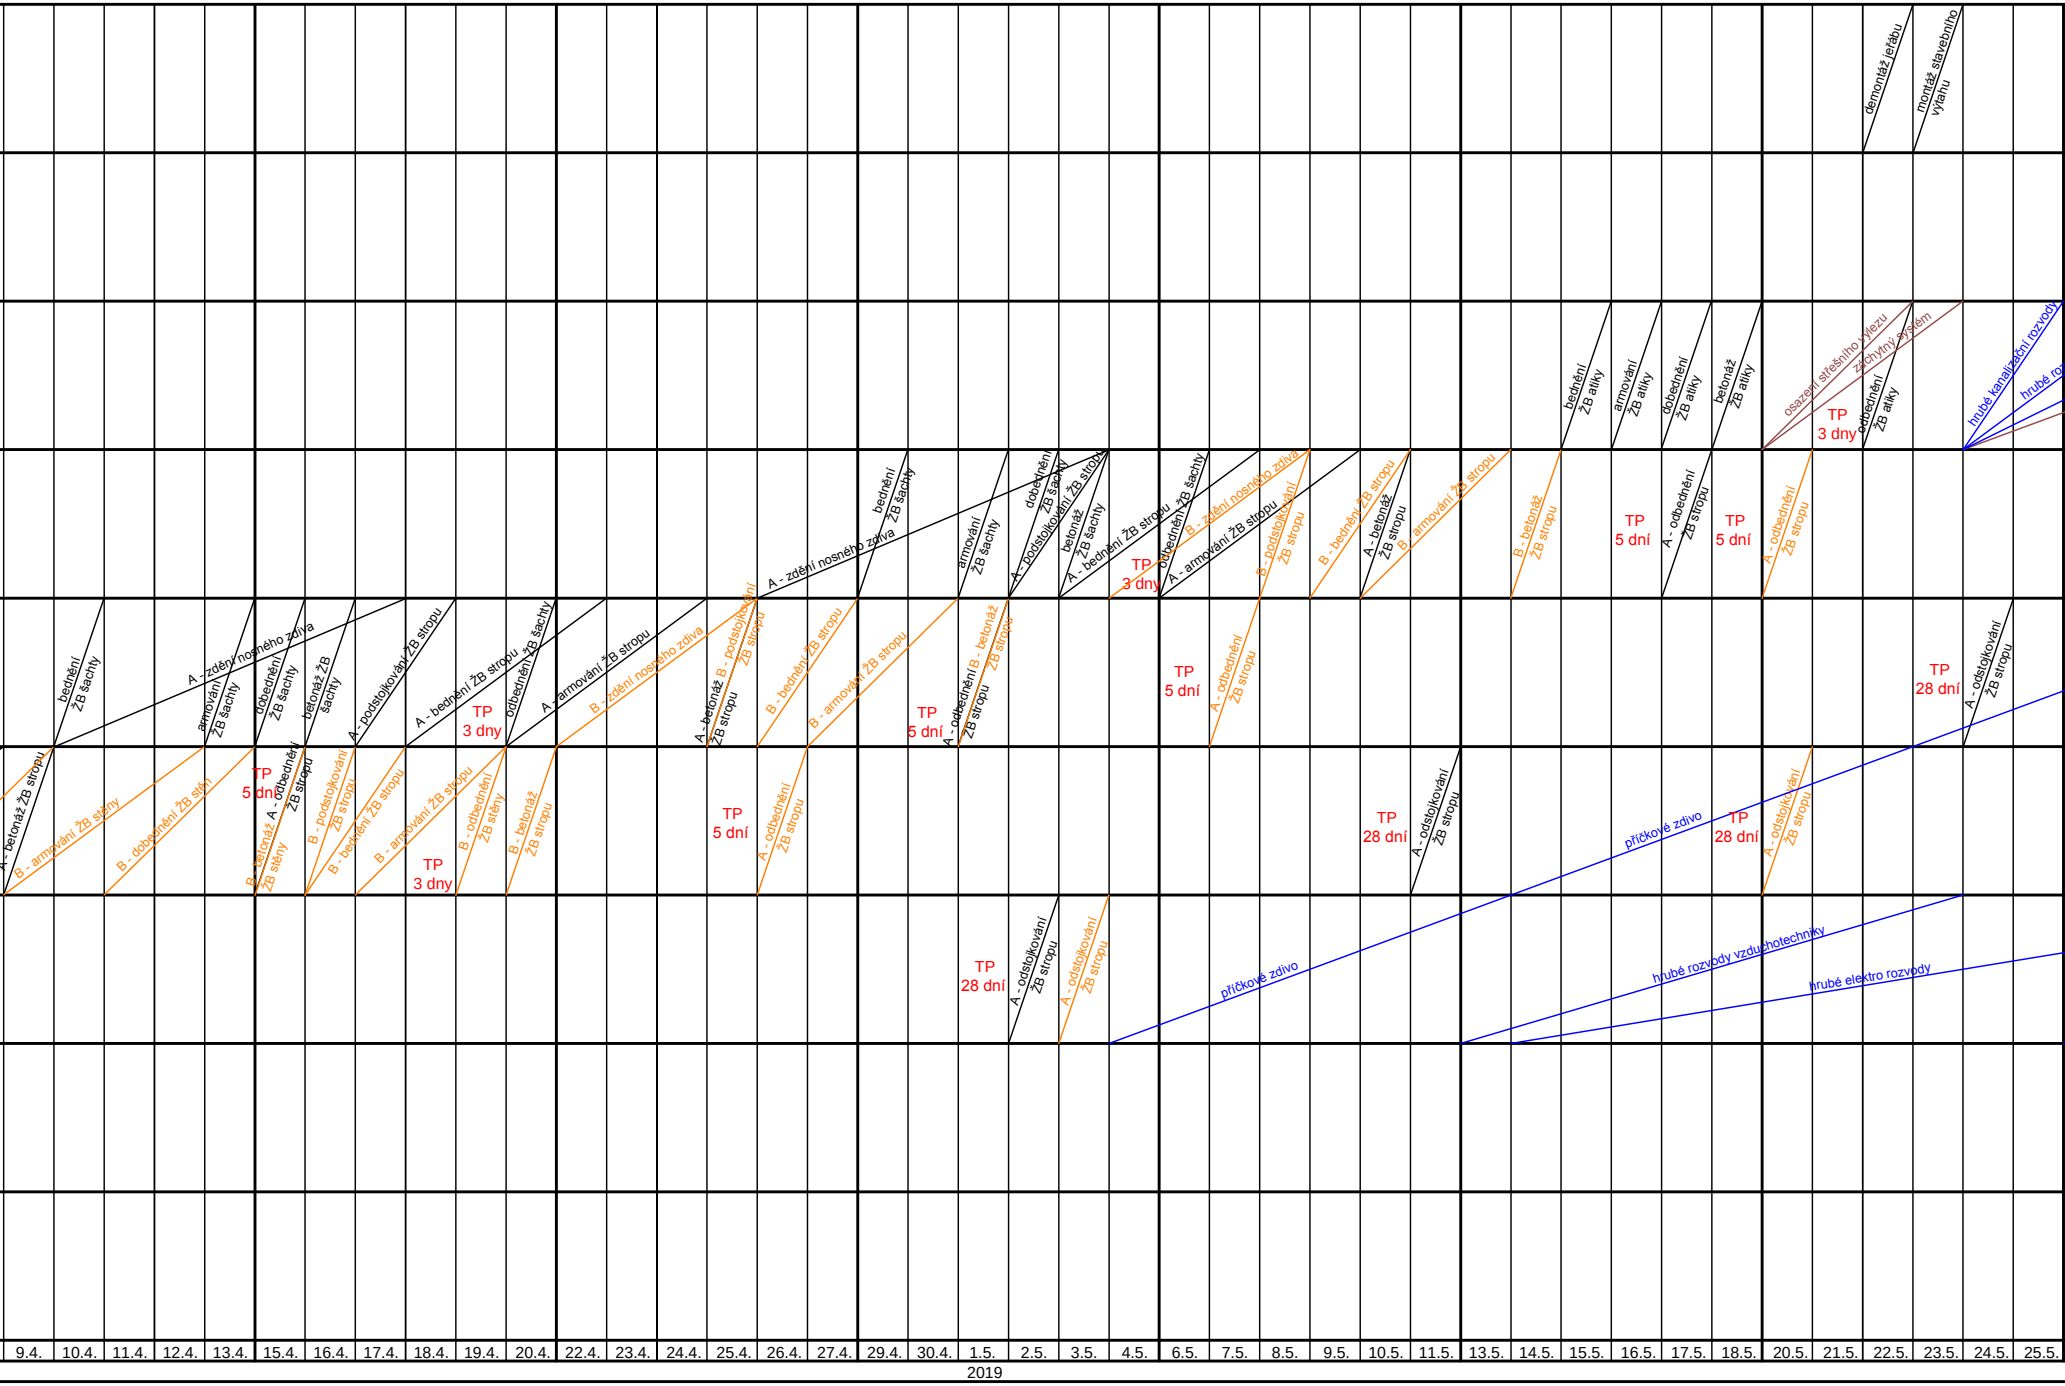

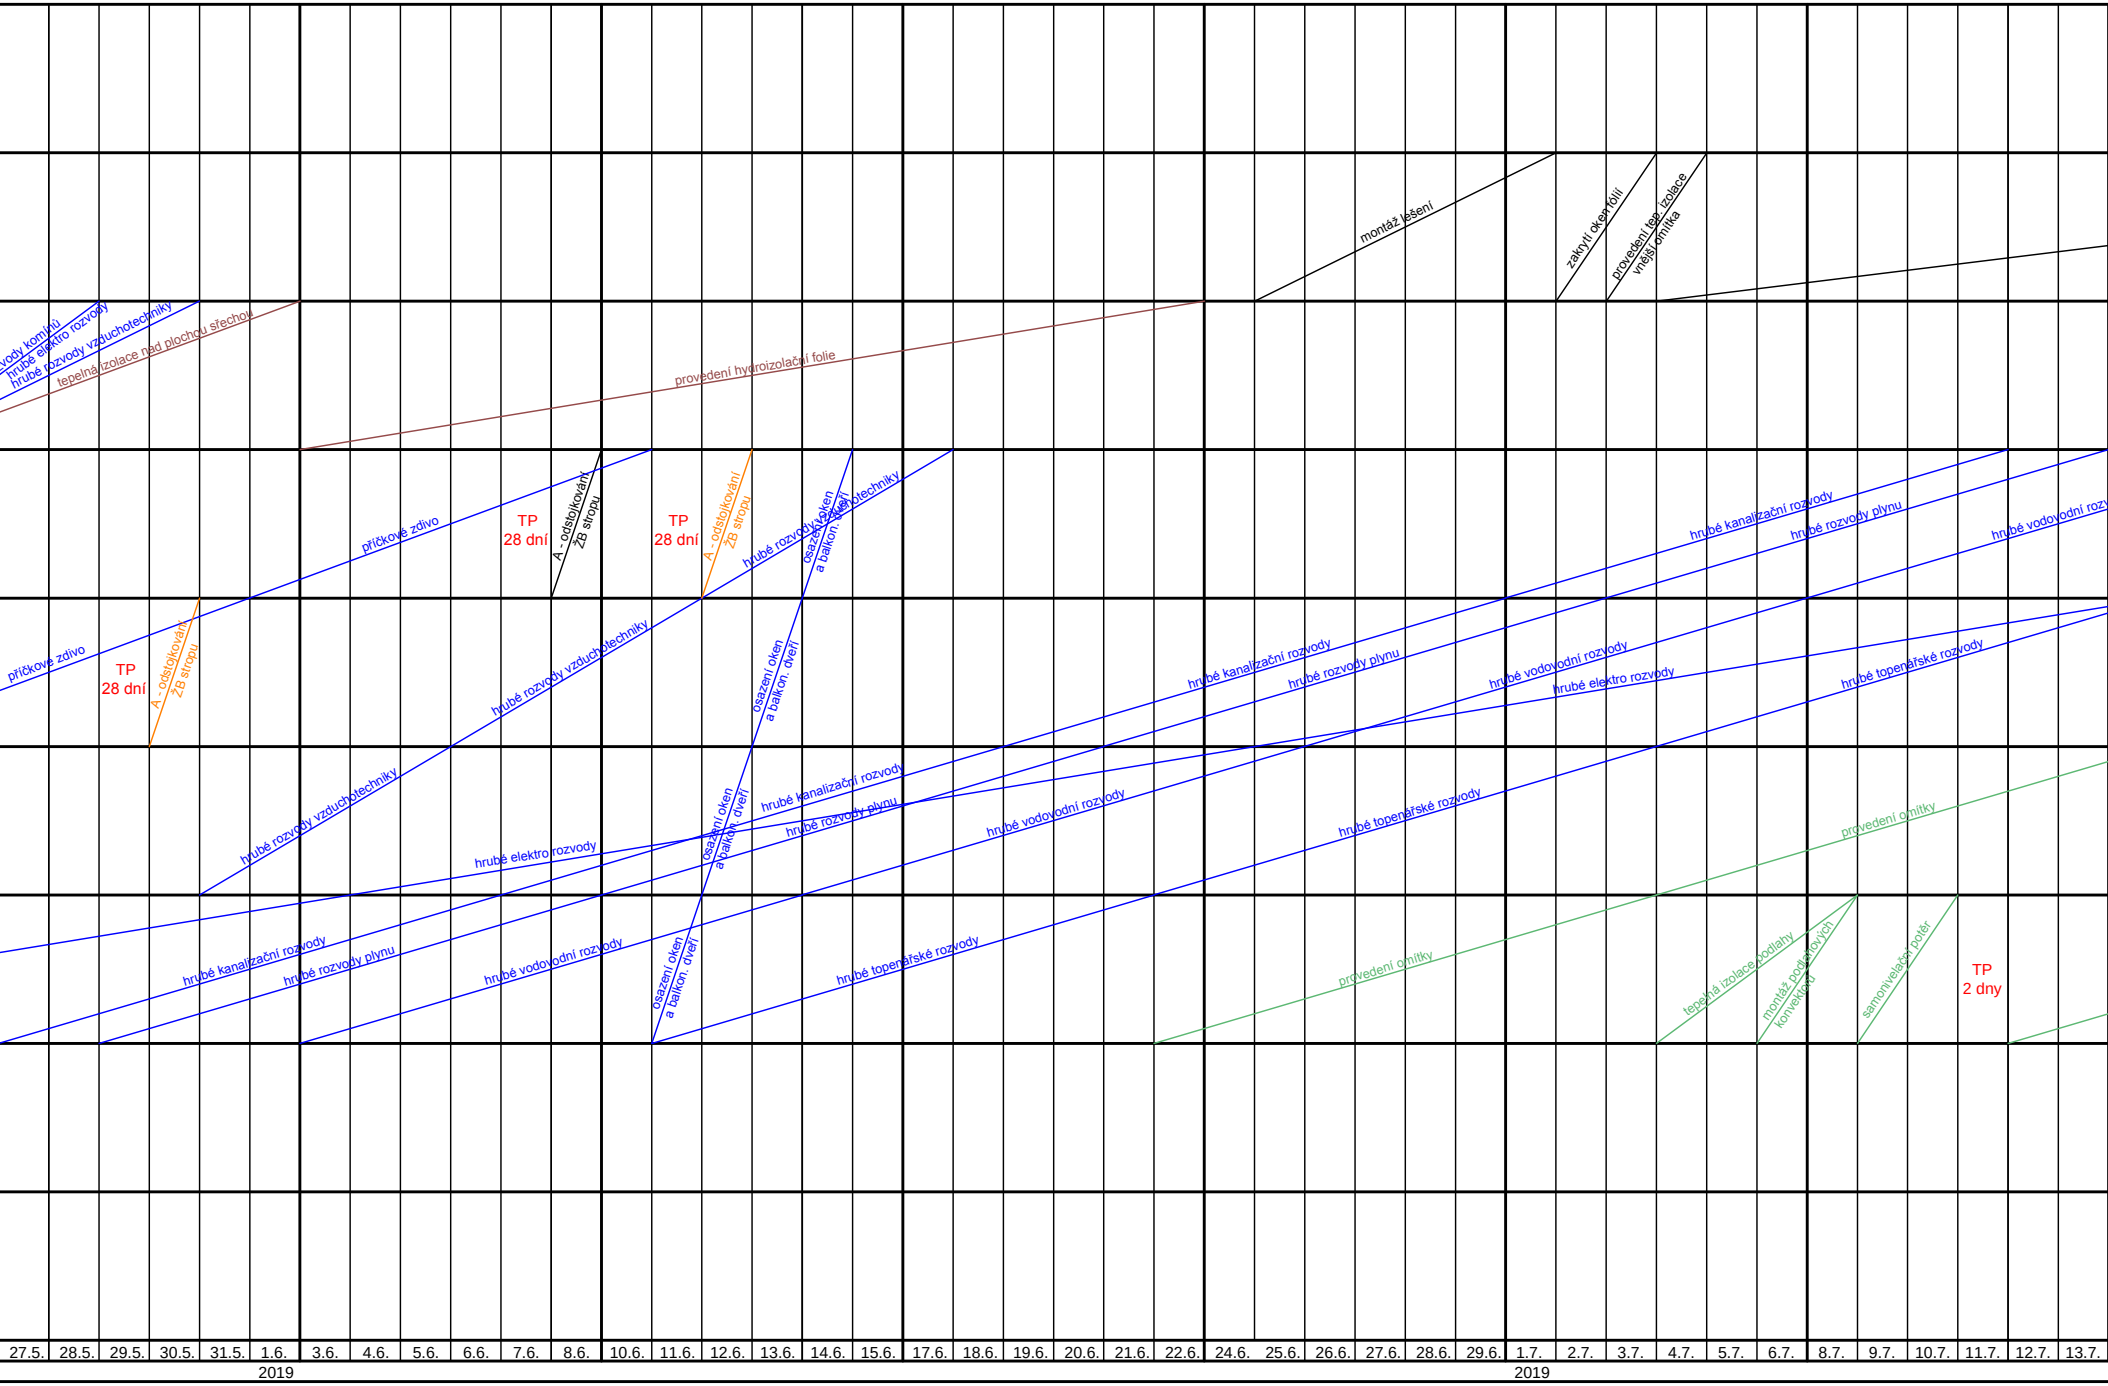

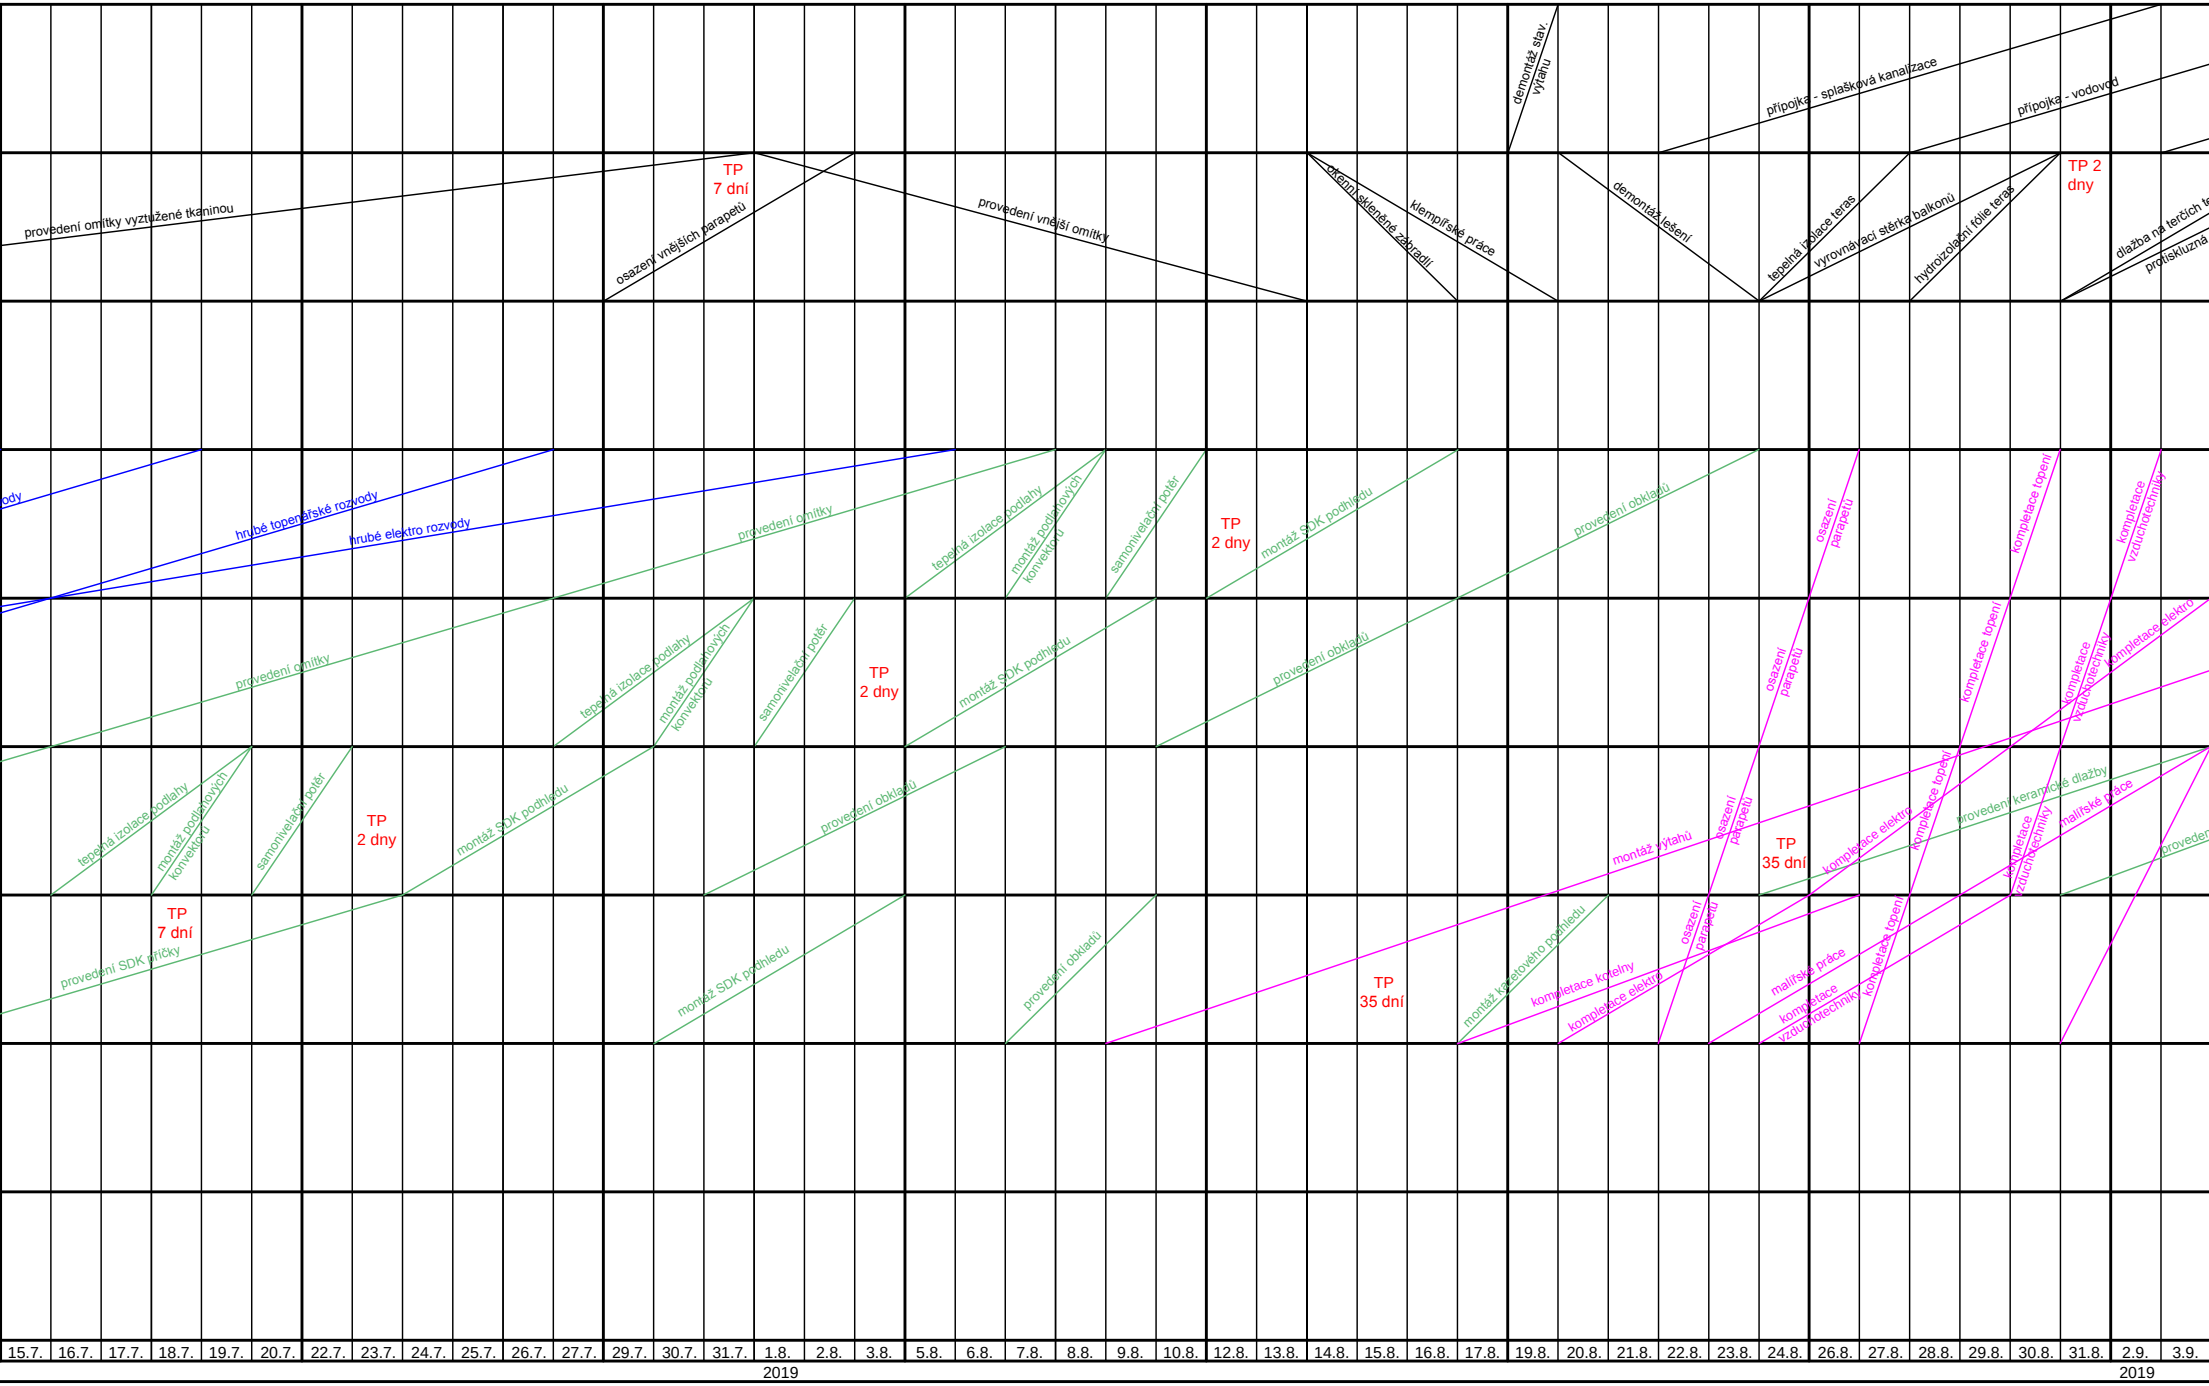

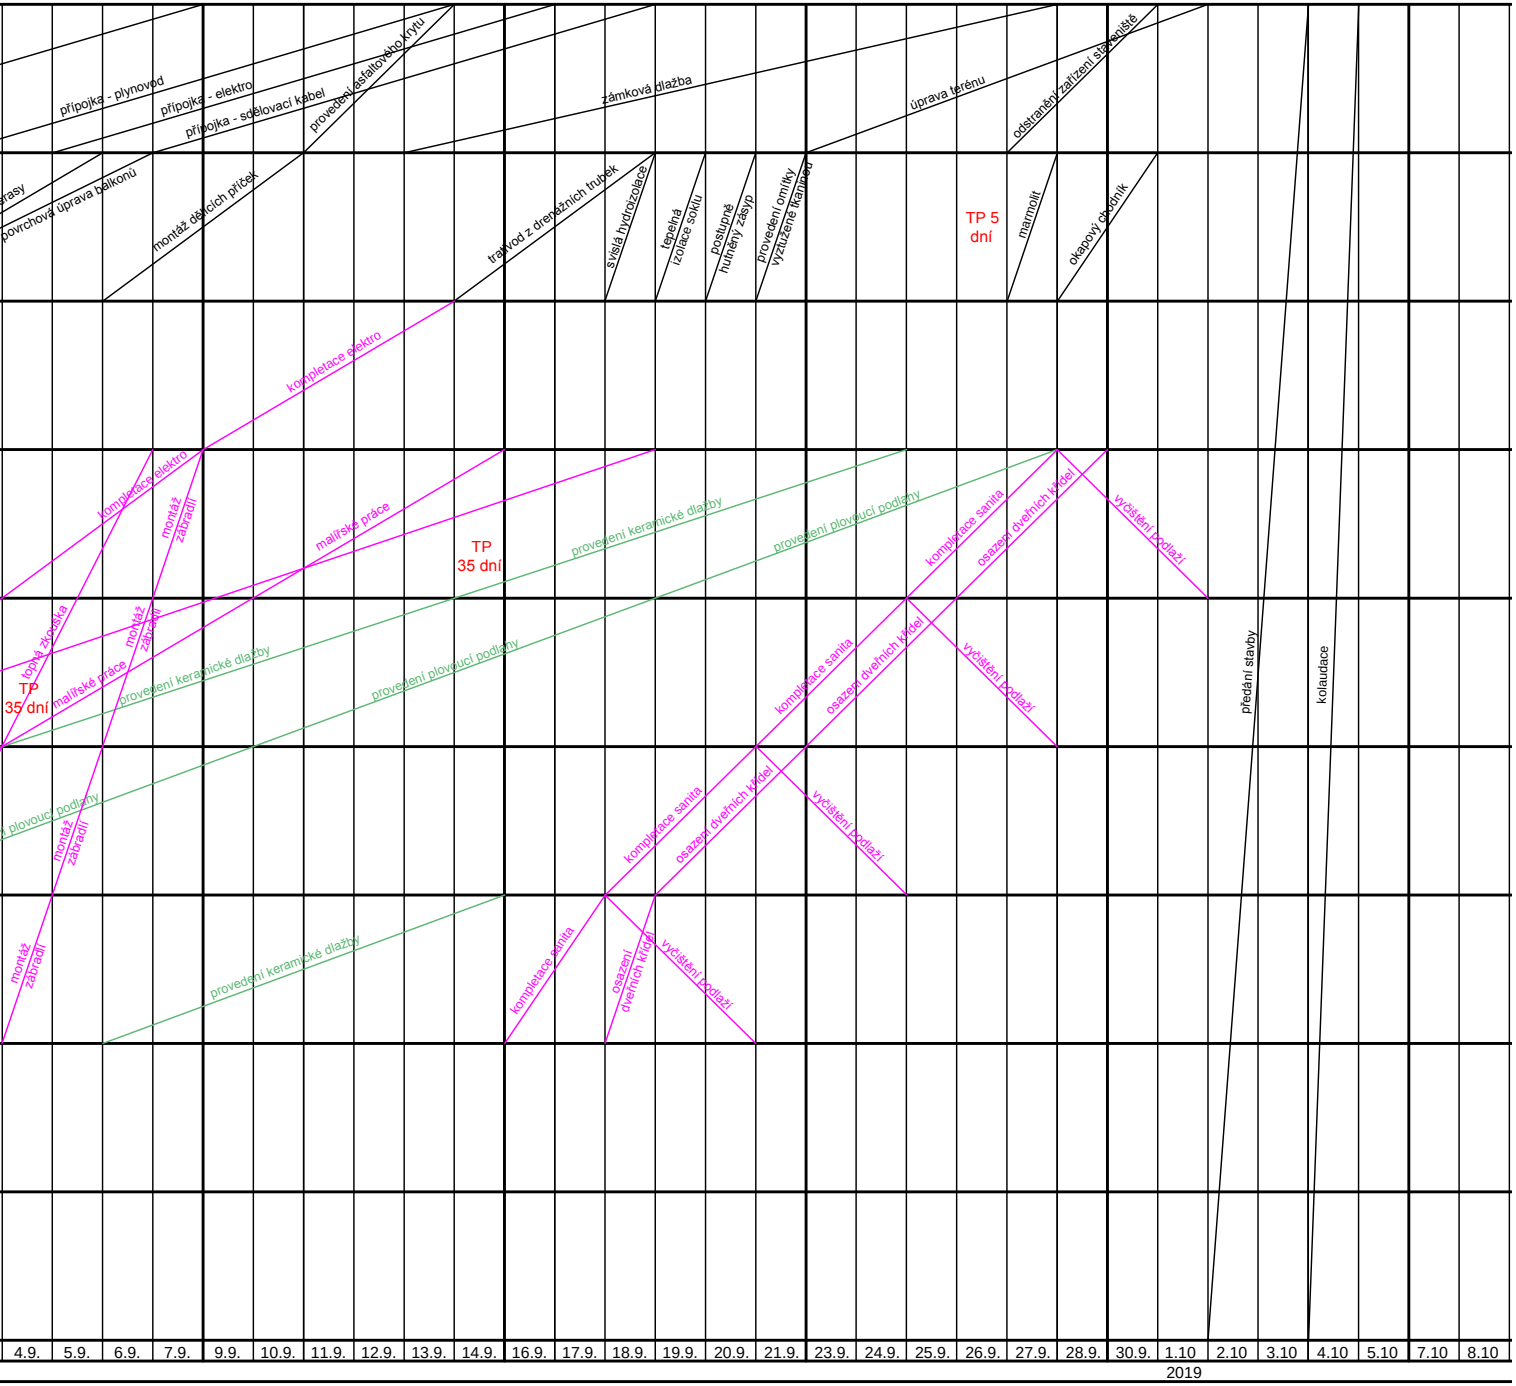
přípojka - plynovod
přípojka - elektro
přípojka - sdělovací kabel
provedení asfaltového krytu
zámková dlažba
úprava terénu
odstranění zařízení staveniště
rasy
povrchová úprava balkonů
montáž dělicích příček
trativod z drenážních trubek
svislá hydroizolace
tepelná izolace soklu
postupně hutněný zásyp
provedení omítky vyztužené tkaninou
TP 5 dní
mramolit
okapový chodník
kompletace elektro
kompletace elektro
montáž zábradlí
malířské práce
TP 35 dní
provedení keramické dlažby
provedení plovoucí podlahy
kompletace sanita
osazení dveřních křídel
vyčištění podlaží
topná zkouška
montáž zábradlí
TP 35 dní
malířské práce
provedení keramické dlažby
provedení plovoucí podlahy
kompletace sanita
osazení dveřních křídel
vyčištění podlaží
předání stavby
kolaudace
plovoucí podlahy
montáž zábradlí
kompletace sanita
osazení dveřních křídel
vyčištění podlaží
montáž zábradlí
provedení keramické dlažby
kompletace sanita
osazení dveřních křídel
vyčištění podlaží
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
30.9.
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
7.10
8.10
2019

Pozn.: barevné odlišení činností odpovídá techn. etapám v technologickém normálu

Vypracoval Bc. Lukáš Rada	Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Hlava, PhD.	Školní rok 2018 - 19	Fakulta stavební ČVUT
Předmět	Diplomová práce		
Část	Časová struktura		Příloha číslo: 28
			Měřítko: -
Výkres	Časoprostorový graf		Formát: 12xA4
