HARMONOGRAM
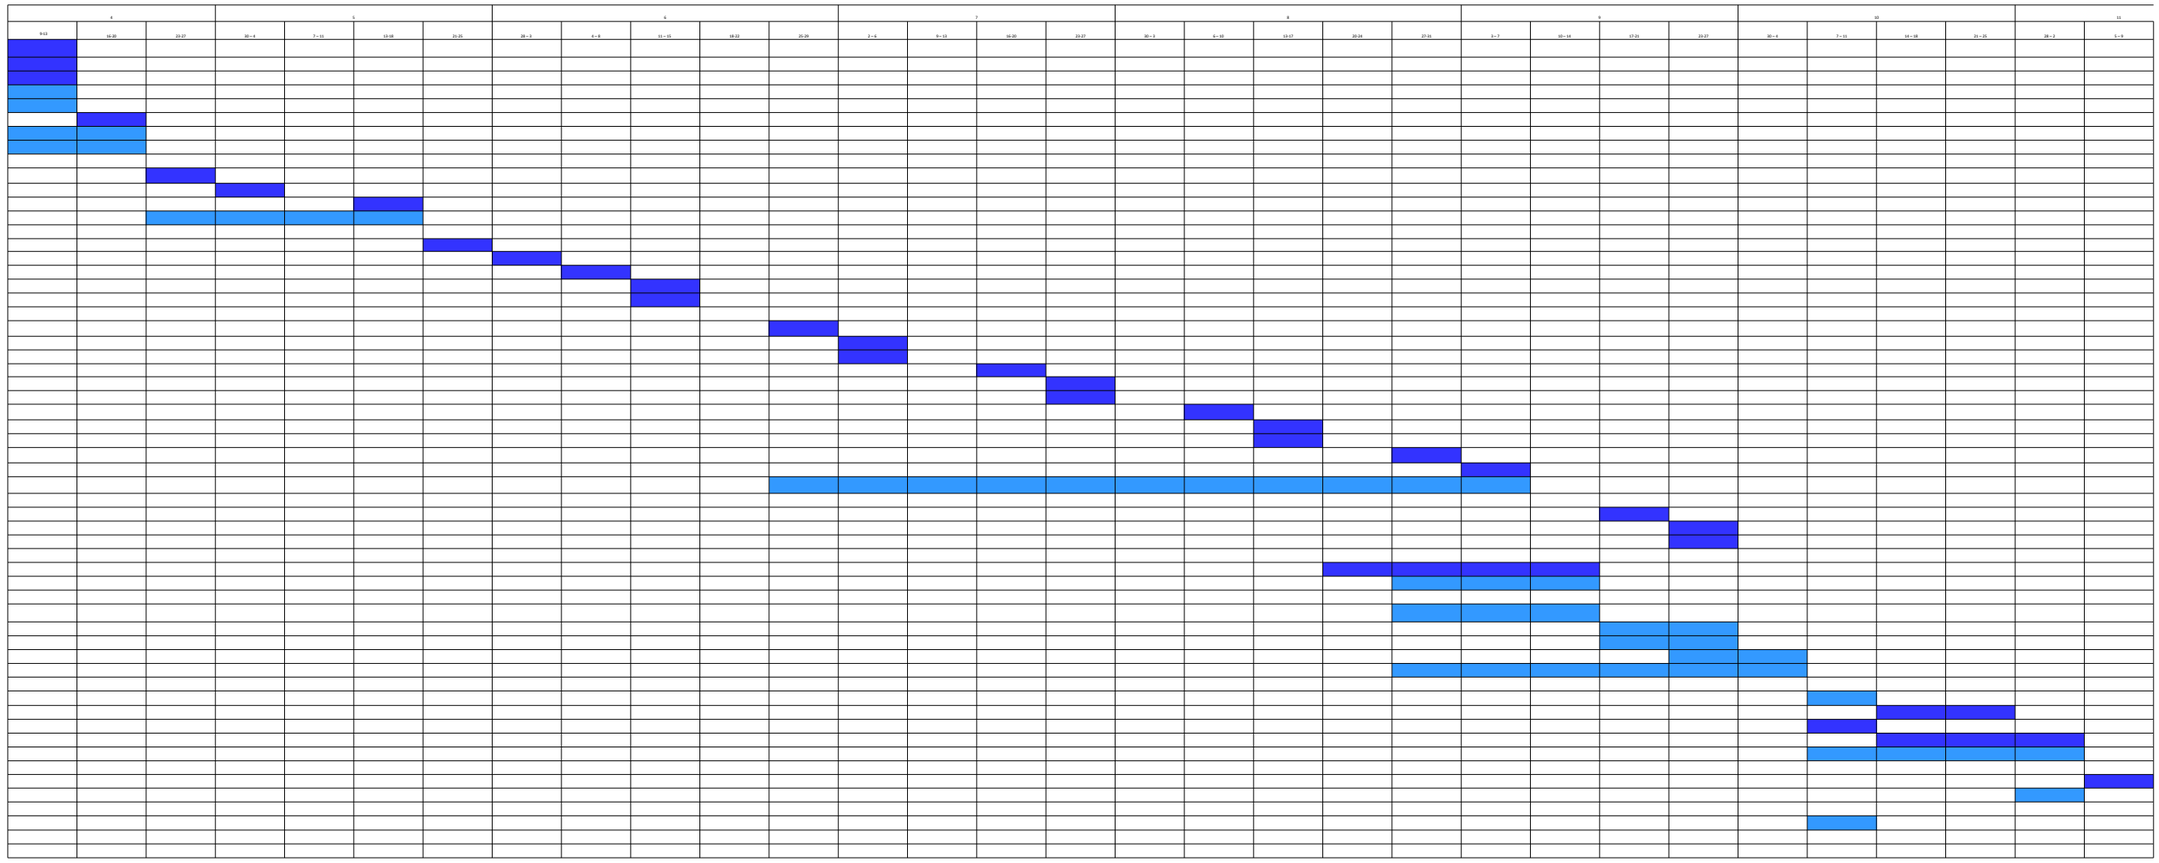
číslo úkolu	název činnosti	počet prac.	doba (týdnů)	rezerva	začátek	konec
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍPROJEČNÉ PRACE	3	1	0	9.4.2019	13.4.2019
201	ODKOPÁVKY A PRIKOPÁVKY	3	1	0	9.4.2019	13.4.2019
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	6	1	0	9.4.2019	13.4.2019
601	PŘÍMÉSTEČNÉ VYKOPÁVKY	6	1	1	9.4.2019	13.4.2019
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	1	9.4.2019	13.4.2019
802	POŽÍTÁŘ ZÁKLADŮ	2	1	0	16.4.2019	20.4.2019
810	PŘÍSUN HMOT TŘ 0	1	2	3	9.4.2019	20.4.2019
1102	PODKLADNÍ VRSTVY POD STAVBU	9	1	0	23.4.2019	27.4.2019
1626	ZÁKLADY	9	1	0	30.4.2019	4.5.2019
1627	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VODĚ	4	1	0	13.5.2019	18.-5.2019
1819	PŘÍSUN HMOT ZÁKLADŮ	6	4	3	23.4.2019	18.5.2019
1253	ZÚ SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	10	1	0	21.5.2019	25.5.2019
2607	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	2	1	0	28.5.2019	3.6.2019
2751	OBKYVY A ZÁKYVY OBJEKTŮ	2	1	0	4.6.2019	8.6.2019
2406	STROPY SUTERÉN	3	2	0	11.6.2019	15.6.2019
2306	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	6	1	2	11.6.2019	15.6.2019
3203	ZÚ NOSNÉ 1NP	3	1	0	25.6.2019	29.6.2019
3404	STROPY 1NP	3	2	0	2.7.2019	6.7.2019
3506	SCHODIŠTĚ 1NP	6	1	2	2.7.2019	6.7.2019
3204	ZÚ NOSNÉ 2NP	3	1	0	16.7.2019	20.7.2019
3405	STROPY 2NP	3	2	0	23.7.2019	27.7.2019
3505	SCHODIŠTĚ 2NP	6	1	2	23.7.2019	27.7.2019
3205	ZÚ NOSNÉ 3NP	3	1	0	6.8.2019	10.8.2019
3406	STROPY 3NP	3	2	0	13.8.2019	17.8.2019
3506	SCHODIŠTĚ 3NP	6	1	2	13.8.2019	17.8.2019
3207	ZÚ NOSNÉ 4NP	3	1	0	27.8.2019	31.8.2019
3404	STROPY 4NP	3	2	0	3.9.2019	7.9.2019
3810	PŘÍSUN HMOT TŘ 3	3	2	11	25.6.2019	7.9.2019
4127	TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY	2	1	10	17.9.2019	21.9.2019
4757	POHLAZOVÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	9	1	10	23.9.2019	27.9.2019
4807	KLAMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	3	1	10	23.9.2019	27.9.2019
5187	PŘÍČKY ZDĚNÉ	3	4	0	20.9.2019	14.9.2019
5187	PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ	3	3	0	27.9.2019	14.9.2019
6109	LEHKÉ POVODOVÉ UŠĚNÍ	2	3	0	27.9.2019	14.9.2019
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTRUKCÍ	5	2	0	17.9.2019	27.9.2019
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	4	2	0	17.9.2019	27.9.2019
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	6	2	0	23.9.2019	4.10.2019
6810	PŘÍSUN HMOT TŘ 4	2	1	10	27.9.2019	4.10.2019
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	6	1	6	7.10.2019	11.10.2019
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘNÍ	6	2	0	14.10.2019	25.9.2019
7707	MALBY VNITŘNÍ	4	1	0	7.10.2019	11.10.2019
7717	PODLAHY POVLAKOVÉ	6	3	0	14.10.2019	2.11.2019
7810	PŘÍSUN HMOT ÚPRAVY POVRCHŮ	2	1	7	7.10.2019	2.11.2019
8809	VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU	12	1	0	5.11.2019	9.11.2019
8810	PŘÍSUN HMOT KOMPLETACÍ	2	1	4	28.10.2019	2.11.2019
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	4	1	6	7.10.2019	2.11.2019
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	12.11.2019	16.11.2019
