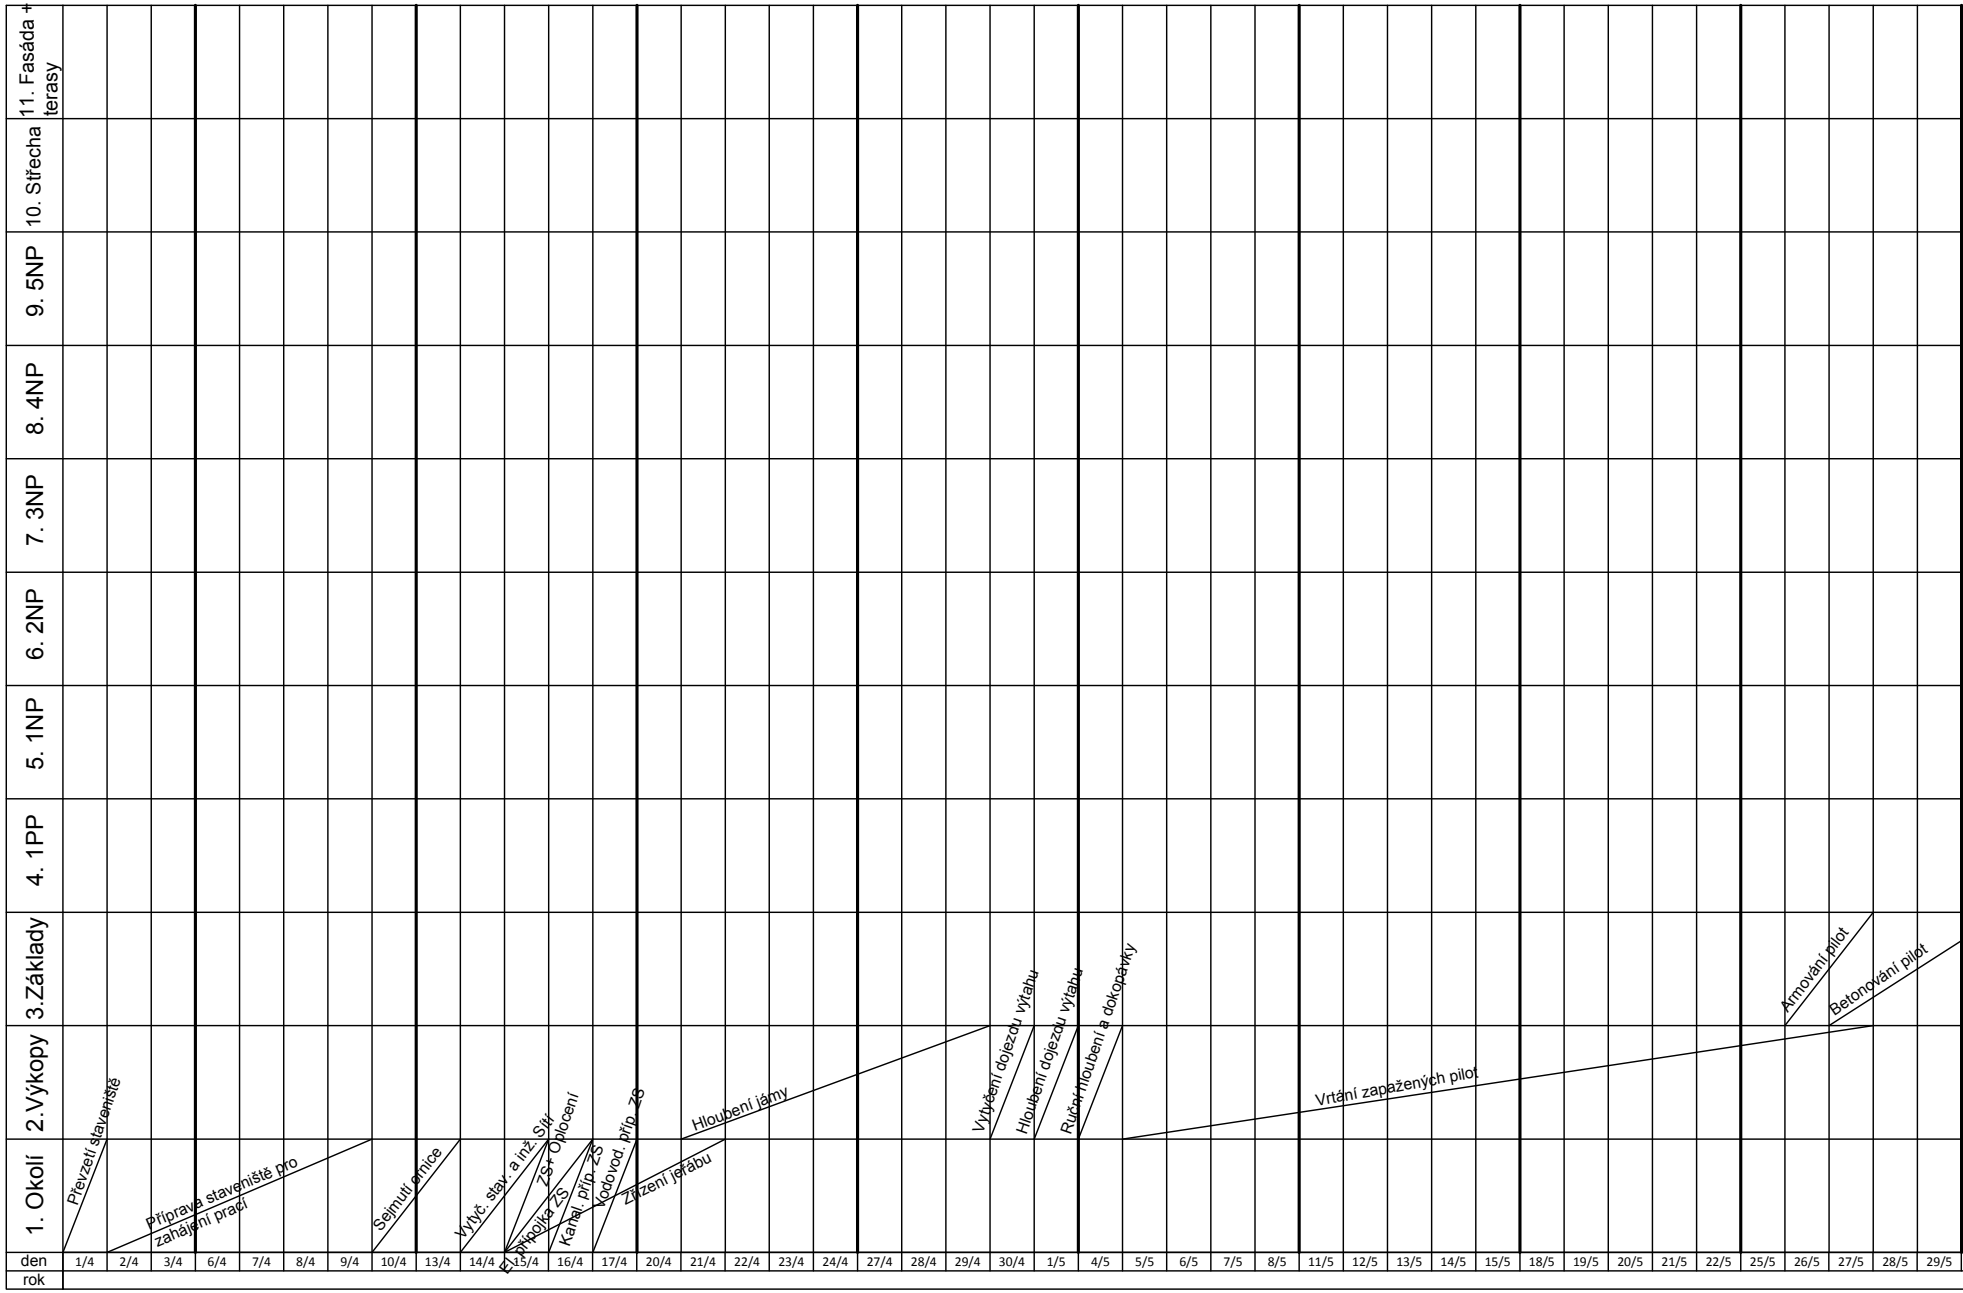
11. Fasáda + terasy
10. Střecha
9. 5NP
8. 4NP
7. 3NP
6. 2NP
5. 1NP
4. 1PP
3.Základy
2.Výkopy
1. Okolí
den
rok
1/4
2/4
3/4
6/4
7/4
8/4
9/4
10/4
13/4
14/4
15/4
16/4
17/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
27/4
28/4
29/4
30/4
1/5
4/5
5/5
6/5
7/5
8/5
11/5
12/5
13/5
14/5
15/5
18/5
19/5
20/5
21/5
22/5
25/5
26/5
27/5
28/5
29/5
Převzetí staveniště
Příprava staveniště pro zahájení prací
Sejmutí ornice
Vytyč. stav. a inž. Sítí
El. přípojka ZS
ZS+ Oplocení
Kanal. příp. ZS
Vodovod. příp. ZS
Zřízení jeřábu
Hloubení jámy
Vytyčení dojezdu výtahu
Hloubení dojezdu výtahu
Ruční hloubení a dokopávky
Vrtání zapažených pilot
Armování pilot
Betonování pilot

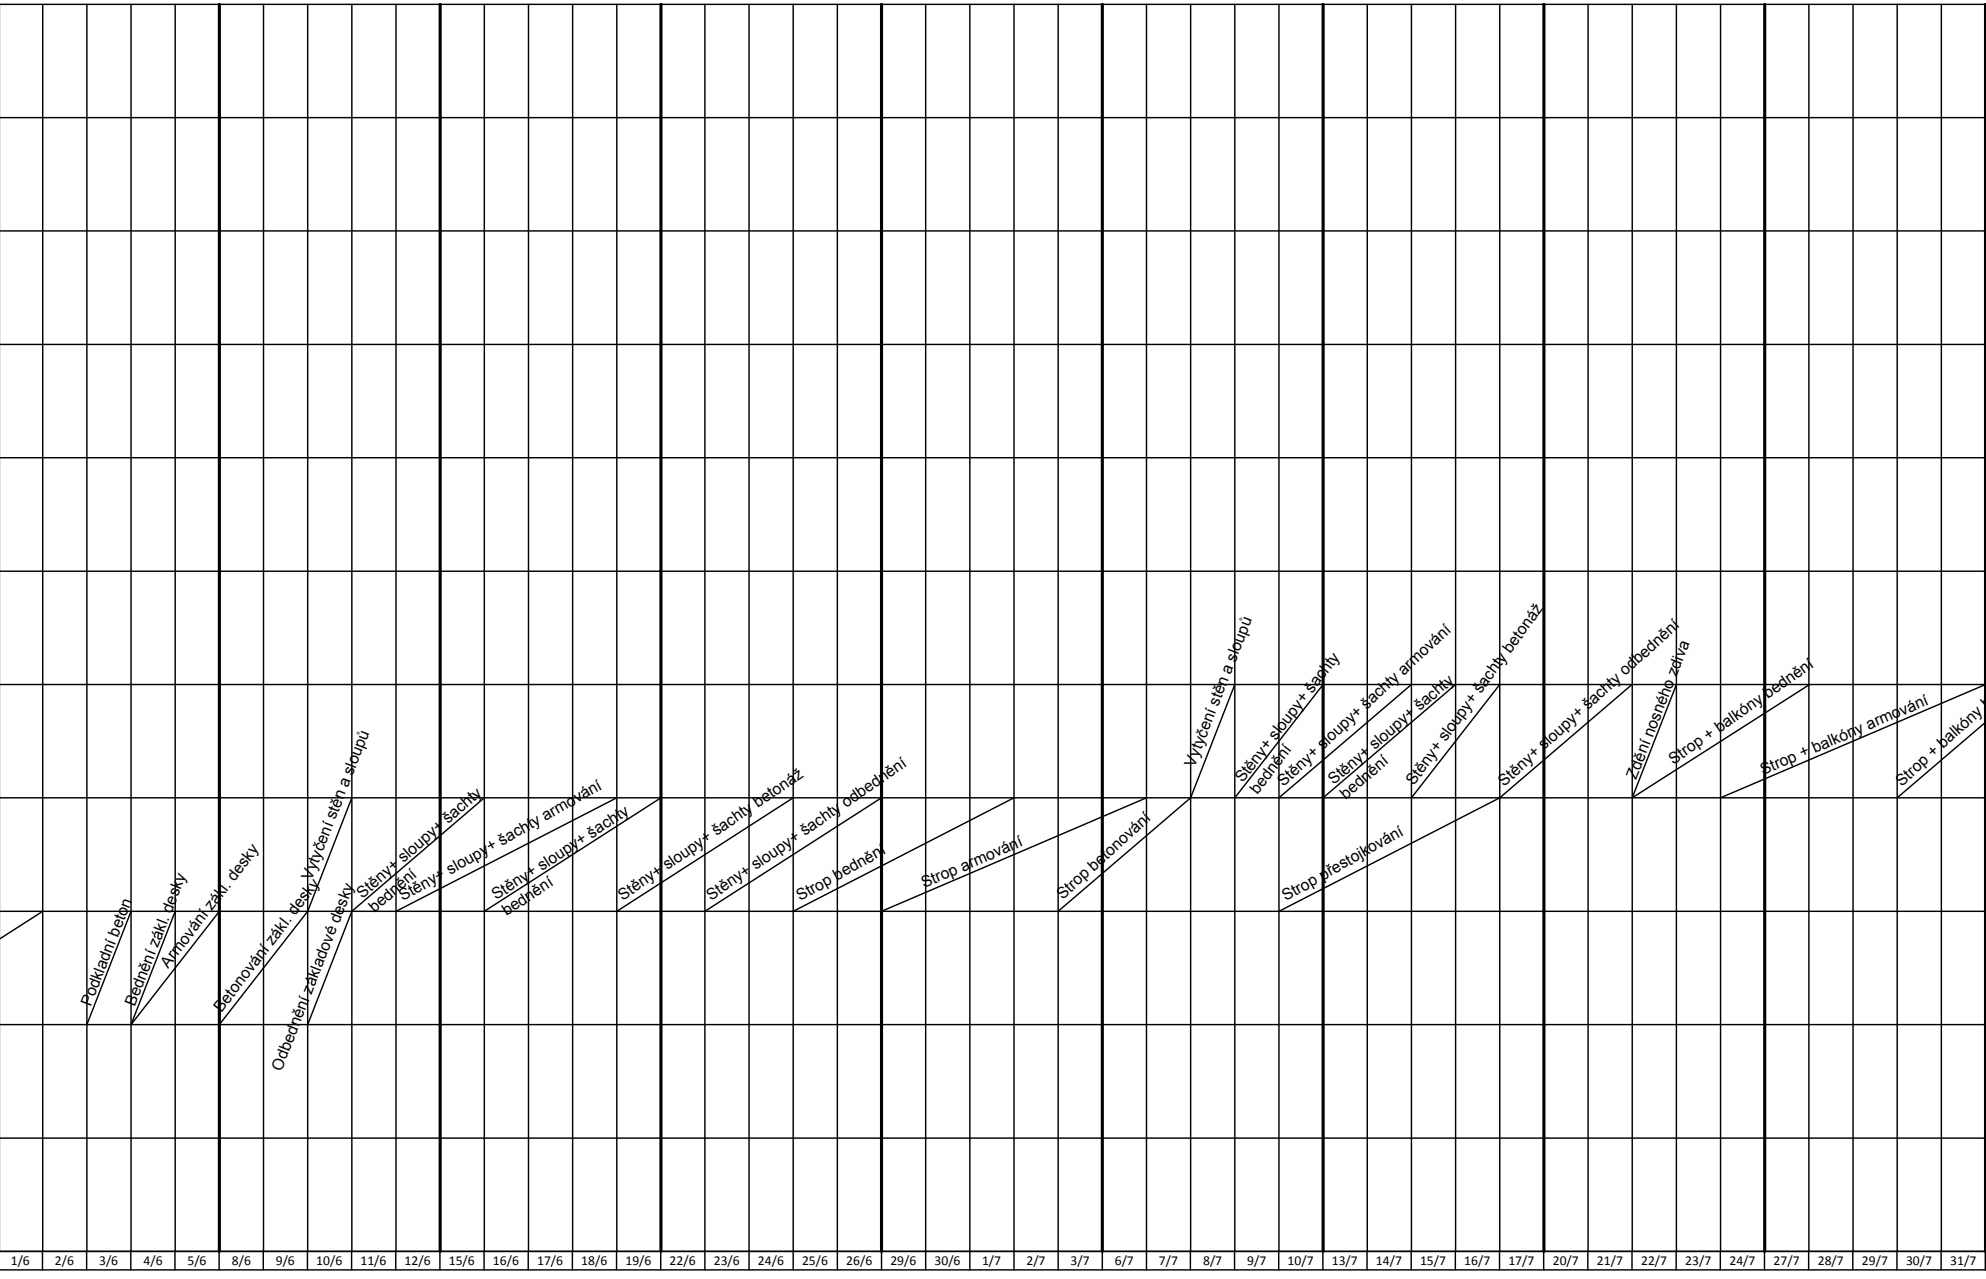
Podkladní beton
Bednění zákl. desky
Armování zákl. desky
Betonování zákl. desky
Odbednění základové desky
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty odbednění
Strop bednění
Strop armování
Strop betonování
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Strop přestojkování
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty odbednění
Zdění nosného zdiva
Strop + balkóny bednění
Strop + balkóny armování
Strop + balkóny
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
8/6
9/6
10/6
11/6
12/6
15/6
16/6
17/6
18/6
19/6
22/6
23/6
24/6
25/6
26/6
29/6
30/6
1/7
2/7
3/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
13/7
14/7
15/7
16/7
17/7
20/7
21/7
22/7
23/7
24/7
27/7
28/7
29/7
30/7
31/7

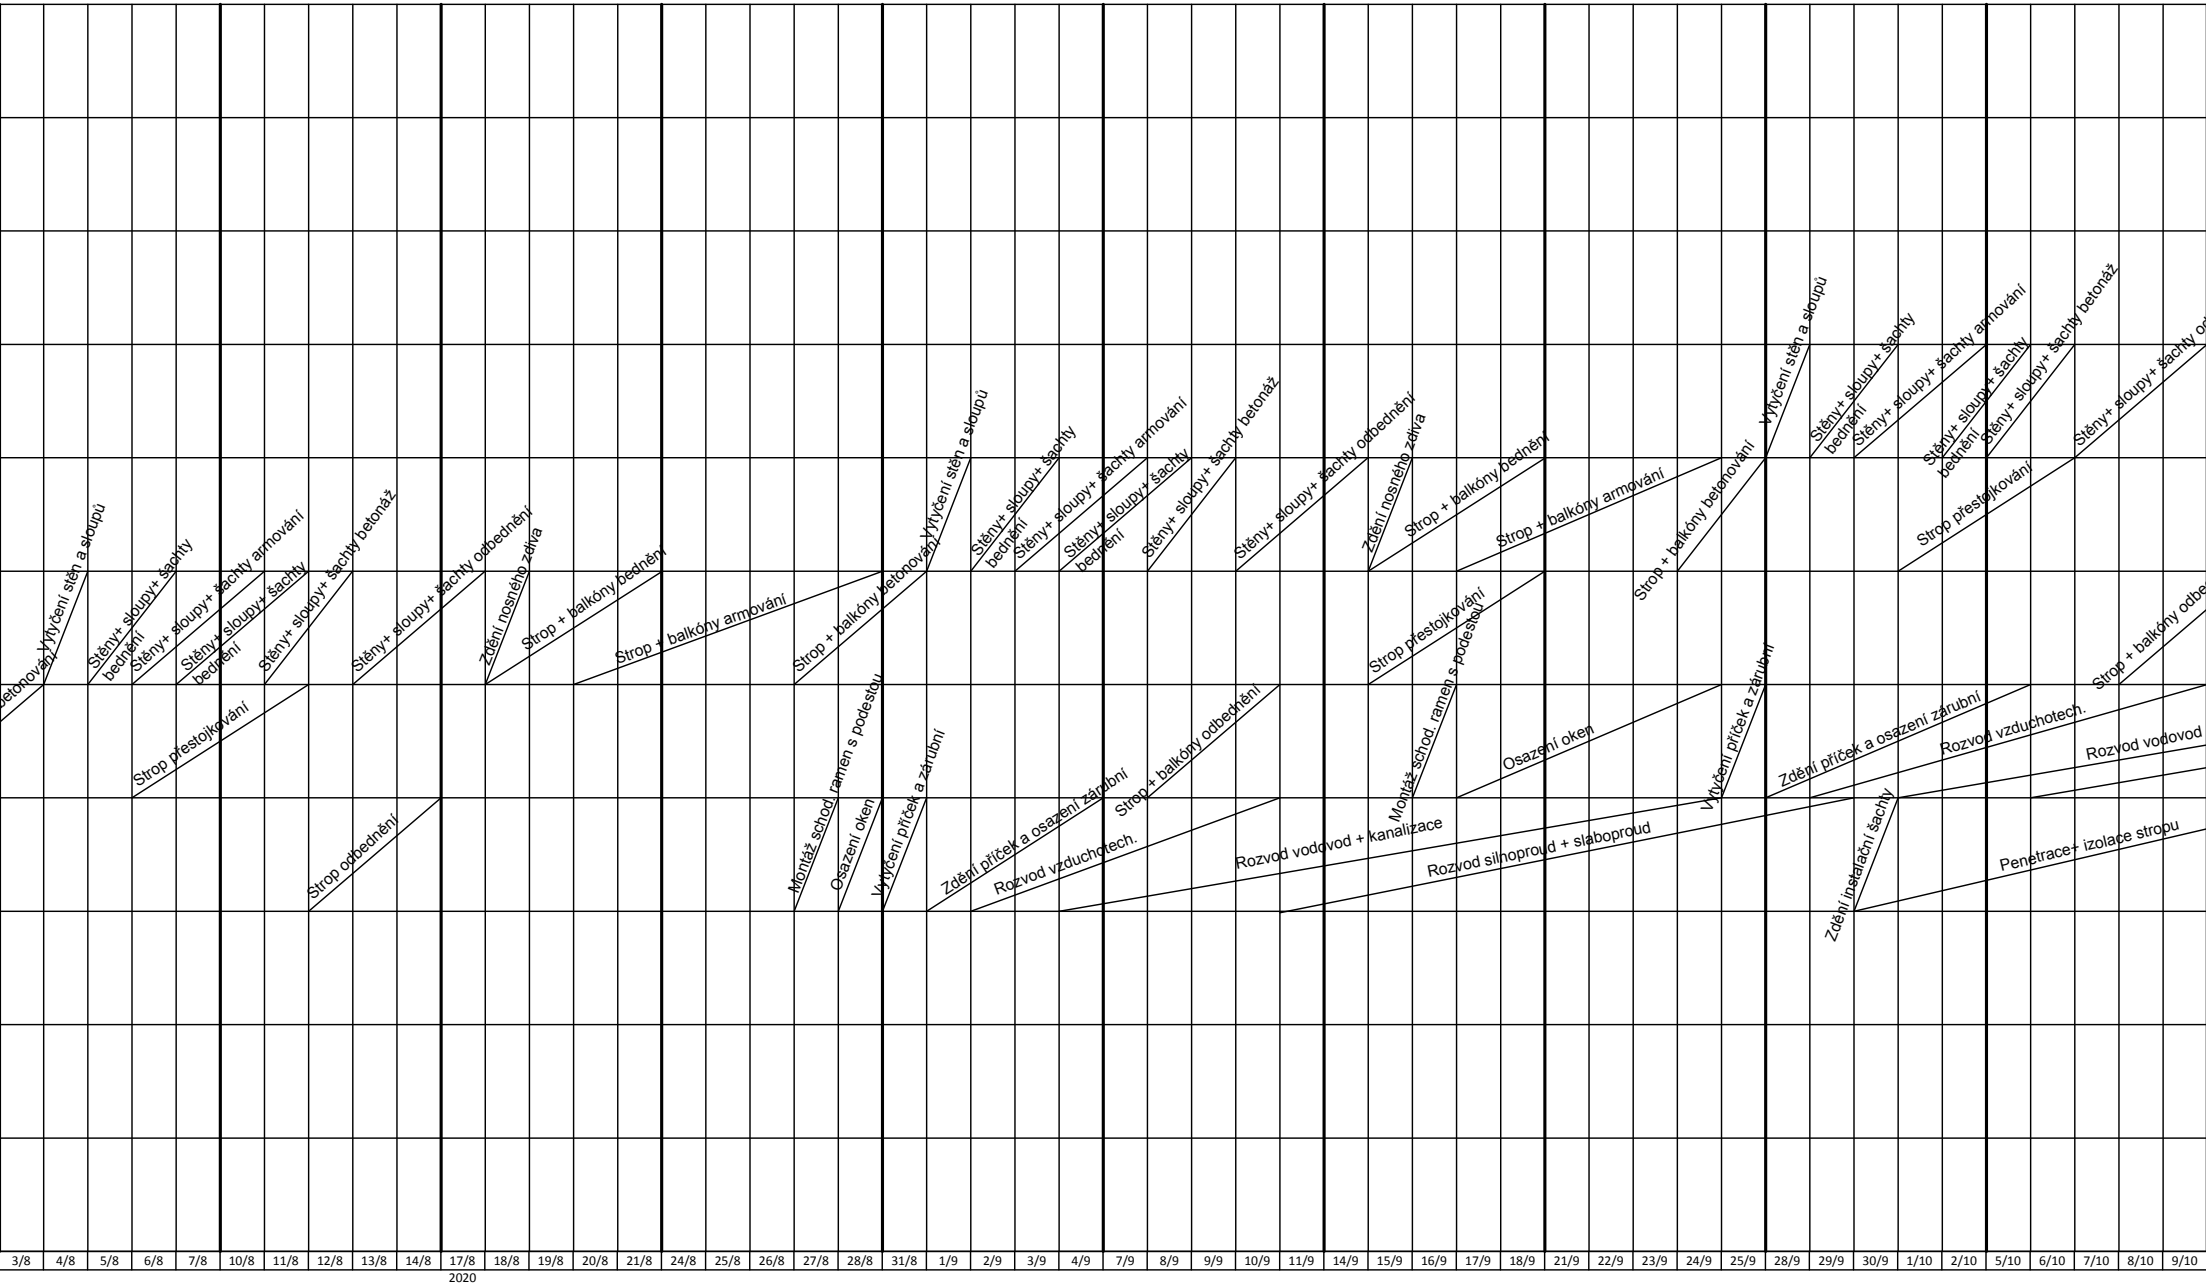
betonování
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty odbednění
Zdění nosného zdiva
Strop + balkóny bednění
Strop + balkóny armování
Strop + balkóny betonování
Strop přestojkování
Strop odbednění
Montáž schod. ramen s podestou
Osazení oken
Vytyčení příček a zárubní
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty odbednění
Zdění nosného zdiva
Strop + balkóny bednění
Strop + balkóny armování
Strop + balkóny betonování
Strop přestojkování
Montáž schod. ramen s podestou
Strop + balkóny odbednění
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Rozvod vodovod + kanalizace
Rozvod silnoproud + slaboproud
Osazení oken
Vytyčení příček a zárubní
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty od
Strop přestojkování
Strop + balkóny odbe
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Rozvod vodovod
Zdění instalační šachty
Penetrace+ izolace stropu
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
10/8
11/8
12/8
13/8
14/8
17/8
18/8
19/8
20/8
21/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
31/8
1/9
2/9
3/9
4/9
7/9
8/9
9/9
10/9
11/9
14/9
15/9
16/9
17/9
18/9
21/9
22/9
23/9
24/9
25/9
28/9
29/9
30/9
1/10
2/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
2020

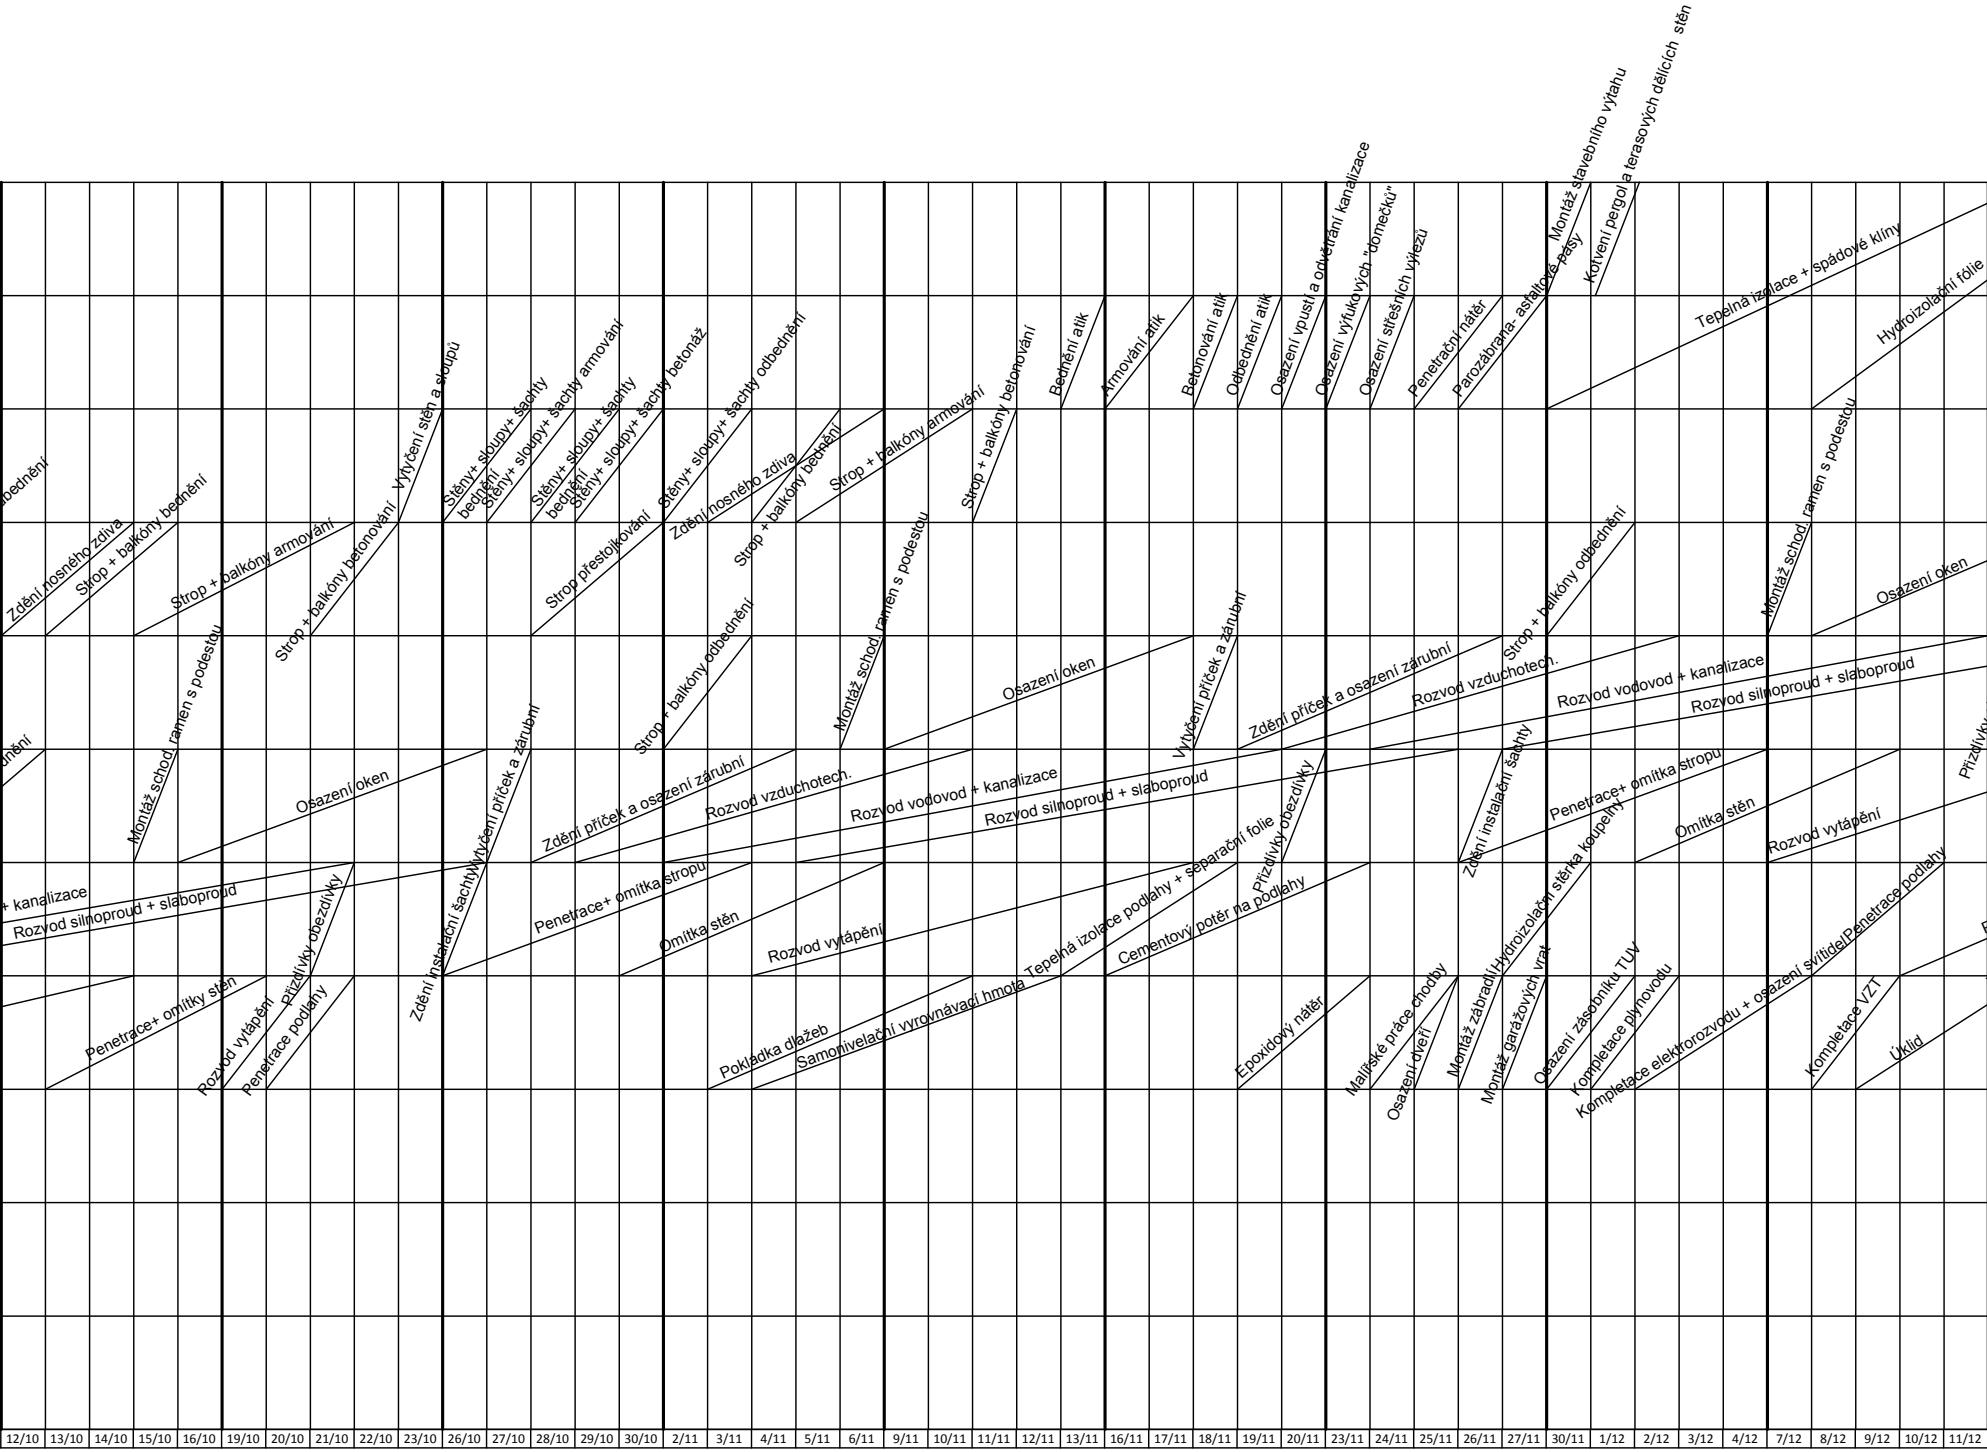
Montáž stavebního výtahu
Kotvení pergol a terasových dělících stěn
Bednění atik
Armování atik
Betonování atik
Odbednění atik
Osazení vpustí a odvětrání kanalizace
Osazení výfukových "domečků"
Osazení střešních výlezů
Penetrační nátěr
Parozábrana- asfaltové pásy
Tepelná izolace + spádové klíny
Hydroizolační folie
bednění
Vytyčení stěn a sloupů
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty armování
Stěny+ sloupy+ šachty bednění
Stěny+ sloupy+ šachty betonáž
Stěny+ sloupy+ šachty odbednění
Zdění nosného zdiva
Strop + balkóny bednění
Strop + balkóny armování
Strop + balkóny betonování
Montáž schod. ramen s podestou
Zdění nosného zdiva
Strop + balkóny bednění
Strop + balkóny armování
Strop + balkóny betonování
Strop přestojkování
Strop + balkóny bednění
Montáž schod. ramen s podestou
Strop + balkóny odbednění
Montáž schod. ramen s podestou
Osazení oken
dnění
Montáž schod. ramen s podestou
Osazení oken
Vytyčení příček a zárubní
Strop + balkóny odbednění
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Montáž schod. ramen s podestou
Rozvod vodovod + kanalizace
Osazení oken
Rozvod silnoproud + slaboproud
Vytyčení příček a zárubní
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Rozvod vodovod + kanalizace
Rozvod silnoproud + slaboproud
Přizdívky
+ kanalizace
Rozvod silnoproud + slaboproud
Přizdívky obezdívky
Zdění instalační šachty
Penetrace+ omítka stropu
Omítka stěn
Rozvod vytápění
Tepelná izolace podlahy + separační folie
Přizdívky obezdívky
Cementový potěr na podlahy
Zdění instalační šachty
Penetrace+ omítka stropu
Omítka stěn
Rozvod vytápění
Hydroizolační stěrka koupelny
Penetrace podlahy
Penetrace+ omítky stěn
Rozvod vytápění
Penetrace podlahy
Pokládka dlažeb
Samonivelační vyrovnávací hmota
Epoxidový nátěr
Malířské práce chodby
Osazení dveří
Montáž zábradlí
Montáž garážových vrat
Osazení zásobníku TUV
Kompletace plynovodu
Kompletace elektrorozvodu + osazení svítidel
Kompletace VZT
Úklid
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
9/11
10/11
11/11
12/11
13/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
30/11
1/12
2/12
3/12
4/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12

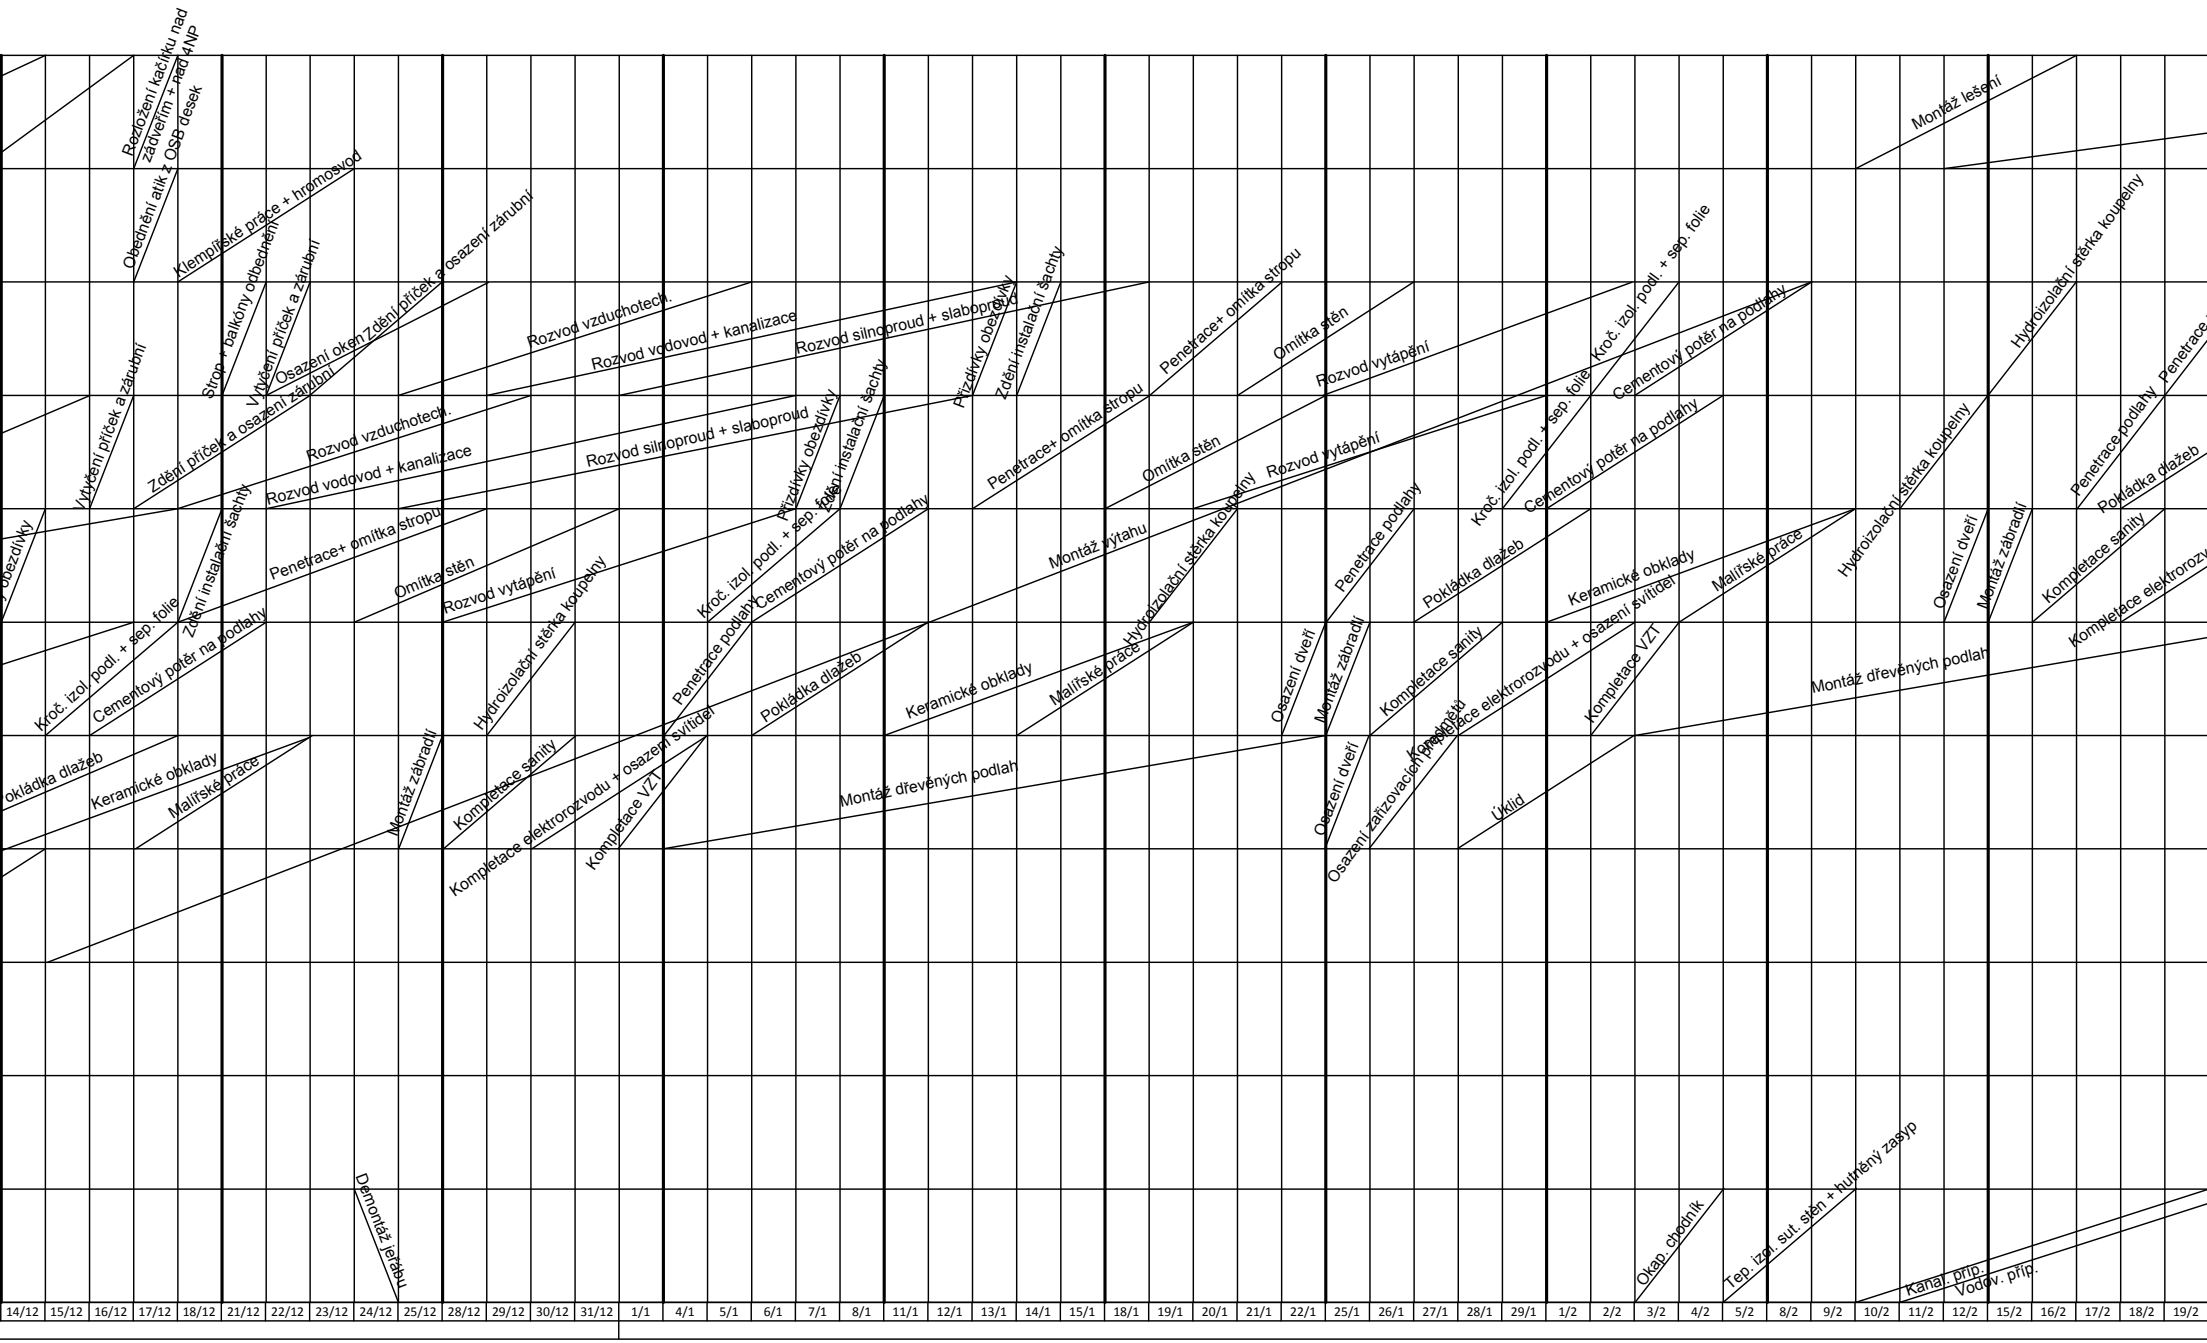
Rozložení kačírku nad zádveřím + nad 4NP
Obednění atik z OSB desek
Klempířské práce + hromosvod
Strop + balkóny odbednění
Vytyčení příček a zárubní
Osazení oken
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Rozvod vodovod + kanalizace
Rozvod silnoproud + slaboproud
Přizdívky obezdívky
Zdění instalační šachty
Penetrace+ omítka stropu
Omítka stěn
Rozvod vytápění
Kroč. izol. podl. + sep. folie
Cementový potěr na podlahy
Hydroizolační stěrka koupelny
Penetrace podlahy
Montáž lešení
Vytyčení příček a zárubní
Zdění příček a osazení zárubní
Rozvod vzduchotech.
Rozvod vodovod + kanalizace
Rozvod silnoproud + slaboproud
Přizdívky obezdívky
Zdění instalační šachty
Penetrace+ omítka stropu
Omítka stěn
Rozvod vytápění
Kroč. izol. podl. + sep. folie
Cementový potěr na podlahy
Hydroizolační stěrka koupelny
Penetrace podlahy
Pokládka dlažeb
obezdívky
Zdění instalační šachty
Penetrace+ omítka stropu
Omítka stěn
Rozvod vytápění
Hydroizolační stěrka koupelny
Kroč. izol. podl. + sep. folie
Cementový potěr na podlahy
Montáž výtahu
Hydroizolační stěrka koupelny
Penetrace podlahy
Pokládka dlažeb
Keramické obklady
Malířské práce
Osazení dveří
Montáž zábradlí
Kompletace sanity
Kompletace elektrorozv
Kroč. izol. podl. + sep. folie
Cementový potěr na podlahy
Penetrace podlahy
Pokládka dlažeb
Keramické obklady
Malířské práce
Osazení dveří
Montáž zábradlí
Kompletace sanity
Kompletace elektrorozvodu + osazení svítidel
Kompletace VZT
Montáž dřevěných podlah
okládka dlažeb
Keramické obklady
Malířské práce
Montáž zábradlí
Kompletace sanity
Kompletace elektrorozvodu + osazení svítidel
Kompletace VZT
Montáž dřevěných podlah
Osazení dveří
Osazení zařizovacích předmětů
Úklid
Demontáž jeřábu
Okap. chodník
Tep. izol. sut. stěn + hutněný zásyp
Kanal. příp.
Vodov. příp.
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
28/12
29/12
30/12
31/12
1/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2

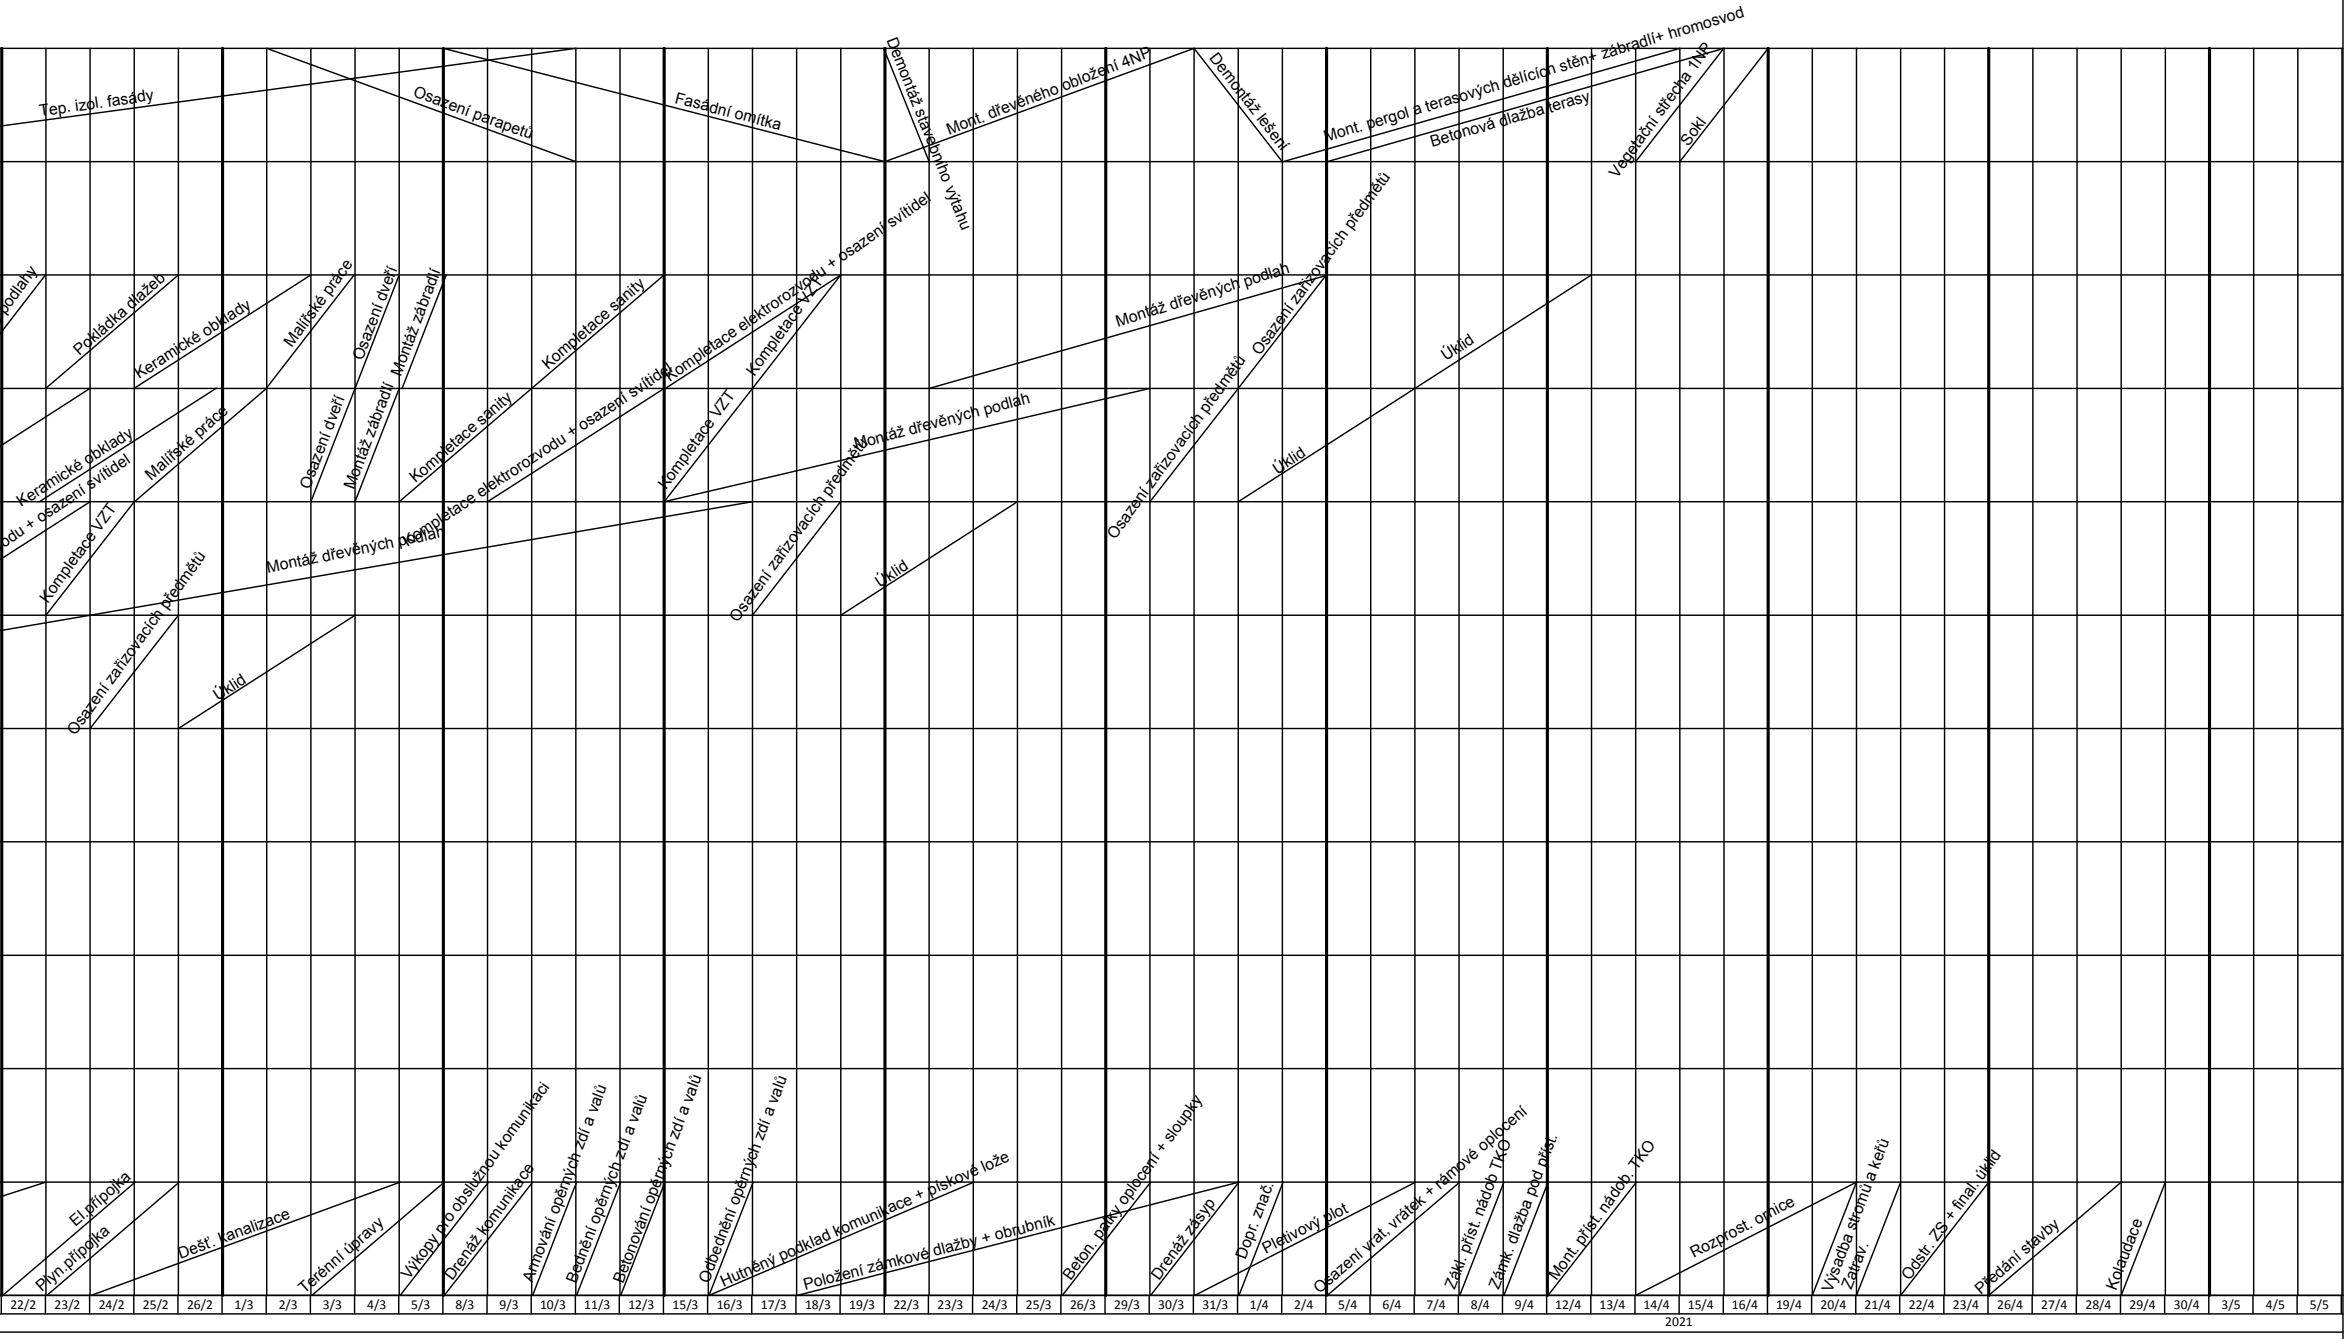
Tep. izol. fasády
Osazení parapetů
Fasádní omítka
Demontáž stavebního výtahu
Mont. dřevěného obložení 4NP
Demontáž lešení
Mont. pergol a terasových dělících stěn+ zábradlí+ hromosvod
Betonová dlažba terasy
Vegetační střecha 1NP
Sokl
podlahy
Pokládka dlažeb
Keramické obklady
Malířské práce
Osazení dveří
Montáž zábradlí
Kompletace sanity
Kompletace elektrorozvodu + osazení svítidel
Kompletace VZT
Montáž dřevěných podlah
Osazení zařizovacích předmětů
Úklid
Keramické obklady
odu + osazení svítidel
Malířské práce
Osazení dveří
Montáž zábradlí
Kompletace sanity
Kompletace elektrorozvodu + osazení svítidel
Kompletace VZT
Montáž dřevěných podlah
Osazení zařizovacích předmětů
Úklid
Kompletace VZT
Montáž dřevěných podlah
Osazení zařizovacích předmětů
Úklid
Osazení zařizovacích předmětů
Úklid
El.přípojka
Plyn.přípojka
Dešť. kanalizace
Terénní úpravy
Výkopy pro obslužnou komunikaci
Drenáž komunikace
Armování opěrných zdí a valů
Bednění opěrných zdí a valů
Betonování opěrných zdí a valů
Odbednění opěrných zdí a valů
Hutněný podklad komunikace + pískové lože
Položení zámkové dlažby + obrubník
Beton. patky oplocení + sloupky
Drenáž zásyp
Dopr. znač.
Pletivový plot
Osazení vrat, vrátek + rámové oplocení
Zákl. přísl. nádob TKO
Zámk. dlažba pod přísl.
Mont. přísl. nádob. TKO
Rozprost. ornice
Výsadba stromů a keřů
Zatrav.
Odstr. ZS + final. úklid
Předání stavby
Kolaudace
22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 3/5 4/5 5/5
2021
