CONTEC - Časový graf akce: 00200023 Centrum sociálních služeb Kolín

2.1.22 SO01 - a.dům

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
5	Zemní práce, bourání 1 SO01 - a.dům	9	15	0	25.2.21	4.6.21
10	Zakládání 1 SO01 - a.dům	3	17	0	1.3.21	25.6.21
20	Spodní stavba 1 SO01 - a.dům	4	2	1	28.6.21	9.7.21
30	Hrubá vrchní stavba 1 SO01 - a.dům	10	5	6	28.6.21	30.7.21
40	Střecha 1 SO01 - a.dům	4	11	8	19.7.21	1.10.21
50	Příčky,hrubé instalace 1 SO01 - a.dům	9	11	7	12.7.21	24.9.21
60	Omítky a potěry 1 SO01 - a.dům	5	13	4	2.8.21	29.10.21
70	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO01 - a.dům	3	16	0	2.8.21	19.11.21
80	Vnitřní kompletace 1 SO01 - a.dům	4	11	0	13.9.21	26.11.21
90	Vnější úpravy 1 SO01 - a.dům	5	18	0	26.7.21	26.11.21
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO01 - a.dům	1	1	0	29.11.21	3.12.21
10005	Zemní práce, bourání 1 SO02 - sklad	10	2	2	19.7.21	30.7.21
10010	Zakládání 1 SO02 - sklad	3	3	3	2.8.21	20.8.21
10030	Hrubá vrchní stavba 1 SO02 - sklad	4	2	2	16.8.21	27.8.21
10040	Střecha 1 SO02 - sklad	5	1	10	6.9.21	10.9.21
10050	Příčky,hrubé instalace 1 SO02 - sklad	5	2	4	6.9.21	17.9.21
10060	Omítky a potěry 1 SO02 - sklad	3	4	2	13.9.21	8.10.21
10070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO02 - sklad	4	2	5	18.10.21	29.10.21
10090	Vnější úpravy 1 SO02 - sklad	3	5	2	18.10.21	19.11.21
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO02 - sklad	1	1	1	22.11.21	26.11.21
20005	Zemní práce, bourání 1 SO03 - schodiště	4	3	0	28.6.21	16.7.21
20030	Hrubá vrchní stavba 1 SO03 - schodiště	4	6	2	19.7.21	27.8.21
20060	Omítky a potěry 1 SO03 - schodiště	3	3	0	23.8.21	10.9.21
20090	Vnější úpravy 1 SO03 - schodiště	4	2	0	6.9.21	17.9.21
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO03 - schodiště	1	1	0	13.9.21	17.9.21
30005	Zemní práce, bourání 1 SO04 - rampa	8	2	6	21.6.21	2.7.21
30030	Hrubá vrchní stavba 1 SO04 - rampa	4	11	0	28.6.21	10.9.21
30060	Omítky a potěry 1 SO04 - rampa	2	7	1	2.8.21	17.9.21
30090	Vnější úpravy 1 SO04 - rampa	5	3	1	13.9.21	1.10.21
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO04 - rampa	1	1	0	27.9.21	1.10.21
40005	Zemní práce, bourání 1 SO05 - oplocení	5	4	2	30.8.21	24.9.21
40030	Hrubá vrchní stavba 1 SO05 - oplocení	5	2	1	27.9.21	8.10.21

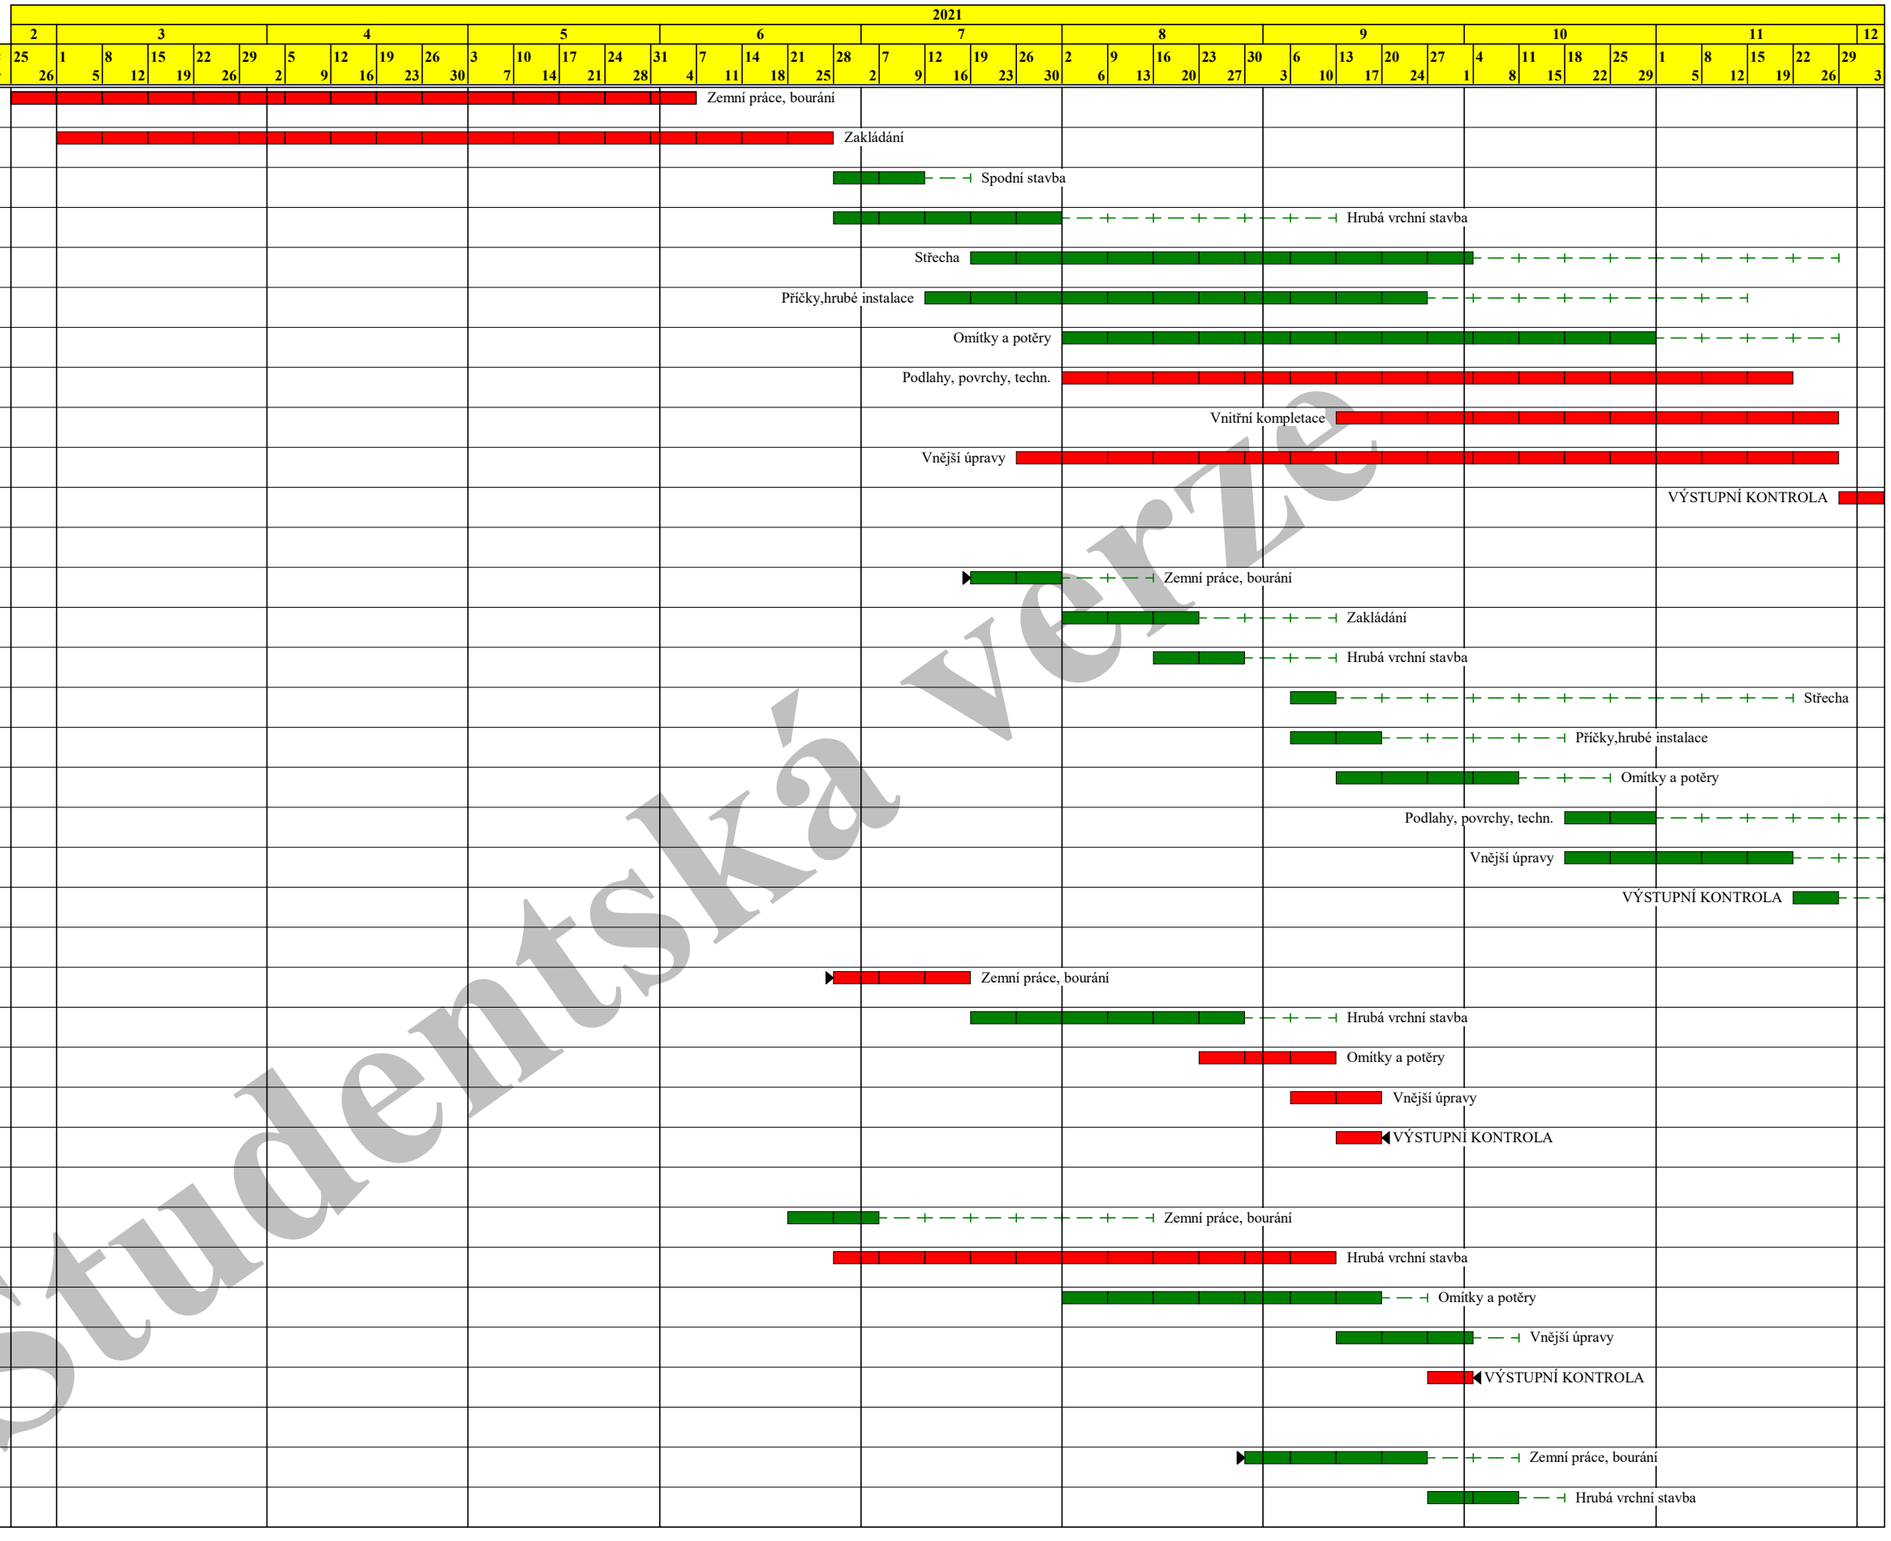

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

Studentská verze

2.1.22 SO05 - oplocení

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
40090	Vnější úpravy	6	6	1	18.10.21	26.11.21
	1 SO05 - oplocení					
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	1	22.11.21	26.11.21
	1 SO05 - oplocení					
50005	Zemní práce, bourání	7	1	2	4.10.21	8.10.21
	1 SO09 - zeleň					
50030	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	3	1	1	11.10.21	15.10.21
	1 SO09 - zeleň					
50060	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	3	18.10.21	22.10.21
	1 SO09 - zeleň					
50090	Vnější úpravy	6	4	1	18.10.21	12.11.21
	1 SO09 - zeleň					
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	1	8.11.21	12.11.21
	1 SO09 - zeleň					
60005	PŘEJÍMKA	1	1	0	29.11.21	3.12.21
	1					

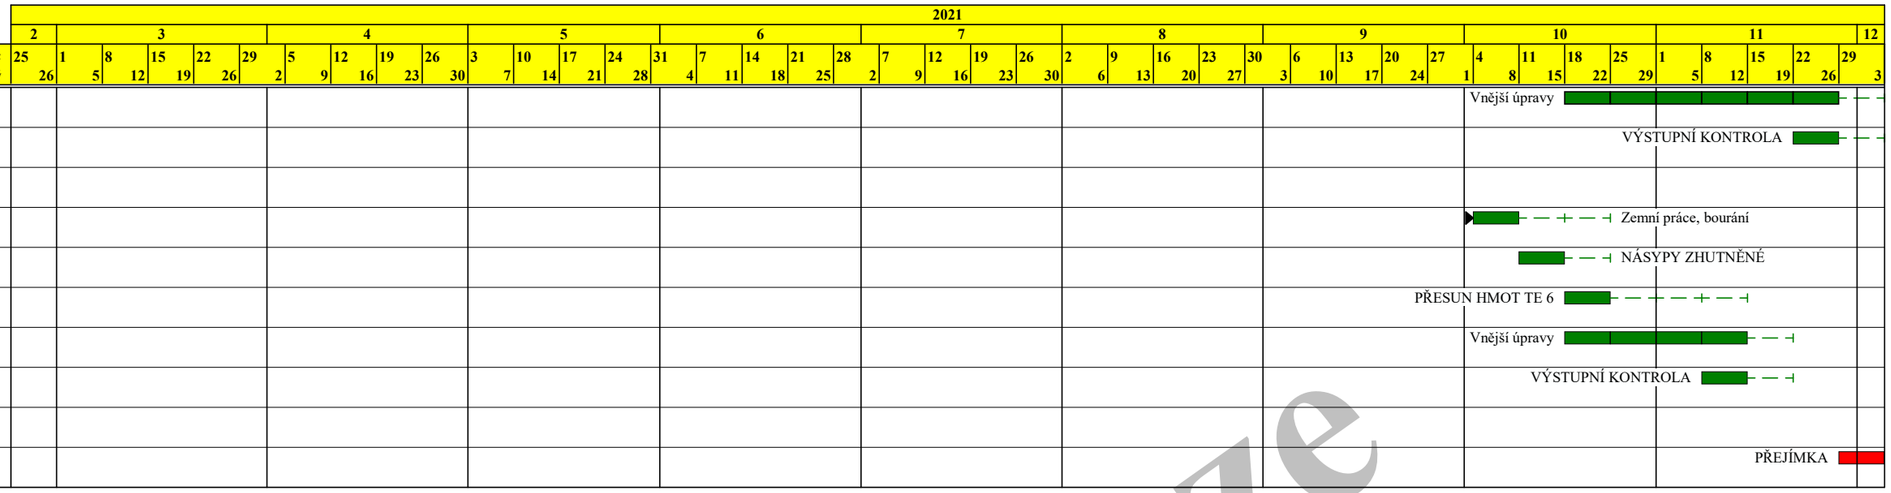

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

Studentská verze
