


# Zprovoznění ordinace pro fyzioterapeuty

Process of commissioning physiotherapy office

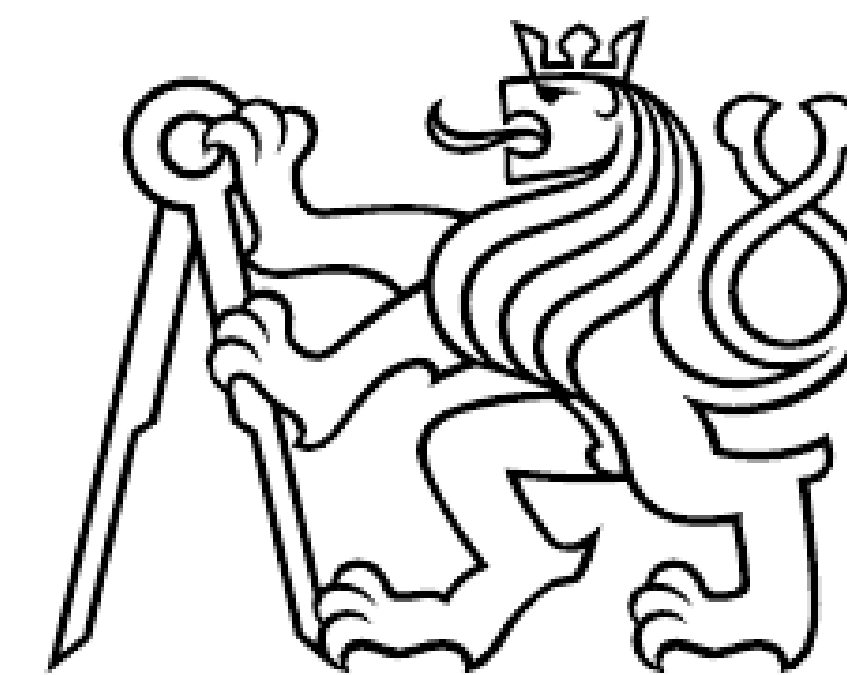

## Abstrakt


Bakalářská práce slouží jako příručka pro fyzioterapeuty, kteří si chtějí založit vlastní ordinaci svépomocí. Práce vysvětluje pojem fyzioterapie, zdravotnické zařízení a veškeré podmínky dané zákonem, které musí být naplněny. V práci jsou představeny a vysvětleny nástroje projektového řízení vhodné při plánování projektů.

Cílem práce je představit problematiku zprovoznění vlastní ordinace vhodnou pro fyzioterapii. Práce přehledně představuje veškeré podstatné informace a úkony, které je nutné splnit.


V teoretické části jsou popsány jednotlivé nástroje projektového řízení, které jsou dále využity v praktické části. Především se jedná o tyto nástroje projektového řízení – kritická cesta, Ganttův diagram a Work Breakdown Structure. Zákonné požadavky jsou zpracovány formou rešerše napříč jednotlivými zákony, vyhláškami či nařízeními vlády. Práce mimo jiné obsahuje i kalkulaci nákladů a výnosů při provozu ordinace.

Výsledkem je zpracování teorie do praxe a vypracování projektového plánu pro zprovoznění ordinace pro fyzioterapeuty. Zdravotnické zařízení, tedy ordinaci pro fyzioterapii, si mohou fyzioterapeuti založit a zařídit za 69 dní. Do tohoto času se nezapočítává shánění prostorů ani odborná kvalifikace. Finanční náklady na vybavení nových prostorů a administrativní úkony s tím spojené činí cca 150 000 Kč.

## 1. Work Breakdown Structure

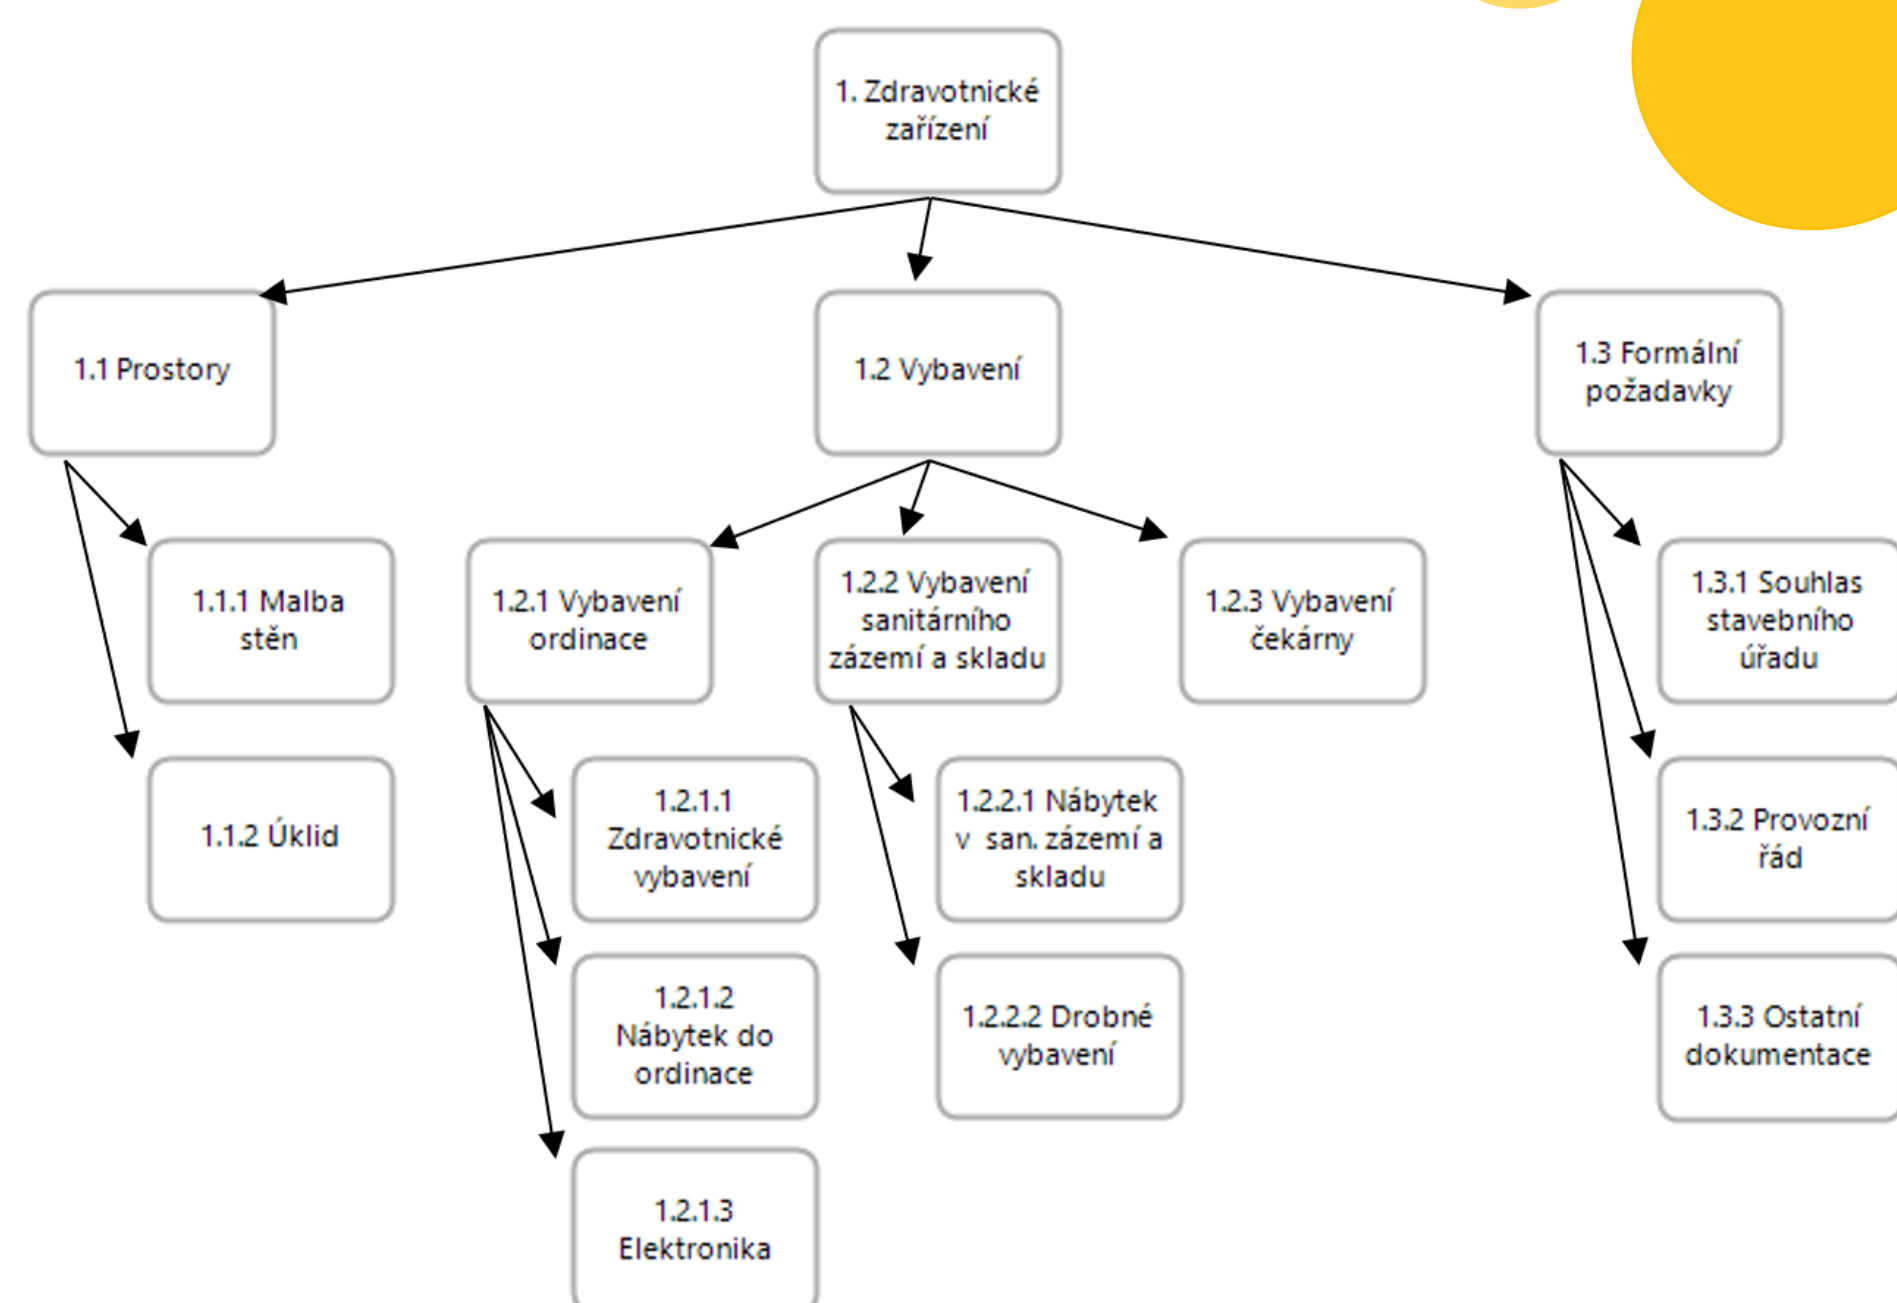


## 2. Critical Path Method

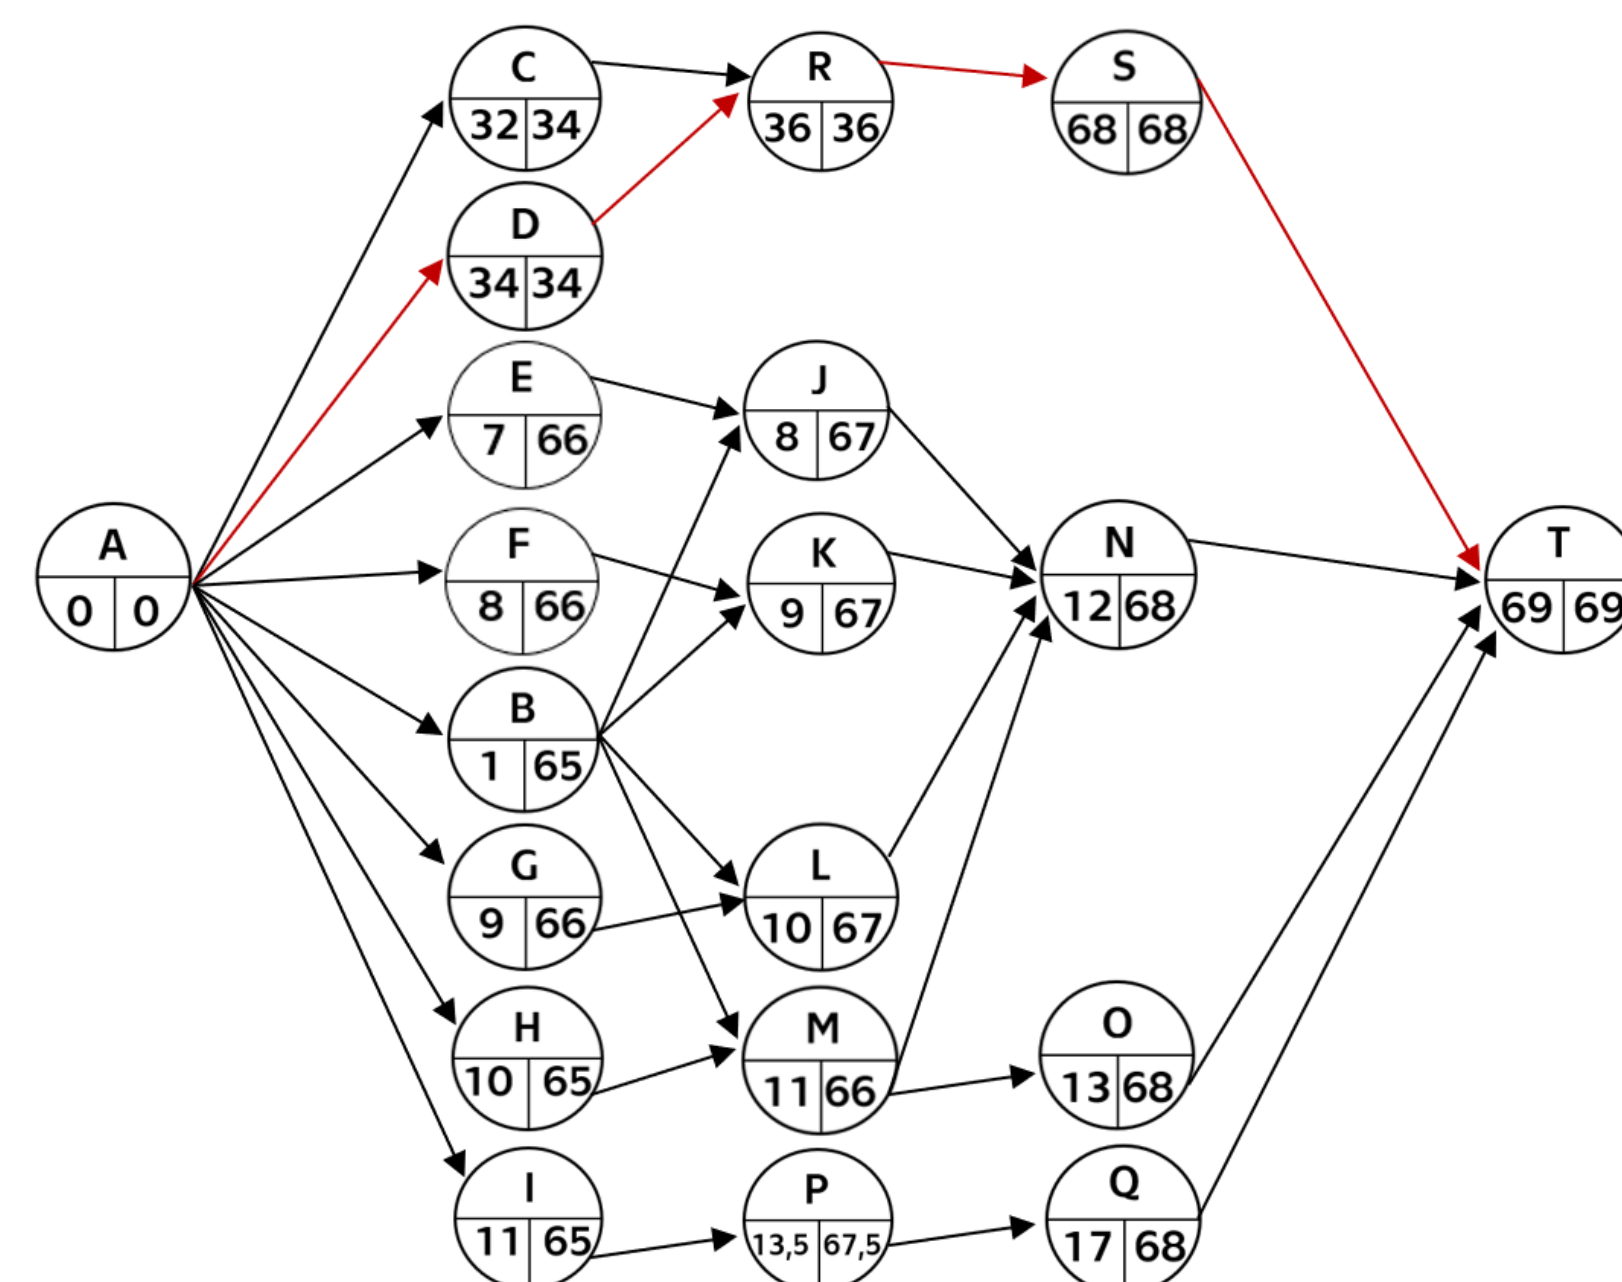

## 4. Rozpočet projektu

Označení WP	Název WP	Celkové náklady na WP
1.1.1	Malba stěn	8 820 Kč
1.1.2	Úklid	500 Kč
1.2.1.1	Zdravotnické vybavení	48 241 Kč
1.2.1.2	Nábytek do ordinace	20 197 Kč
1.2.1.3	Elektronika	24 510 Kč
1.2.2.1	Nábytek v sanitárním zázemí a skladu	10 220 Kč
1.2.2.2	Drobné vybavení	10 943 Kč
1.2.3	Vybavení čekárny	7 359 Kč
1.3.1	Souhlas stavebního úřadu	0 Kč
1.3.2	Provozní řád	0 Kč
1.3.3	Oprávnění k poskytování zdravotních služeb	16 700 Kč
<b>Celkové náklady na projekt:</b>		<b>147 490 Kč</b>

## 3. Ganttův diagram

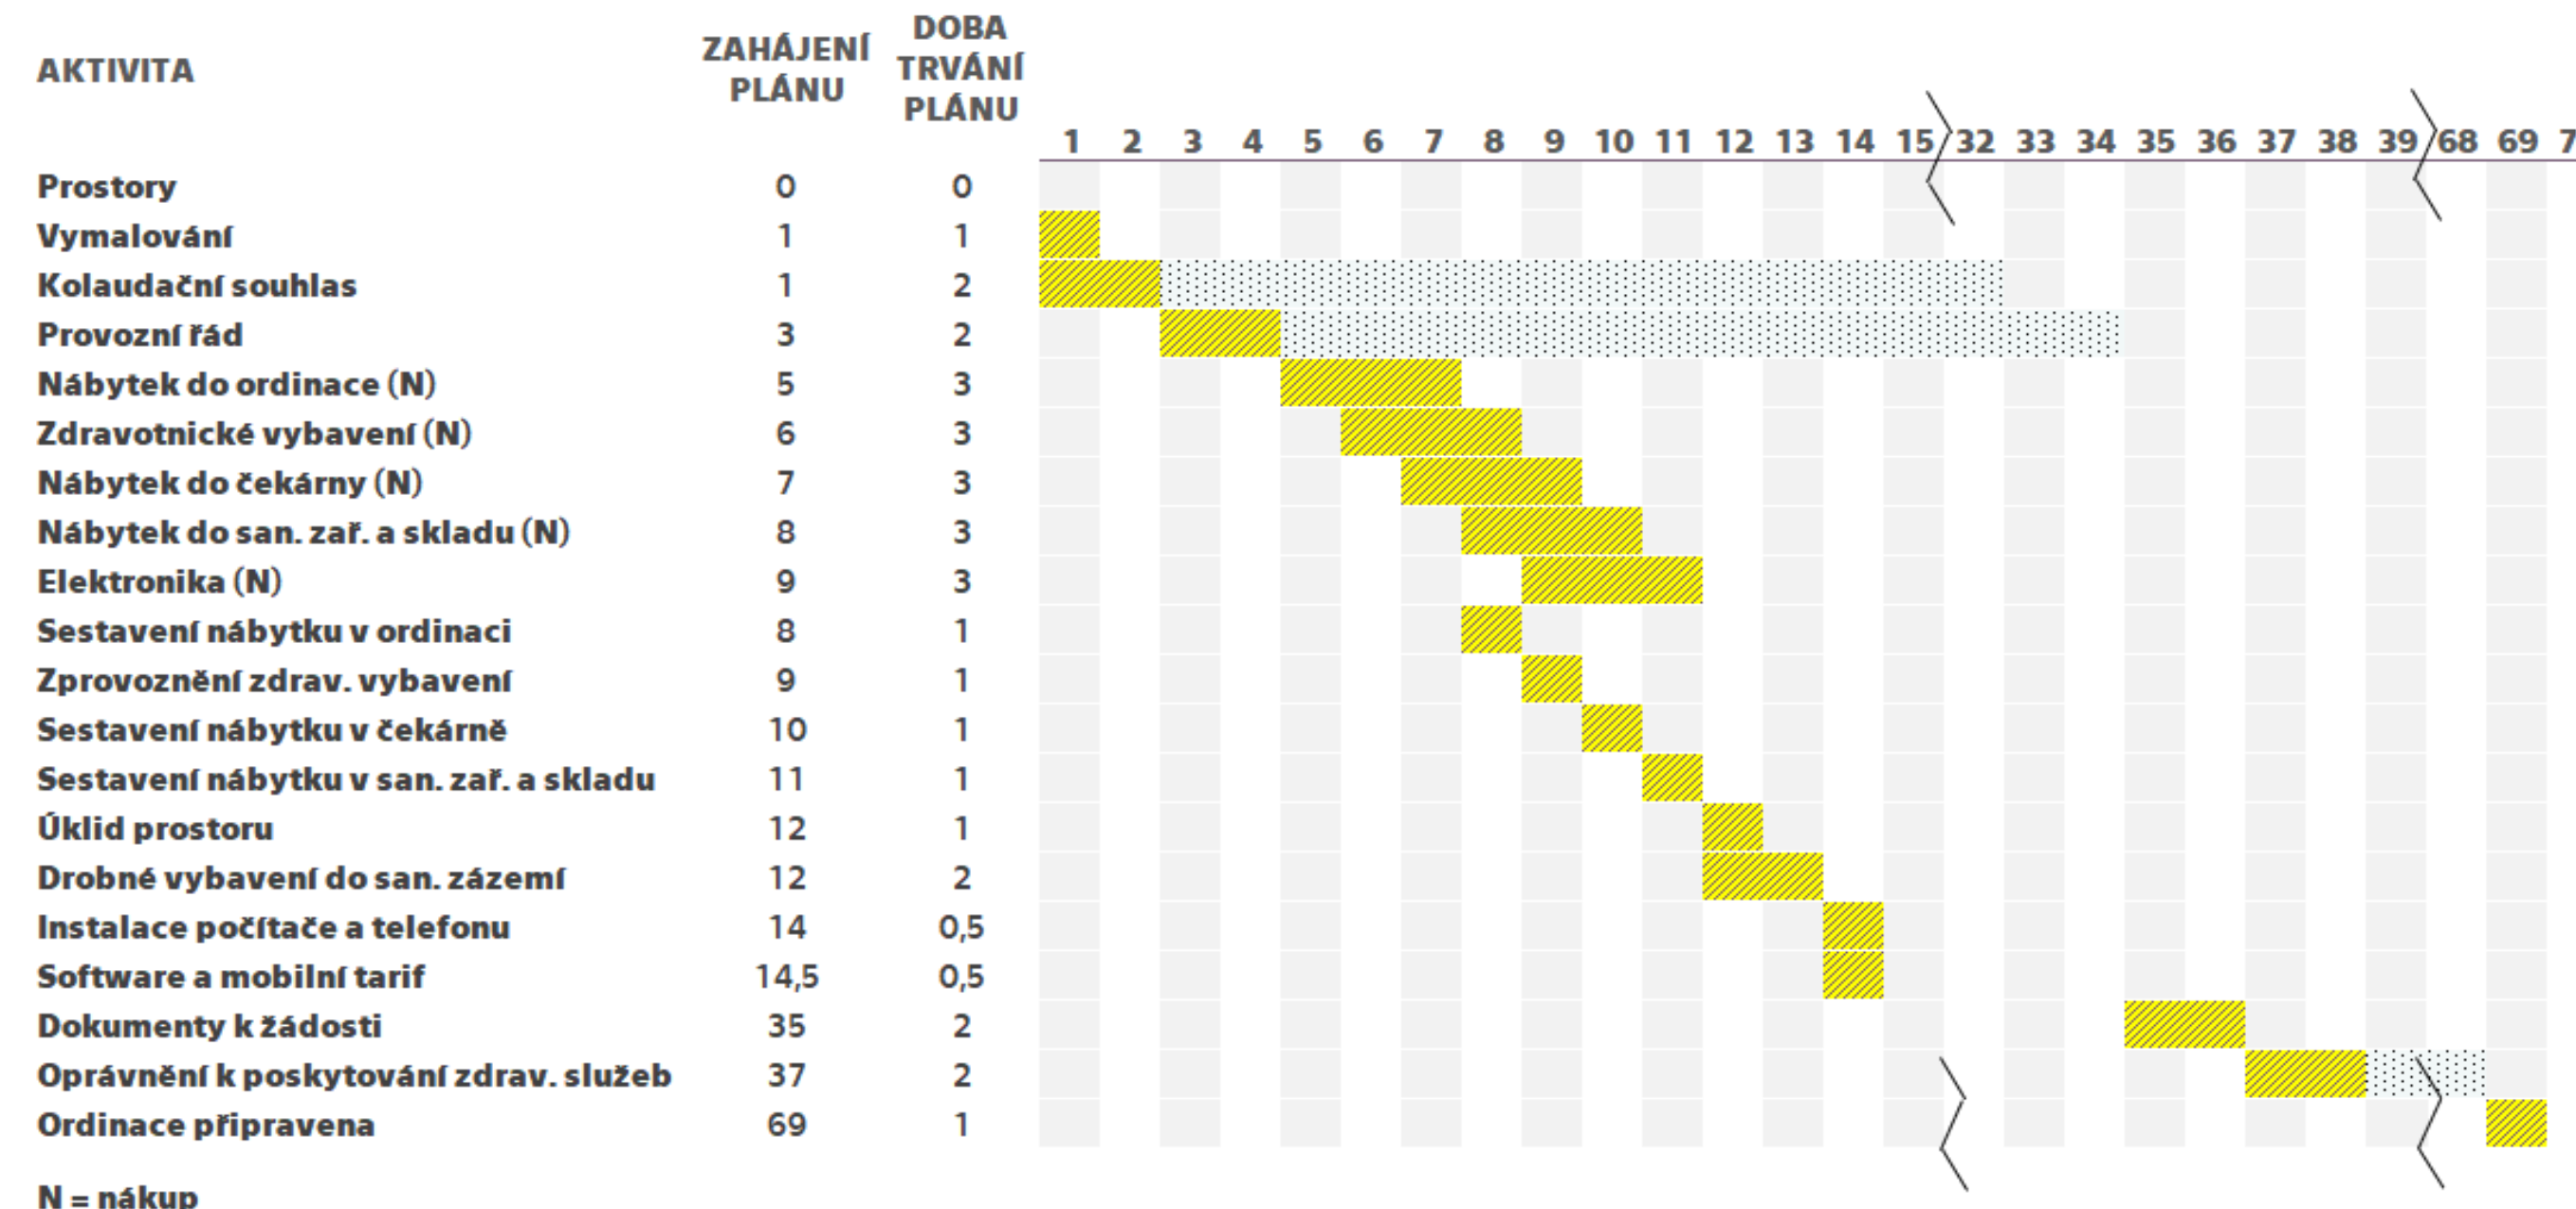

## Metodika práce

V práci je využito dvou obecně teoretických metod, a to **analýzy a syntézy**. Zákonné podmínky byly zpracovány pomocí rešerše jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Praktická část byla zpracována jako projekt a využívá nástrojů projektového řízení, jako **jsou Work Breakdown Structure, Work Breakdown Structure Dictionary, Critical Path Method a Ganttův diagramu**.

## Summary

The thesis is guide for physiotherapists who want to start their own physiotherapy office. The thesis explains the concept of physiotherapy, healthcare institutions and all the conditions set by law. The thesis introduces and explains project management tools suitable for project planning.

The aim of the work is to present the issue of putting your own surgery suitable for physiotherapy. The work clearly presents all the essential information and tasks that must be completed.

The result is the elaboration of theory into practice and project plan for the commissioning of physiotherapy office in the Czech Republic. Physiotherapists can establish and arrange their healthcare institutions, physiotherapy office, in about 69 days. This time does not include search for premises or professional qualifications. The financial costs of equipment of the new premises and the related administrative tasks amount to approximately 150 000 CZK.
