

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT
FIREMNÍ SÍDLO BRT SERVIS S.R.O.**

Příloha 4 – Řešení časové struktury

2023

BC. JAN ŽDÁRSKÝ

**VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
PROF. ING. ČENĚK JARSKÝ, DRSC., FENG**

Obsah

- 4.1. Časový harmonogram ve struktuře dílčích procesů**
- 4.2. Časový harmonogram ve struktuře etapových procesů**
- 4.3. Časový harmonogram ve struktuře objektových procesů**
- 4.4. Časoprostorový graf – podrobný**
- 4.5. Časoprostorový graf – etapový**
- 4.6. Graf potřeby pracovníků**
- 4.7. Graf potřeby nákladů**
- 4.8. Graf potřeby rozpočtové ceny**
- 4.9. Graf potřeby materiálů – betonová směs**
- 4.10. Graf potřeby materiálů – betonové tvárnice**
- 4.11. Časový graf strojů**
- 4.12. Graf potřeby stroje - autojeřáb**

20.12.22


Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	2022												2023																																		
							11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9						
							1	7	14	21	28	5	12	19	27	30	2	9	16	23	30	6	13	20	27	31	3	10	17	24	31	7	14	21	28	2	9	16	23	30	5	12	19	26	31	3	10	17	24	31	7	14	21
Přípojka voda																																																					
5	Zemní práce, bourání 1 Přípojka voda	5	2	0	1.11.22	11.11.22	Zemní práce, bourání																																														
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Přípojka voda	3	1	0	1.11.22	4.11.22	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																														
501	PAŽENÍ 1 Přípojka voda	2	2	0	1.11.22	11.11.22	PAŽENÍ																																														
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Přípojka voda	2	1	1	1.11.22	4.11.22	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																														
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Přípojka voda	1	1	1	1.11.22	4.11.22	NÁSYPY A SKLÁDKY																																														
30 ŠACHTY NA POTRUBÍ																																																					
3808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Přípojka voda	3	1	1	14.11.22	18.11.22	ŠACHTY NA POTRUBÍ																																														
60 Vlastní konstrukce																																																					
6178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Přípojka voda	3	1	1	21.11.22	25.11.22	POTRUBÍ Z PLASTU																																														
6207	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Přípojka voda	2	1	2	21.11.22	25.11.22	VODOVOD ROZV A ARMATURY																																														
6608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Přípojka voda	2	1	2	28.11.22	2.12.22	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET																																														
90 Dokončovací konstrukce																																																					
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Přípojka voda	2	1	1	28.11.22	2.12.22	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ																																														
9501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Přípojka voda	4	1	1	5.12.22	9.12.22	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ																																														
95 VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																					
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Přípojka voda	1	1	1	5.12.22	9.12.22	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																														
Přípojka kanal																																																					
10005	Zemní práce, bourání 1 Přípojka kanal	6	1	1	7.11.22	11.11.22	Zemní práce, bourání																																														
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Přípojka kanal	3	1	0	7.11.22	11.11.22	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																														
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Přípojka kanal	2	1	1	7.11.22	11.11.22	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																														
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Přípojka kanal	1	1	1	7.11.22	11.11.22	NÁSYPY A SKLÁDKY																																														
10030 PODKLAD A VEDL KONSTR IS																																																					
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Přípojka kanal	2	1	0	14.11.22	18.11.22	PODKLAD A VEDL KONSTR IS																																														
10060 POTRUBÍ Z PLASTU																																																					
16278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Přípojka kanal	3	1	1	28.11.22	2.12.22	POTRUBÍ Z PLASTU																																														
10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Přípojka kanal	1	1	1	12.12.22	16.12.22	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶

20.12.22

Index Dodav.	Název činnosti Smělnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	2022																														2023																													
							11					12					1					2					3					4					5					6					7					8					9									
							1	7	14	21	28	5	12	19	27	30	2	9	16	23	30	3	6	13	20	27	3	6	13	20	27	3	6	13	20	27	3	7	14	21	28	2	9	15	22	29	5	12	19	26	30	3	7	14	21	28	3	7	14	21	28	4	11	18	25	31
10	Přípojka voda 1	5	6	1	1.11.22	9.12.22	Přípojka voda																																																											
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Přípojka voda	3	1	0	1.11.22	4.11.22	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																																											
501	PAŽENÍ 1 Přípojka voda	2	2	0	1.11.22	11.11.22	PAŽENÍ																																																											
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Přípojka voda	2	1	1	1.11.22	4.11.22	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																																											
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Přípojka voda	1	1	1	1.11.22	4.11.22	NÁSYPY A SKLÁDKY																																																											
3808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Přípojka voda	3	1	1	14.11.22	18.11.22	ŠACHTY NA POTRUBÍ																																																											
6178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Přípojka voda	3	1	1	21.11.22	25.11.22	POTRUBÍ Z PLASTU																																																											
6207	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Přípojka voda	2	1	2	21.11.22	25.11.22	VODOVOD ROZV A ARMATURY																																																											
6608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Přípojka voda	2	1	2	28.11.22	2.12.22	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET																																																											
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Přípojka voda	2	1	1	28.11.22	2.12.22	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ																																																											
9501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Přípojka voda	4	1	1	5.12.22	9.12.22	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ																																																											
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Přípojka voda	1	1	1	5.12.22	9.12.22	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																											
20	Přípojka kanal 1	2	6	1	7.11.22	16.12.22	Přípojka kanal																																																											
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Přípojka kanal	3	1	0	7.11.22	11.11.22	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																																											
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Přípojka kanal	2	1	1	7.11.22	11.11.22	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																																											
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Přípojka kanal	1	1	1	7.11.22	11.11.22	NÁSYPY A SKLÁDKY																																																											
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Přípojka kanal	2	1	0	14.11.22	18.11.22	PODKLAD A VEDL KONSTR IS																																																											
16278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Přípojka kanal	3	1	1	28.11.22	2.12.22	POTRUBÍ Z PLASTU																																																											
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Přípojka kanal	1	1	1	12.12.22	16.12.22	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																											
30	Přípojka plyn 1	5	7	1	14.11.22	30.12.22	Přípojka plyn																																																											
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Přípojka plyn	3	1	0	14.11.22	18.11.22	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																																											
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Přípojka plyn	2	1	1	14.11.22	18.11.22	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																																											
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Přípojka plyn	1	1	1	14.11.22	18.11.22	NÁSYPY A SKLÁDKY																																																											
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Přípojka plyn	2	1	0	21.11.22	25.11.22	PODKLAD A VEDL KONSTR IS																																																											
23859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Přípojka plyn	3	1	3	21.11.22	25.11.22	PŘESUN HMOT TE 3																																																											
26108	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Přípojka plyn	3	1	1	5.12.22	9.12.22	POTRUBÍ Z PLASTU																																																											
26258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Přípojka plyn	2	1	1	12.12.22	16.12.22	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET																																																											
26755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Přípojka plyn	3	1	1	19.12.22	23.12.22	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA																																																											
26859	PŘESUN HMOT TE 6 1 Přípojka plyn	2	1	3	5.12.22	9.12.22	PŘESUN HMOT TE 6																																																											
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Přípojka plyn	2	1	2	12.12.22	16.12.22	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ																																																											
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Přípojka plyn	4	1	1	19.12.22	23.12.22	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ																																																											
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 Přípojka plyn	3	1	1	27.12.22	30.12.22	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE																																																											
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 Přípojka plyn	2	1	1	27.12.22	30.12.22	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU																																																											
29859	PŘESUN HMOT TE 9 1 Přípojka plyn	2	1	1	27.12.22	30.12.22	PŘESUN HMOT TE 9																																																											

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶

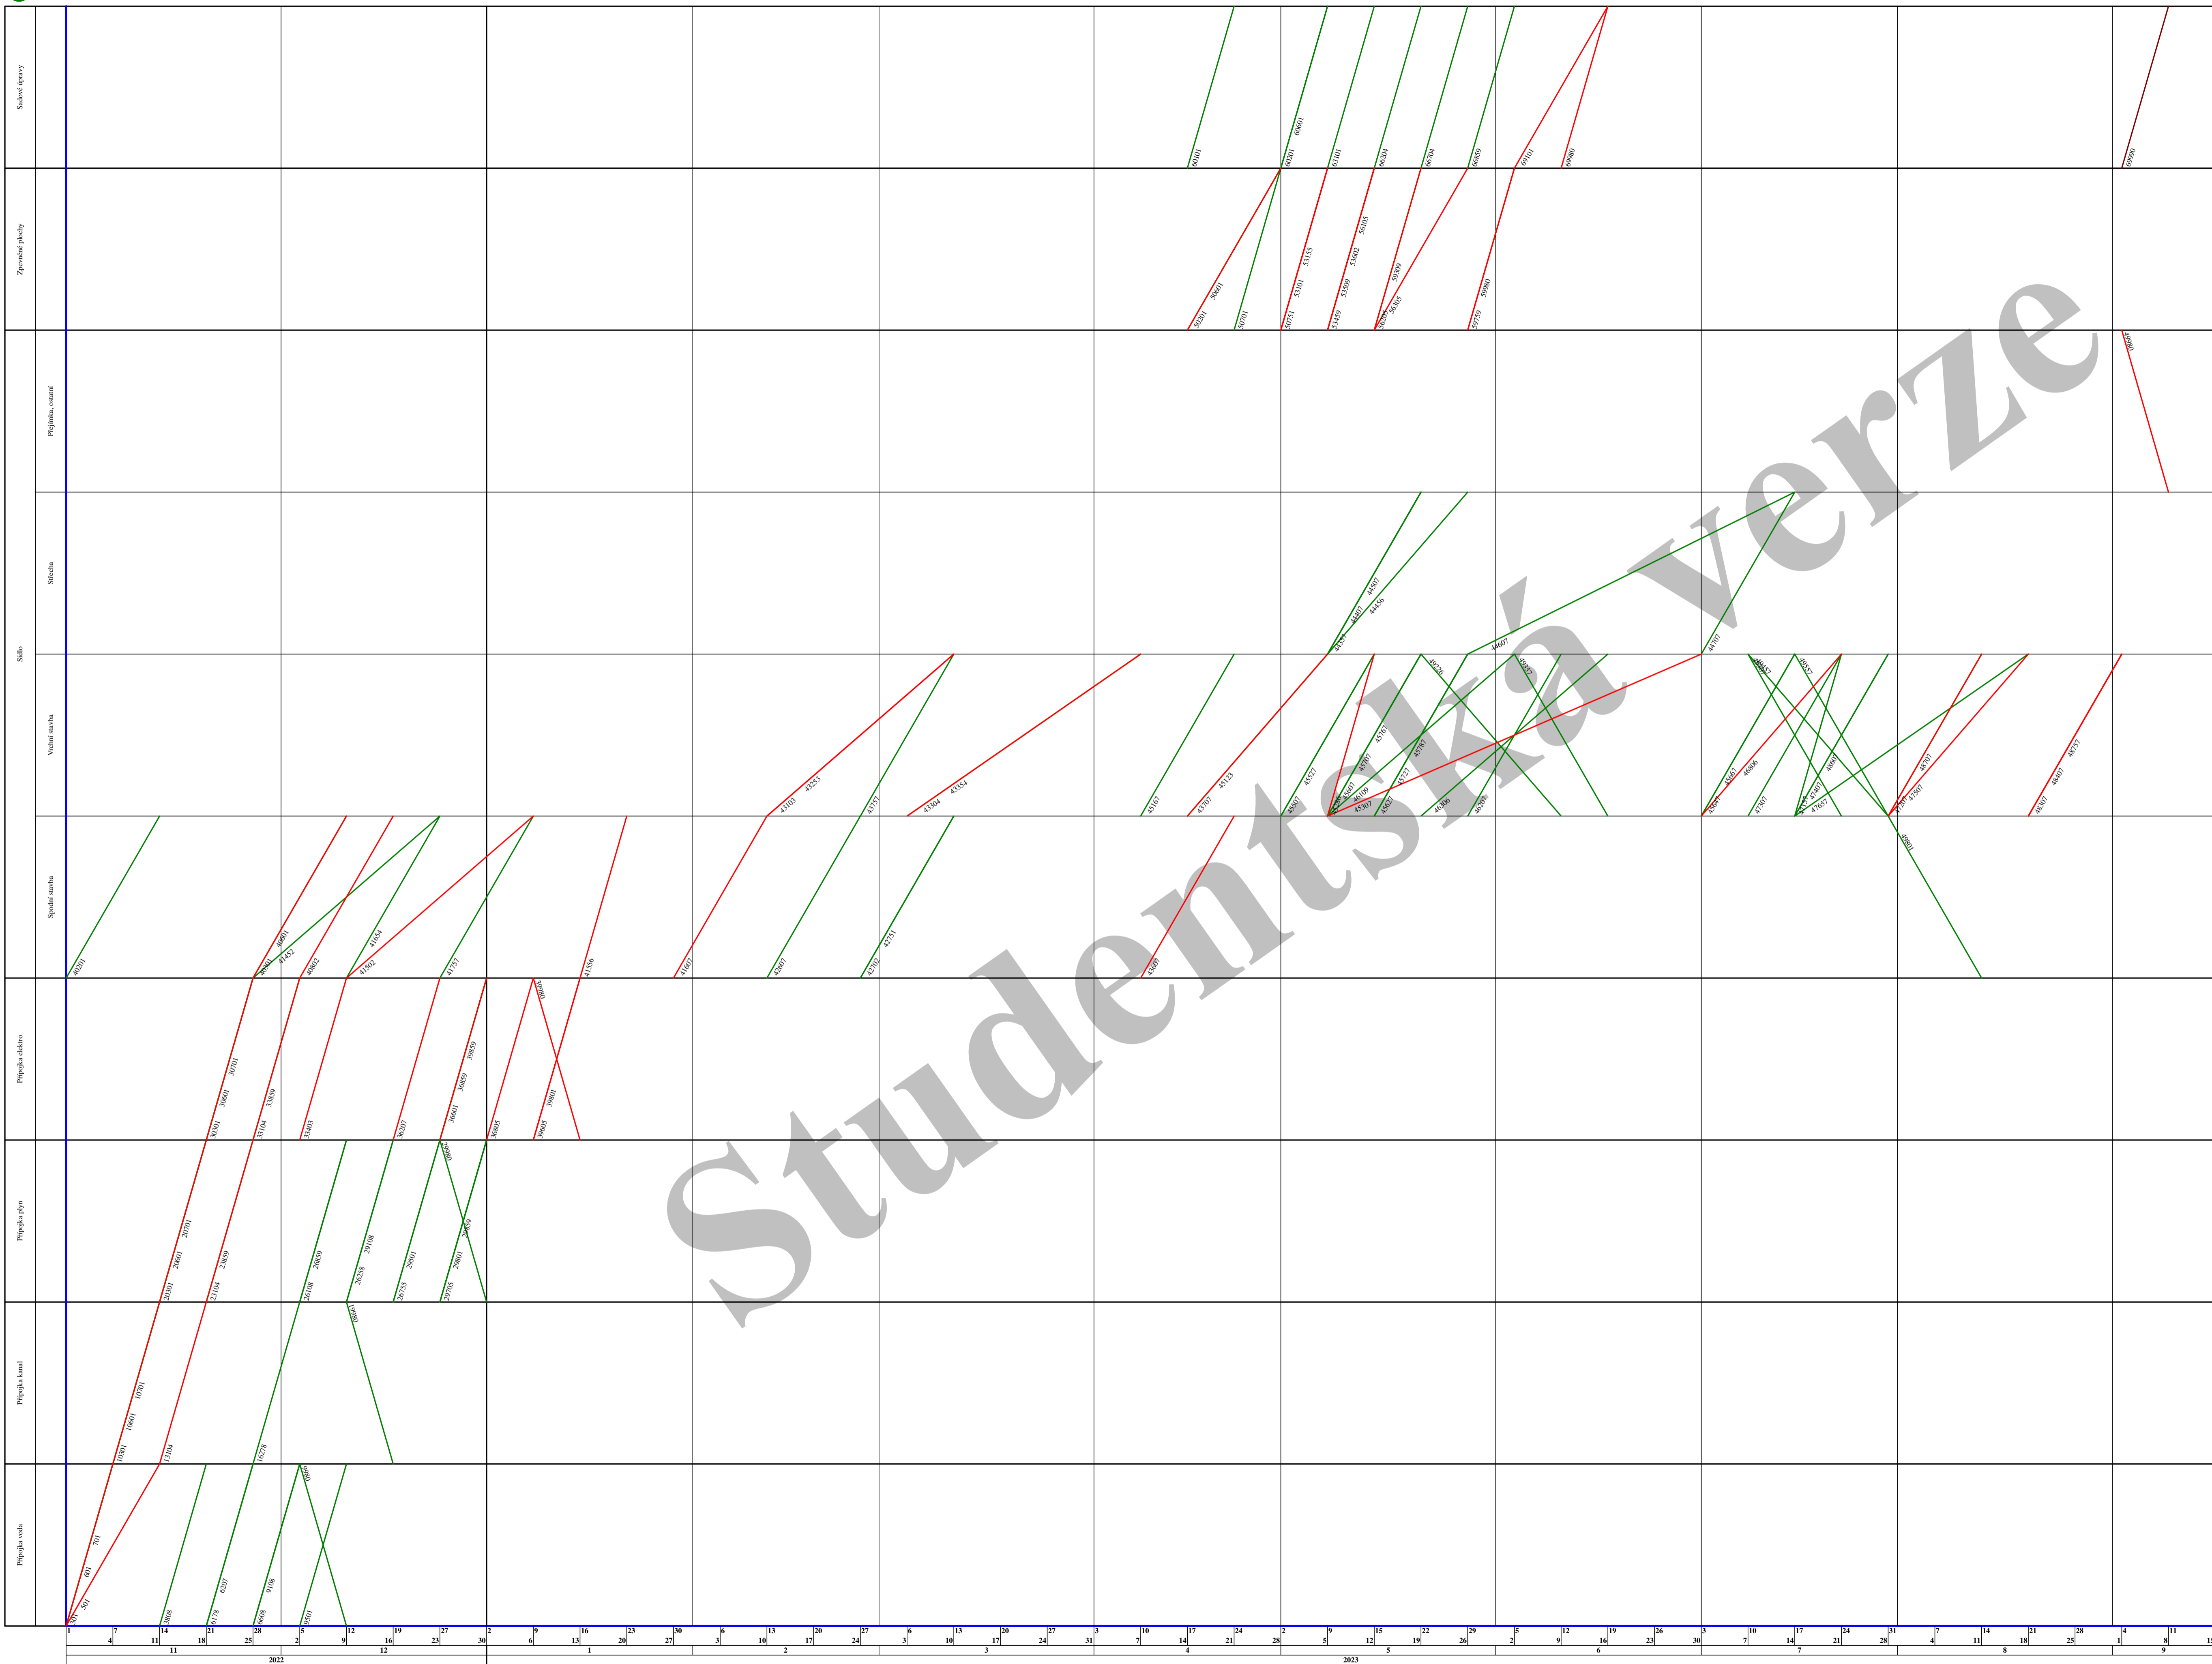


— činnost kritická
— činnost nespolečná
— činnost s rezervou
— milník
 v nejdříve možných termínech

- Přípojka voda**
- 301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka voda
 - 501 PAŽENÍ, Přípojka voda
 - 601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka voda
 - 701 NÁSPY A SKLADKY, Přípojka voda
 - 3808 ŠACHTY NA POTRUBÍ, Přípojka voda
 - 6178 POTRUBÍ Z PLASTU, Přípojka voda
 - 6207 VODOVOD ROZVY A ARMATURY, Přípojka voda
 - 6608 ARMATURY, DOPLŇSKÝ ŠACHET, Přípojka voda
 - 9108 TLAK ŽK A DEŽIŇNÍ POTRUBÍ, Přípojka voda
 - 9501 OBSPY A ZÁSYPY POTRUBÍ, Přípojka voda
 - 9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka voda
- Přípojka kanal**
- 1001 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka kanal
 - 10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka kanal
 - 10701 NÁSPY A SKLADKY, Přípojka kanal
 - 13104 PODKLAD A VEDL. KONSTR. IS, Přípojka kanal
 - 16278 POTRUBÍ Z PLASTU, Přípojka kanal
 - 19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka kanal
- Přípojka plyn**
- 2001 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka plyn
 - 20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka plyn
 - 20701 NÁSPY A SKLADKY, Přípojka plyn
 - 23104 PODKLAD A VEDL. KONSTR. IS, Přípojka plyn
 - 23859 PŘESUN HMOT TE 3, Přípojka plyn
 - 26108 POTRUBÍ Z PLASTU, Přípojka plyn
 - 26258 ARMATURY, DOPLŇSKÝ ŠACHET, Přípojka plyn
 - 26755 PODKLAD KOM VŘICH VRSTVA, Přípojka plyn
 - 26859 PŘESUN HMOT TE 6, Přípojka plyn
 - 29108 TLAK ŽK A DEŽIŇNÍ POTRUBÍ, Přípojka plyn
 - 29501 OBSPY A ZÁSYPY POTRUBÍ, Přípojka plyn
 - 29705 VYSRAVENÍ KRUTU ŽIVICE, Přípojka plyn
 - 29801 POKROVĚ ÚPRAVY TERÉNU, Přípojka plyn
 - 29859 PŘESUN HMOT TE 9, Přípojka plyn
 - 29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka plyn
- Přípojka elektro**
- 3001 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka elektro
 - 30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka elektro
 - 30701 NÁSPY A SKLADKY, Přípojka elektro
 - 33104 PODKLAD A VEDL. KONSTR. IS, Přípojka elektro
 - 33401 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, Přípojka elektro
 - 33859 PŘESUN HMOT TE 3, Přípojka elektro
 - 36007 ZÁSYPY, Přípojka elektro
 - 36005 PODKLAD KOM VŘICH VRSTVA, Přípojka elektro
 - 36859 PŘESUN HMOT TE 6, Přípojka elektro
 - 39865 VYSRAVENÍ KRUTU ŽIVICE, Přípojka elektro
 - 39801 POKROVĚ ÚPRAVY TERÉNU, Přípojka elektro
 - 39859 PŘESUN HMOT TE 9, Přípojka elektro
 - 39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka elektro

- Sídlo**
- 4001 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, Sídlo
 - 4001 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Sídlo
 - 40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Sídlo
 - 40802 POLŠTĚR ZAKLADŮ, Sídlo
 - 41452 ÚPR. PODLAŽÍ A ZÁKL. SPÁRY, Sídlo
 - 41502 ZÁKLADY, Sídlo
 - 41556 PODKL. VRSTVY SPOD STAVBY, Sídlo
 - 41607 IZOL. PROTIZEMNÍ LH VODI, Sídlo
 - 41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE, Sídlo
 - 41757 KANALIZACE LEŽATÁ, Sídlo
 - 42407 IZOL. PROTIZEMNÍ LH SVI, Sídlo
 - 42702 TRATIVODY, Sídlo
 - 42751 OBSPY A ZÁSYPY OBJEKTU, Sídlo
 - 43103 ŽIVICE, Sídlo
 - 43253 SLOUPY A PILÍŘE, Sídlo
 - 43304 STŘEŠNÍ, Sídlo
 - 43354 SCHODIŠTĚ, Sídlo
 - 43607 MONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO JEŘABU, Sídlo
 - 43707 ZÁMEČNÍ KONSTR. PRVKY, Sídlo
 - 43757 IZOL. PROTIZEMNÍ LH VODI, Sídlo
 - 44357 KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY, Sídlo
 - 44407 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH, Sídlo
 - 44456 NÁSPY A MAZANINY STŘECH, Sídlo
 - 44507 ZÁMEČNÍ STŘEŠNÍ PRVKY, Sídlo
 - 44607 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH, Sídlo
 - 44707 HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁSTI, Sídlo
 - 45123 PRŮČKY A STĚNY VÝŠKOVÉ, Sídlo
 - 45167 PRŮČKY A PODHL. SÁDROKART, Sídlo
 - 45286 VÝPLNĚ OTVORŮ, Sídlo
 - 45307 ZÁMEČ. VÝPLNĚ OTV. PĚŠT, Sídlo
 - 45507 KANALIZACE VNITŘNÍ, Sídlo
 - 45527 VODOVOD ROZVY A ARMATURY, Sídlo
 - 45607 RIZOVODY UT VNITŘNÍ, Sídlo
 - 45627 ARMATURY UT, Sídlo
 - 45647 OTOPNÁ TĚLESA, Sídlo
 - 45667 KOTLEVNÍ ÚT, Sídlo
 - 45707 SILNOPROUD HRUBA MONTÁŽ, Sídlo
 - 45727 SILNOPROUD VODICE, Sídlo
 - 45767 SLABOPROUD TRUBKY, Sídlo
 - 45787 SLABOPROUD VODICE, Sídlo
 - 46109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ, Sídlo
 - 46203 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR., Sídlo
 - 46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ, Sídlo
 - 46409 LEŠENÍ POMOCNÉ LEŠENÍ, Sídlo
 - 47157 TESÁŘI OBKLADY DESKAMI, Sídlo
 - 47207 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PRŮČEK, Sídlo
 - 47307 OBKLADY VNITŘNÍ, Sídlo
 - 47407 OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ, Sídlo
 - 47507 PODLAHY SYNTETICKÉ, Sídlo
 - 47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ, Sídlo
 - 48307 TRuhlářI DVEŘE, VYBAVENÍ, Sídlo
 - 48407 ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ŽTL, Sídlo
 - 48607 MĚŘENÍ A REGULACE, Sídlo
 - 48707 SLABOPROUD KOMPLET. ZAŘÍZ., Sídlo
 - 48757 SILNOPROUD KOMPLET. VÝM., Sídlo
 - 49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ, Sídlo
 - 49307 HROMOSVOD FASÁD, ZEMNĚNÍ, Sídlo
 - 49357 SILNOPROUD KOMPLET. VÝM., Sídlo
 - 49457 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY, Sídlo
 - 49557 KLEMPŘI FASÁDNÍ PRVKY, Sídlo
 - 49801 POKROVĚ ÚPRAVY TERÉNU, Sídlo
 - 49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Sídlo

- Zpevněné plochy**
- 50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, Zpevněné plochy
 - 50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Zpevněné plochy
 - 50701 NÁSPY A SKLADKY, Zpevněné plochy
 - 50751 ÚPRAVY PLOŠE VYROVNÁNÍM, Zpevněné plochy
 - 53101 NÁSPY ZHUTNĚNÉ, Zpevněné plochy
 - 53155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY, Zpevněné plochy
 - 53459 CHRONIKOVÉ OBRUBKY, Zpevněné plochy
 - 53509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY, Zpevněné plochy
 - 53602 TRATIVODY, Zpevněné plochy
 - 56105 PODKLAD KOM VŘICH VRSTVA, Zpevněné plochy
 - 56205 ŽIVICE, KRYT KOMUNIKACE, Zpevněné plochy
 - 56305 DE. AZBA KOMUNIKACE, Zpevněné plochy
 - 59109 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIČE, Zpevněné plochy
 - 59759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV, Zpevněné plochy
 - 59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Zpevněné plochy

- Sadové úpravy**
- 60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR. PRÁCE, Sadové úpravy
 - 60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, Sadové úpravy
 - 60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Sadové úpravy
 - 63101 NÁSPY ZHUTNĚNÉ, Sadové úpravy
 - 66204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR. IS, Sadové úpravy
 - 66704 DL. AZBY IS, Sadové úpravy
 - 66859 PŘESUN HMOT TE 6, Sadové úpravy
 - 69101 POKROVĚ ÚPRAVY TERÉNU, Sadové úpravy
 - 69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Sadové úpravy
 - 69900 PŘEDÁNÍ STAVBY, Dokončení akce

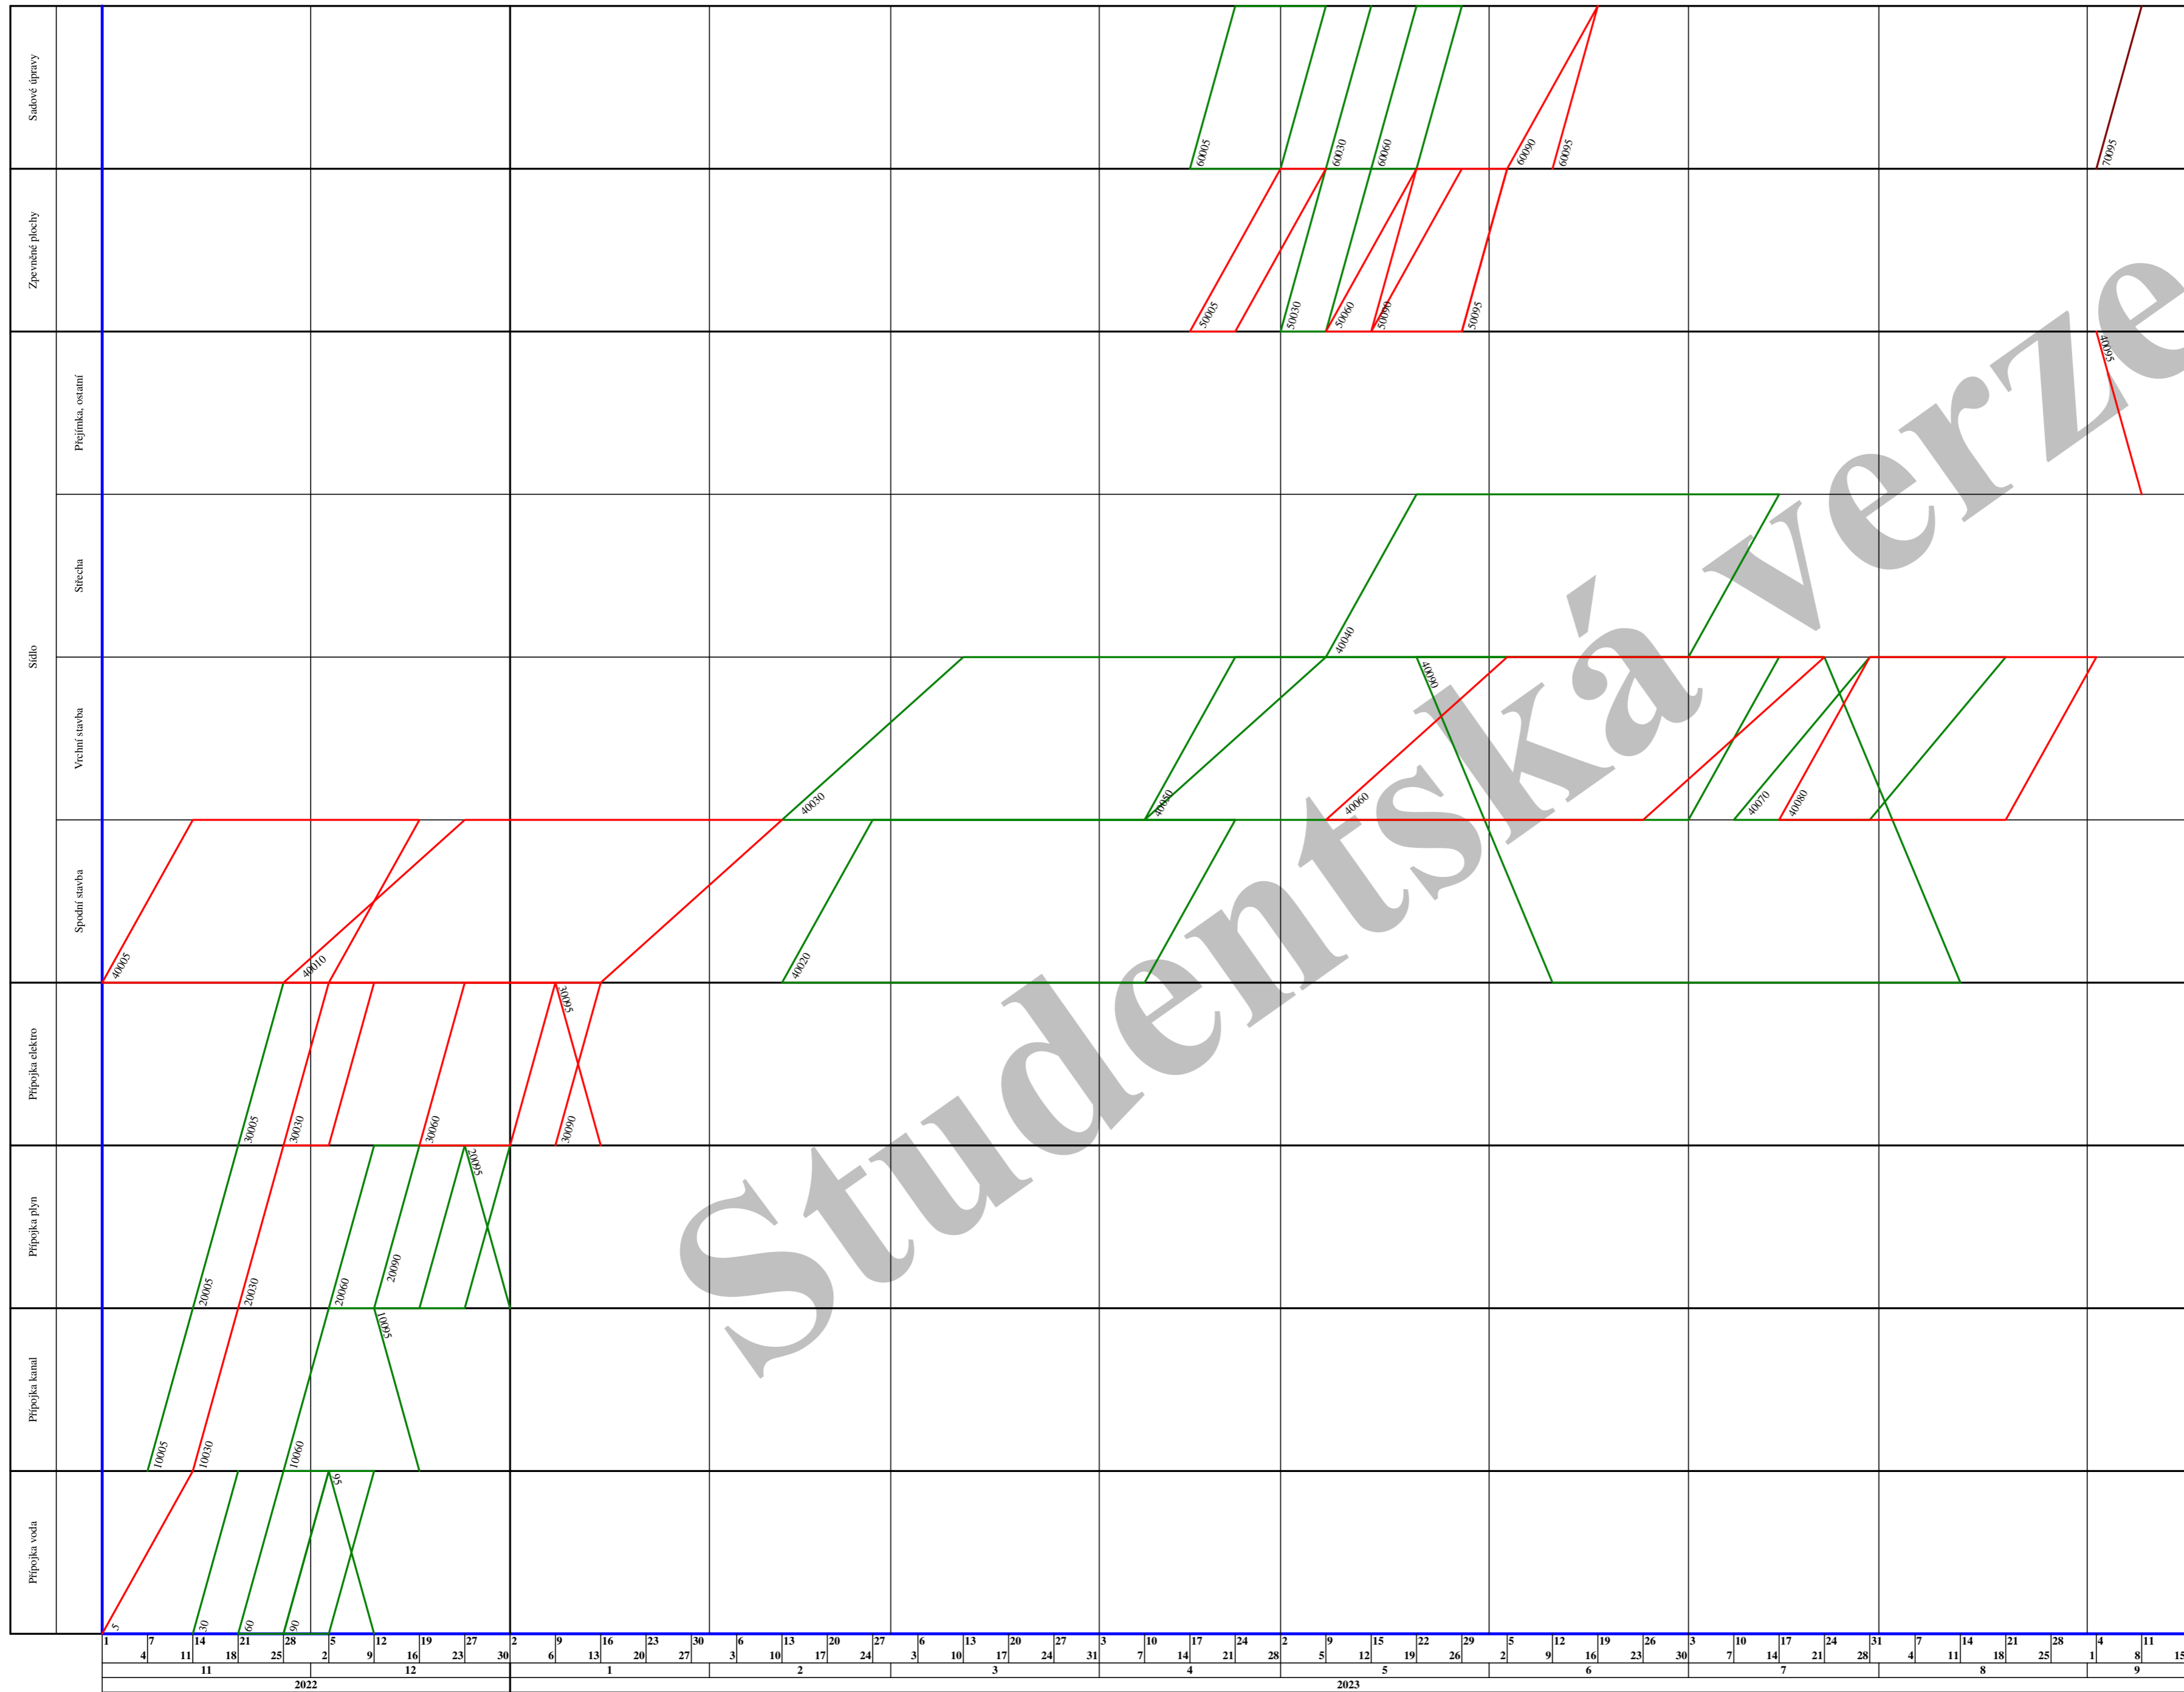


- Přípojka voda**
- 5 Zemní práce, bourání, Přípojka voda
 - 30 ŠACHTY NA POTRUBÍ, Přípojka voda
 - 60 Vlastní konstrukce, Přípojka voda
 - 90 Dokončovací konstrukce, Přípojka voda
 - 95 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka voda
 - 10005 Zemní práce, bourání, Přípojka kanál
 - 10030 PODKLAD A VEDL KONSTR IS, Přípojka kanál
 - 10060 POTRUBÍ Z PLASTU, Přípojka kanál
 - 10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka kanál
 - 20005 Zemní práce, bourání, Přípojka plyn
 - 20030 Hrubé konstrukce, Přípojka plyn
 - 20060 Vlastní konstrukce, Přípojka plyn
 - 20090 Dokončovací konstrukce, Přípojka plyn
 - 20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka plyn
 - 30005 Zemní práce, bourání, Přípojka elektro
 - 30030 Hrubé konstrukce, Přípojka elektro
 - 30060 Vlastní konstrukce, Přípojka elektro
 - 30090 Dokončovací konstrukce, Přípojka elektro
 - 30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka elektro
 - 40005 Zemní práce, bourání, Sídlo
 - 40010 Zakládání, Sídlo
 - 40020 Spodní stavba, Sídlo
 - 40030 Hrubá vrchní stavba, Sídlo
 - 40040 Střecha, Sídlo
 - 40050 Příčky,hrubé instalace, Sídlo
 - 40060 Omítky a potěry, Sídlo
 - 40070 Podlahy, povrchy, techn., Sídlo
 - 40080 Vnitřní kompletace, Sídlo
 - 40090 Vnější úpravy, Sídlo
 - 40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Sídlo
 - 50005 Zemní práce, bourání, Zpevněné plochy
 - 50030 Hrubé konstrukce, Zpevněné plochy
 - 50060 Vlastní konstrukce, Zpevněné plochy
 - 50090 Dokončovací konstrukce, Zpevněné plochy
 - 50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Zpevněné plochy
 - 60005 Zemní práce, bourání, Sadové úpravy
 - 60030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ, Sadové úpravy
 - 60060 Vlastní konstrukce, Sadové úpravy
 - 60090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU, Sadové úpravy
 - 60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Sadové úpravy
 - 70095 PŘEDÁNÍ STAVBY, Dokončení akce

— činnost kritická
— činnost zpožděná
— činnost s rezervou
— mílník
 v nejdříve možných termínech



20.12.22


Graf potřeby pracovníků celkem v měsících [Pracovníků] - průběžně

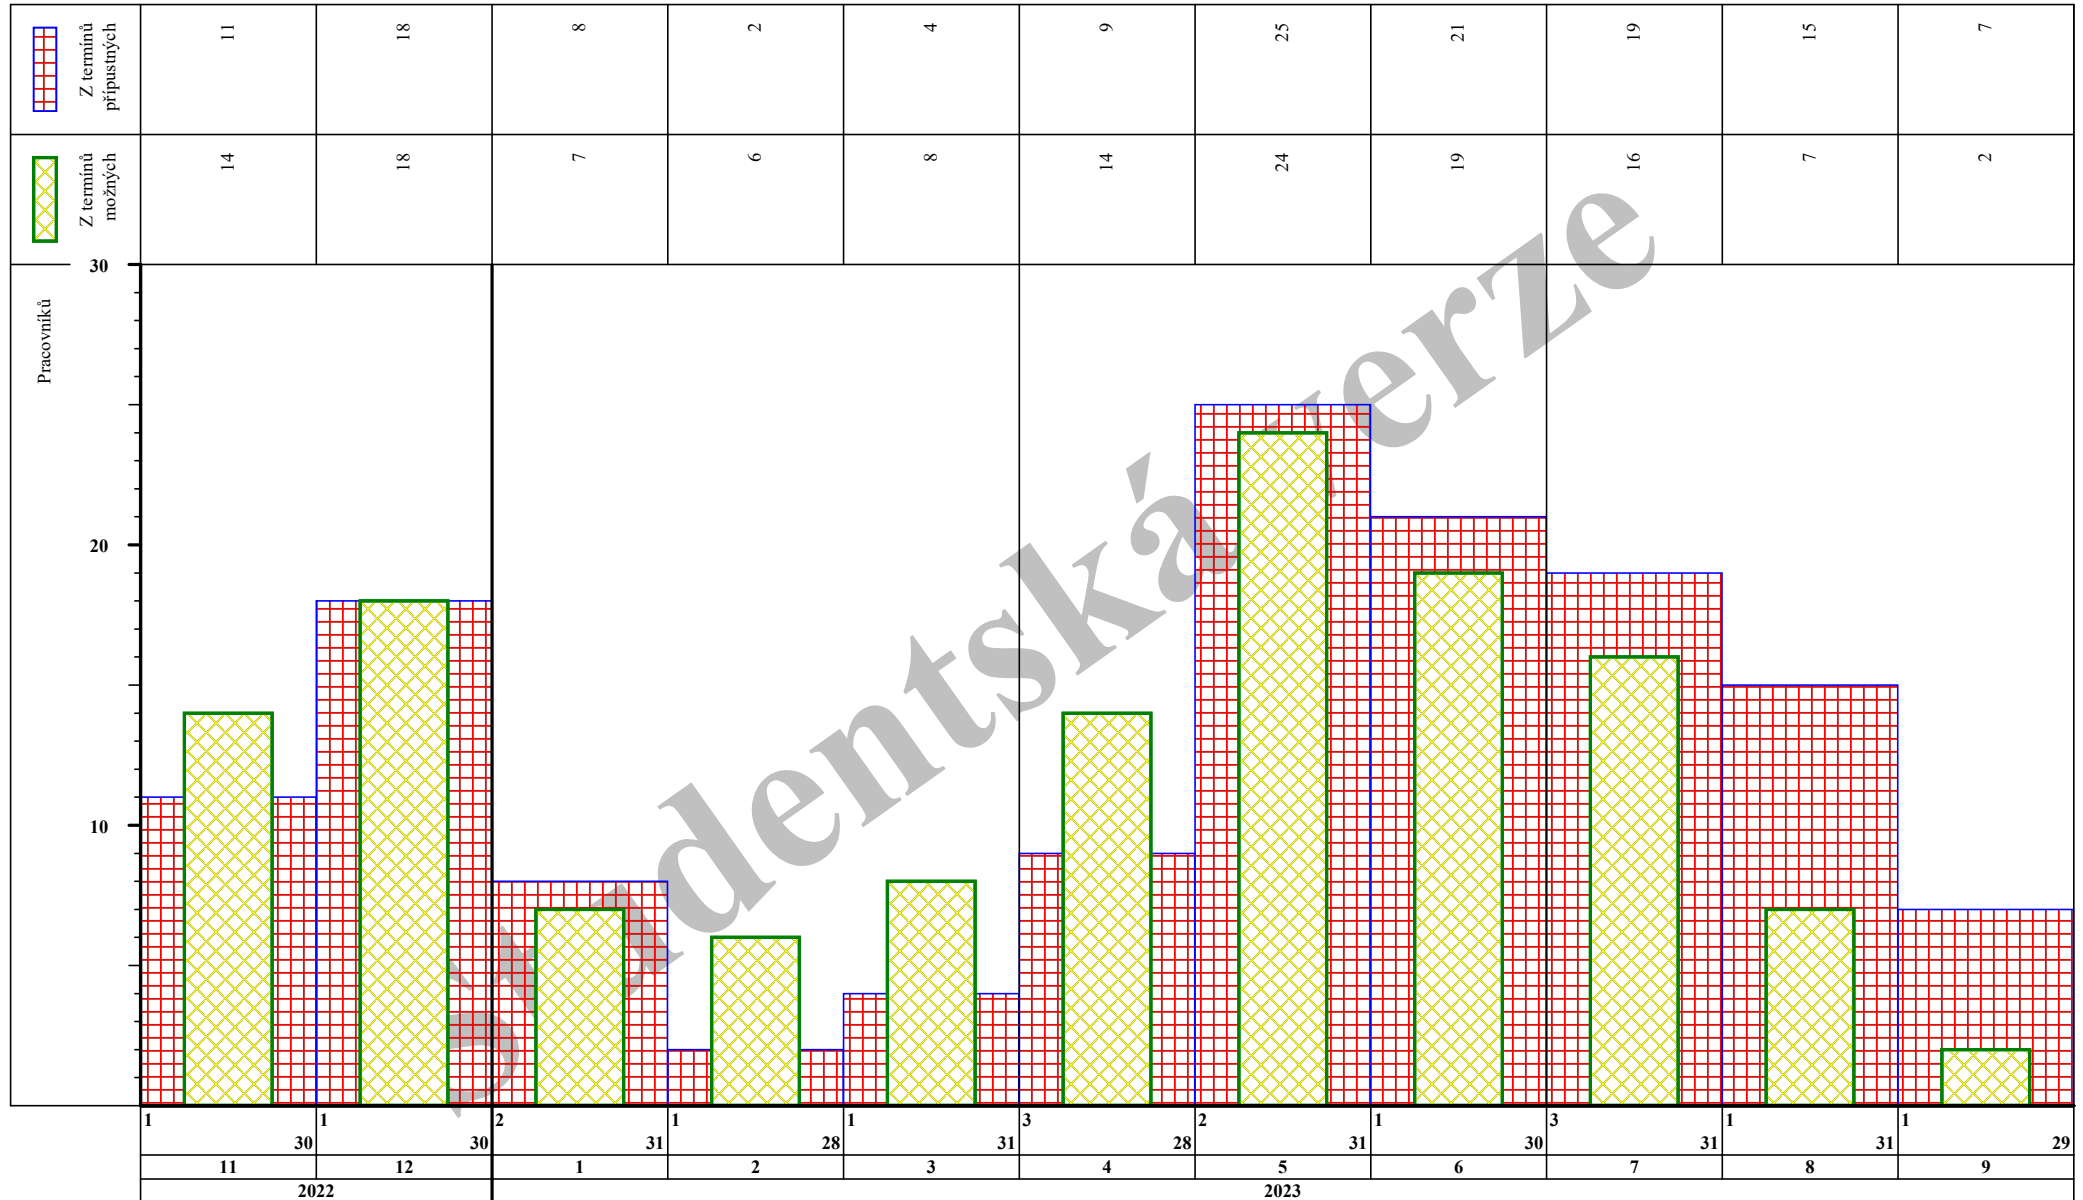



20.12.22


Graf potřeby nákladů celkem v měsících [Tisíc Kč] - průběžně

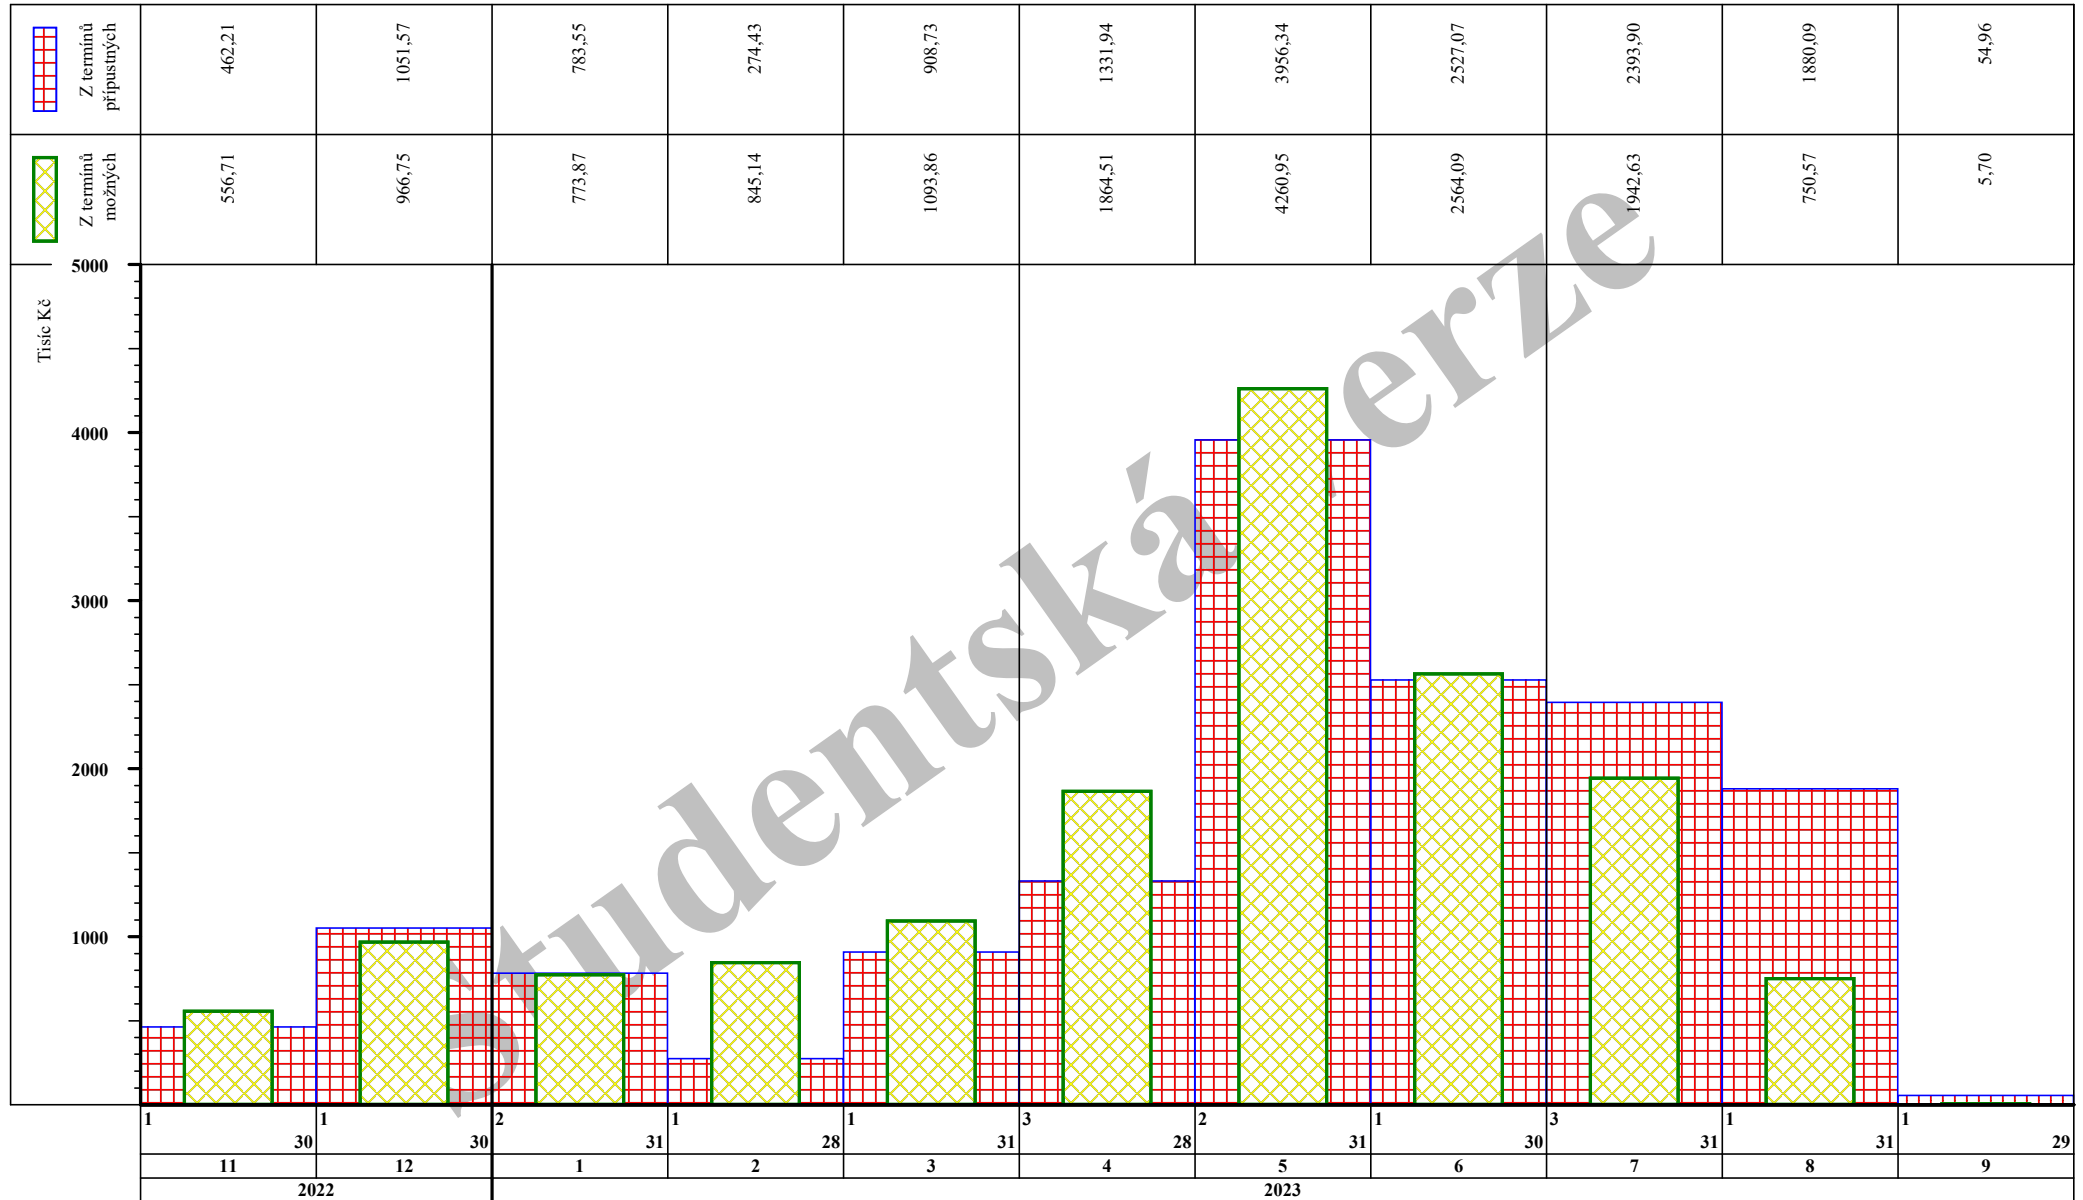



20.12.22


Graf potřeby nákladů celkem v měsících [Tisíc Kč] - nasčítaně

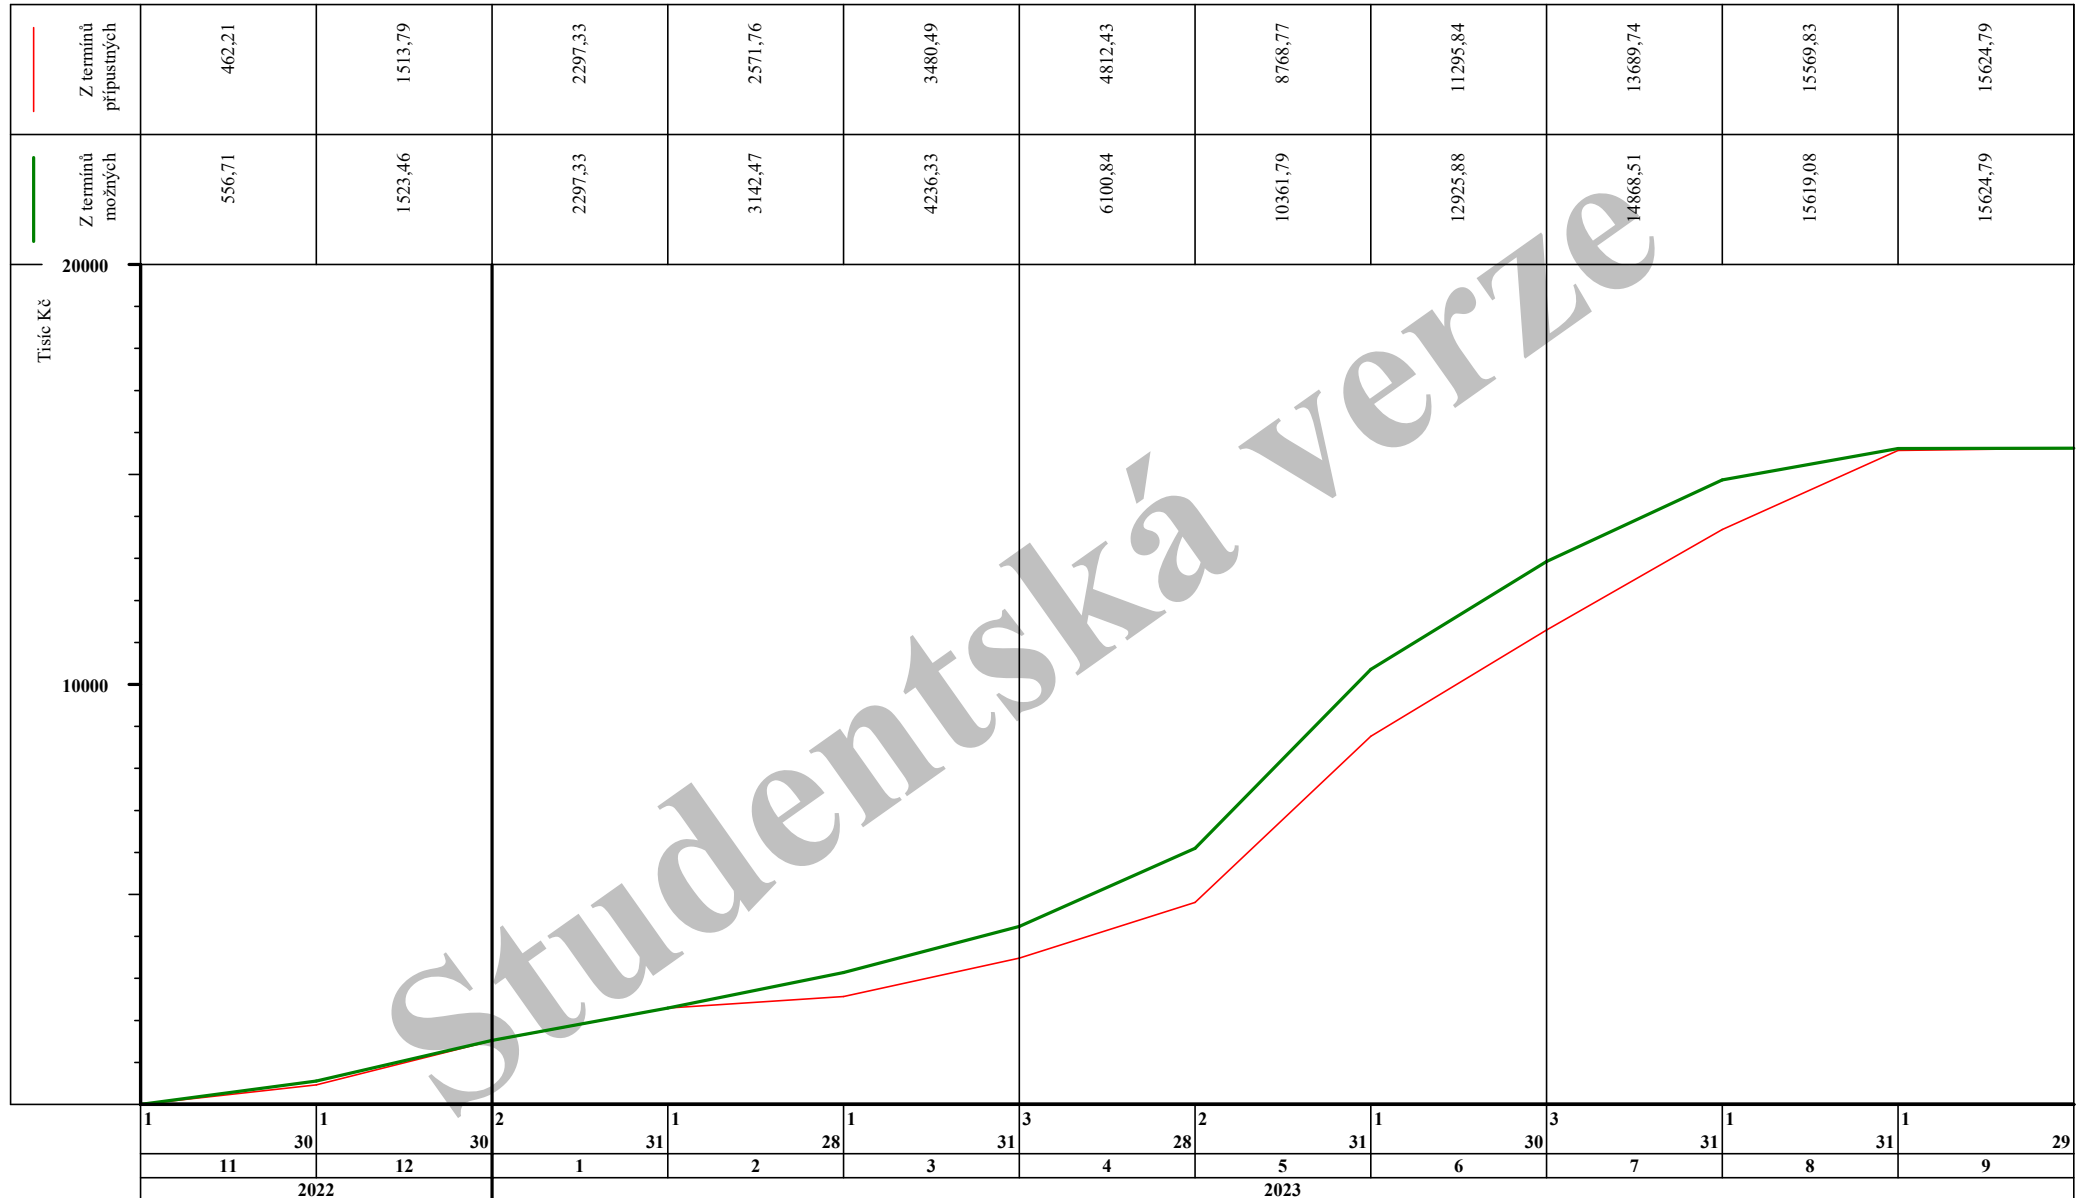



20.12.22


Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč] - průběžně

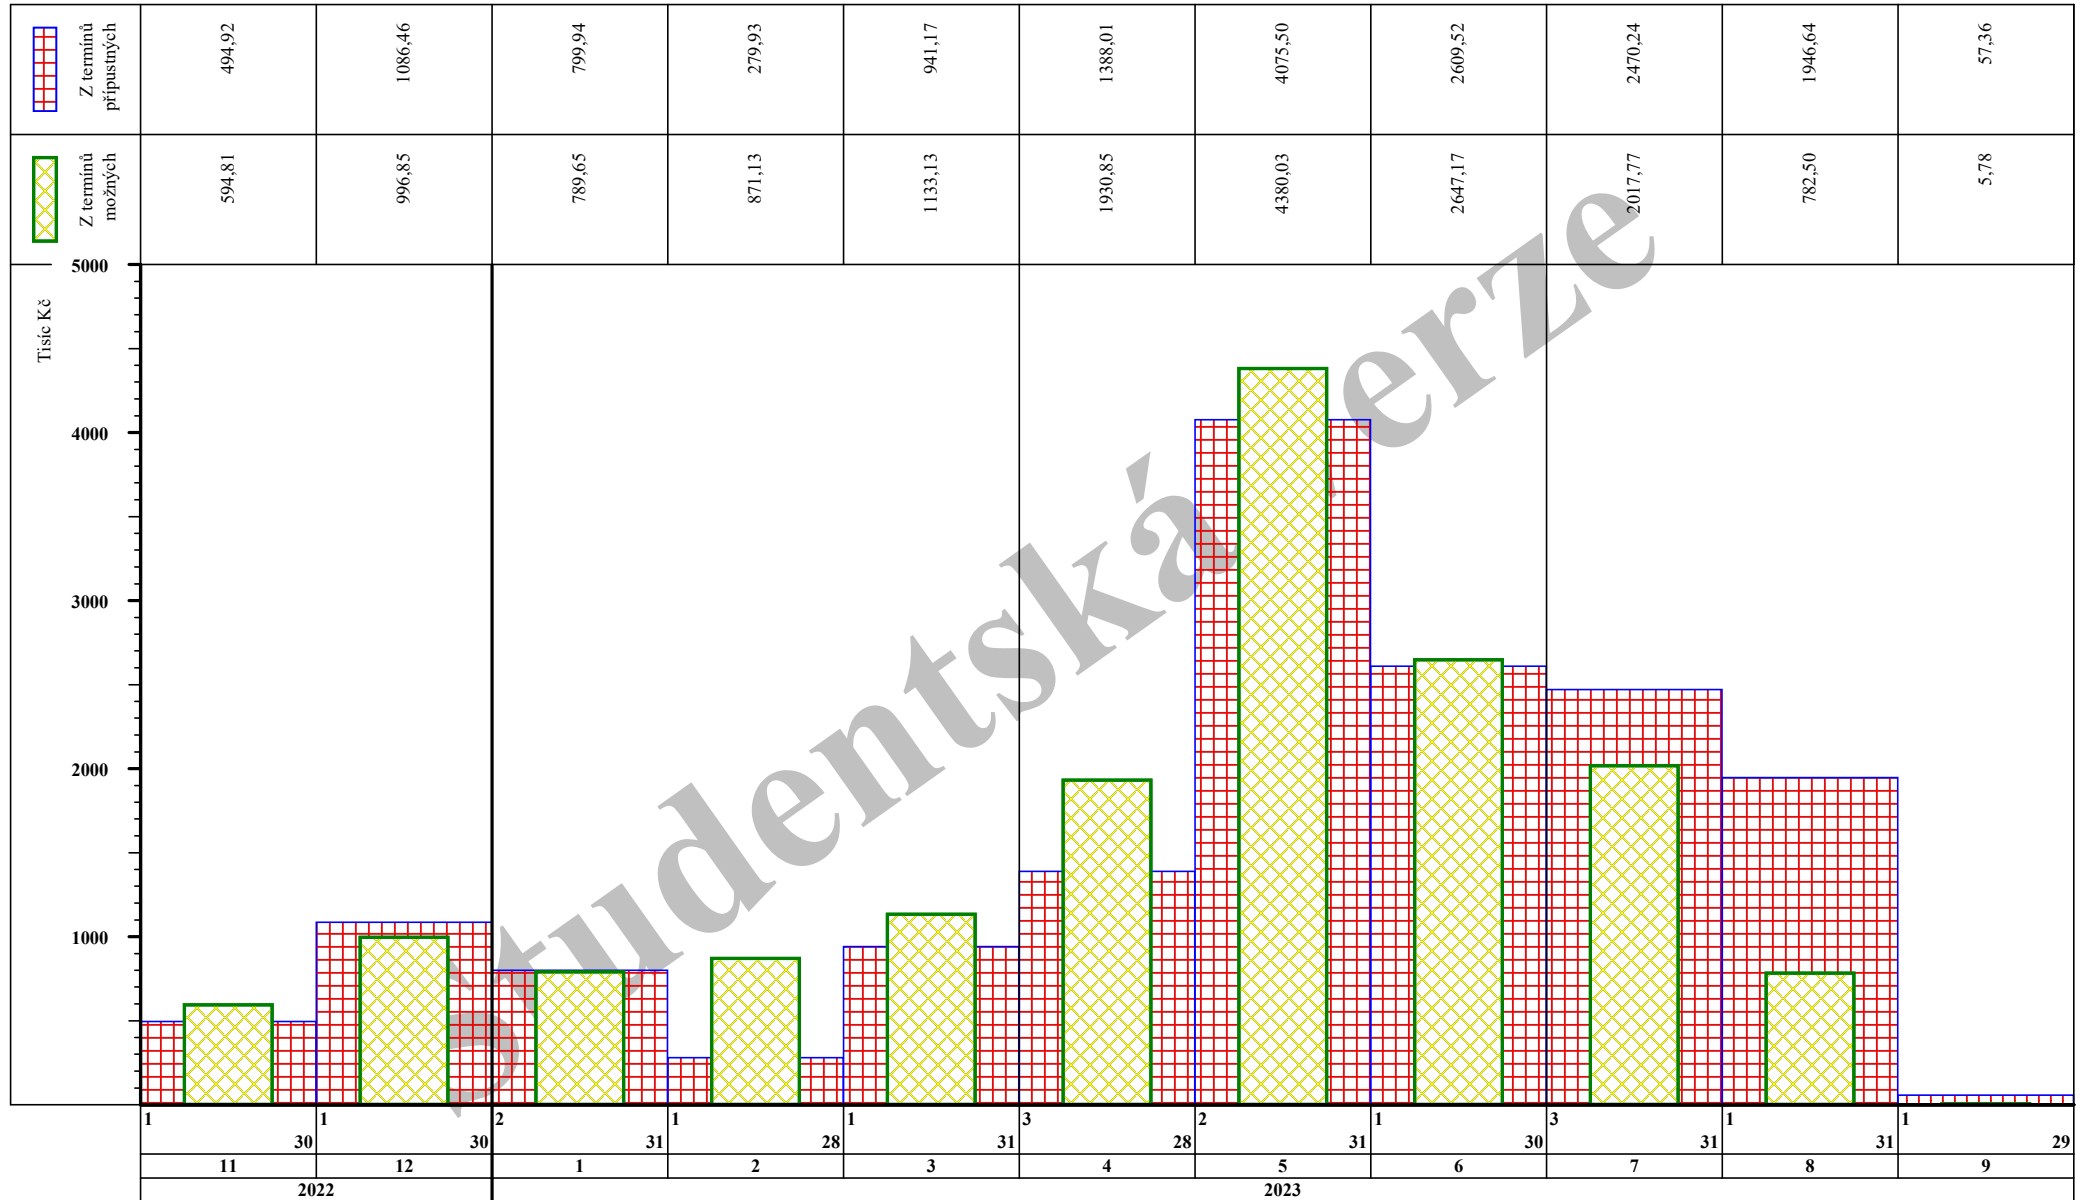



20.12.22


Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč] - nasčítaně

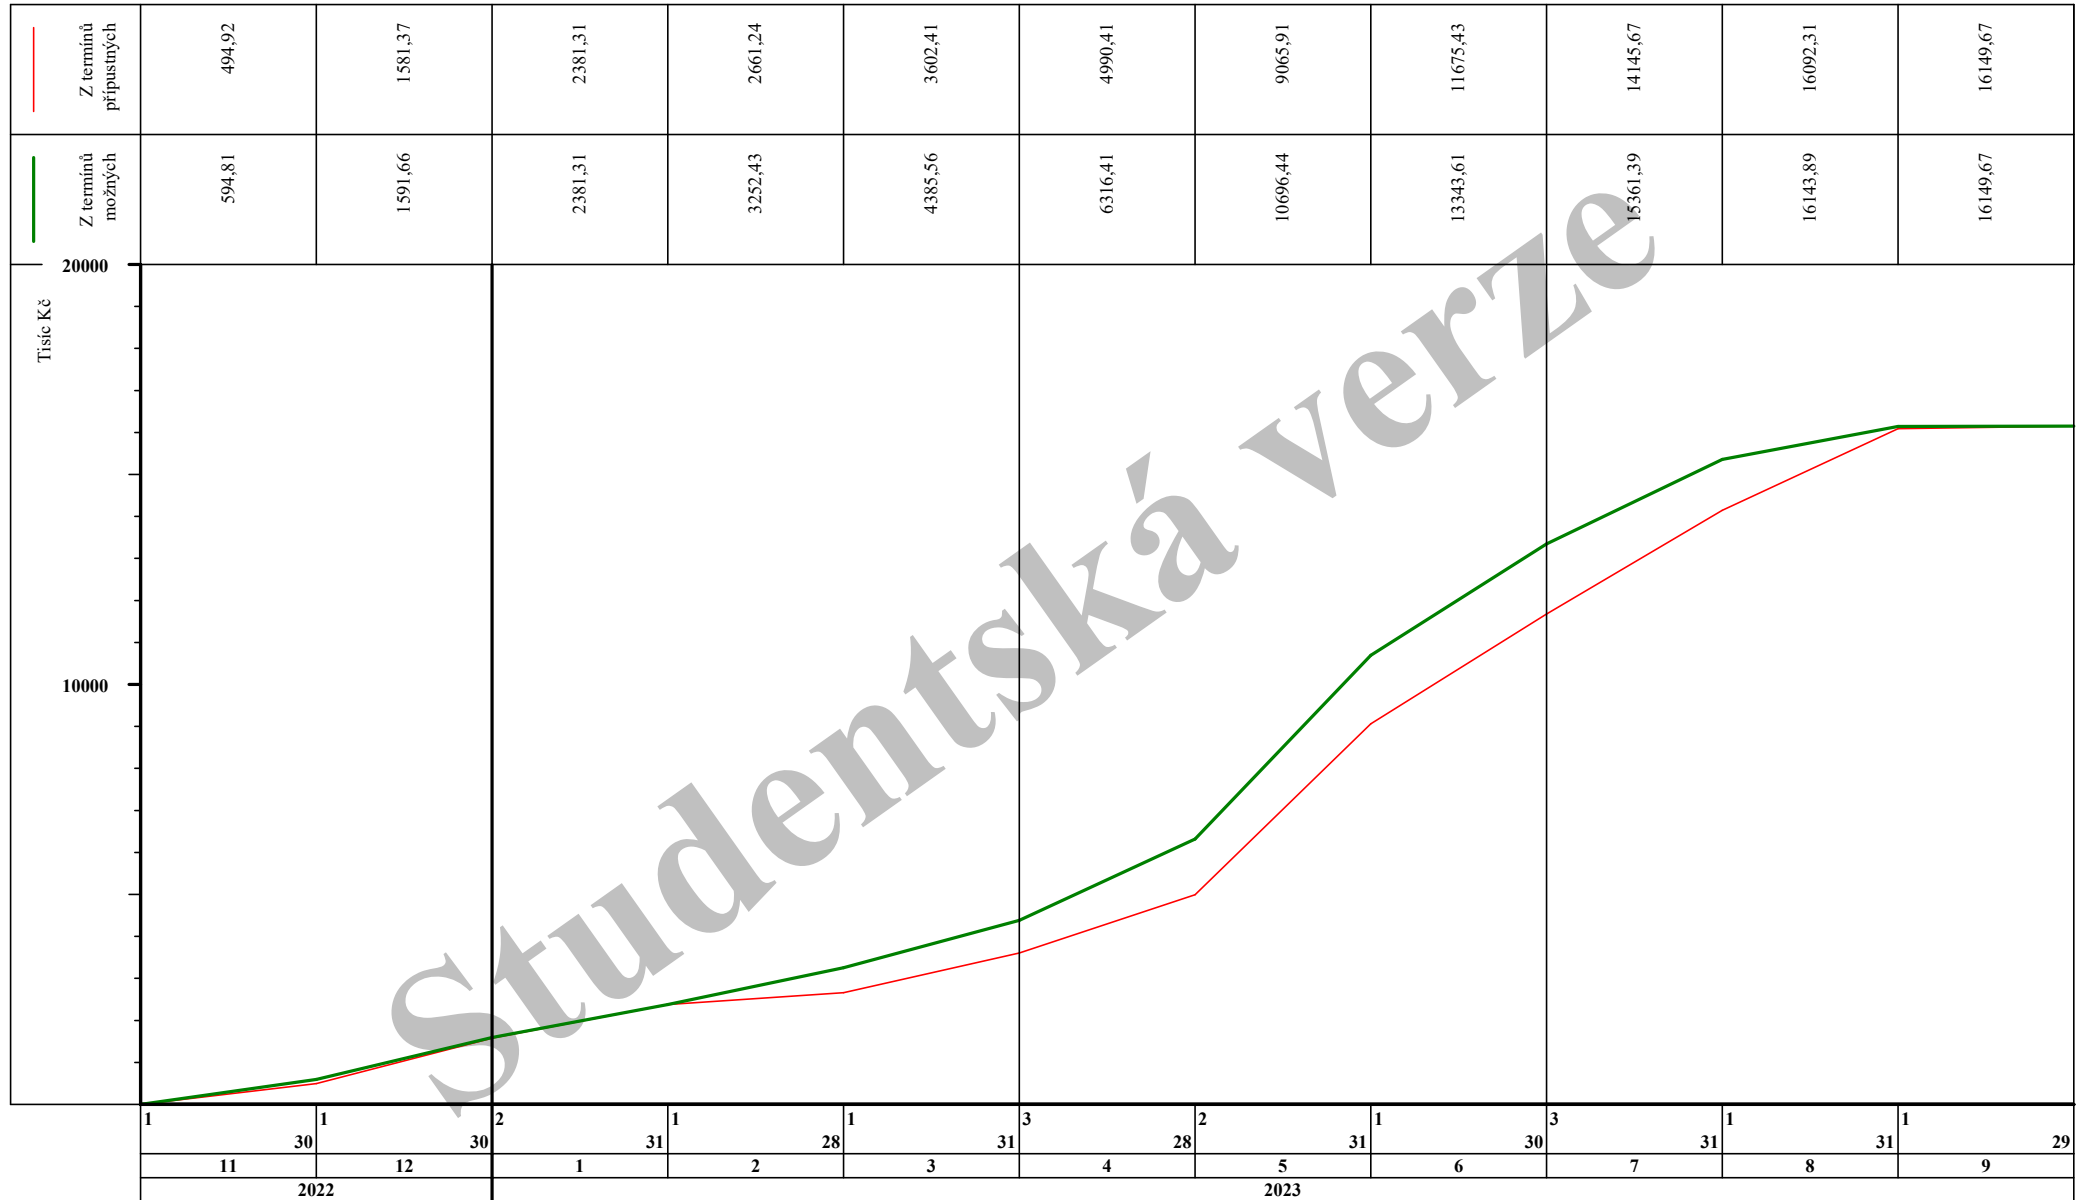



21.12.22


Graf potřeby zdroje H5893 SMĚSI PRO VÝROBU BETONU v měsících [M3] - průběžně

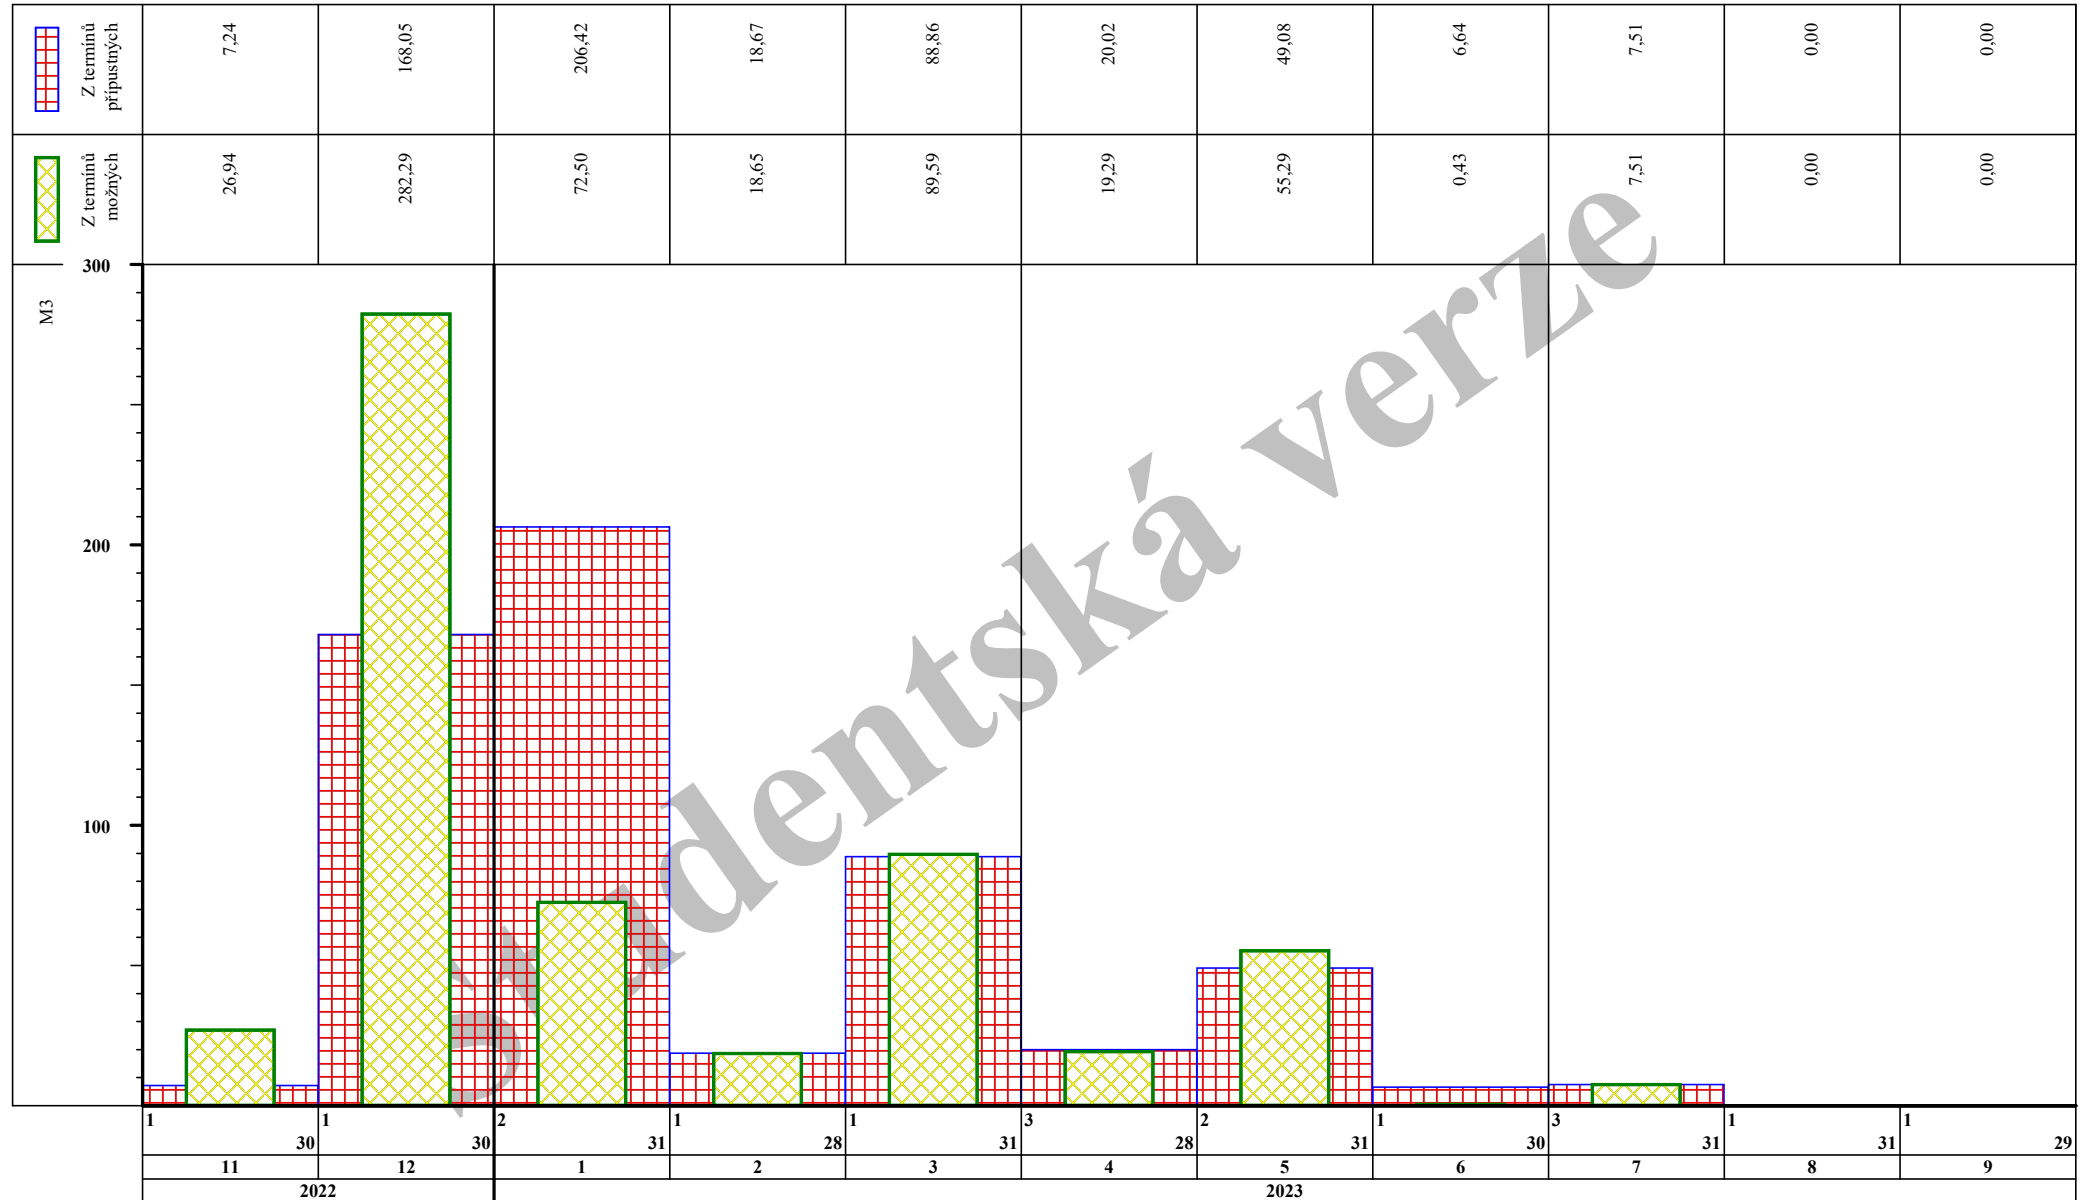



21.12.22


Graf potřeby zdroje H5893 SMĚSI PRO VÝROBU BETONU v měsících [M3] - nasčítaně

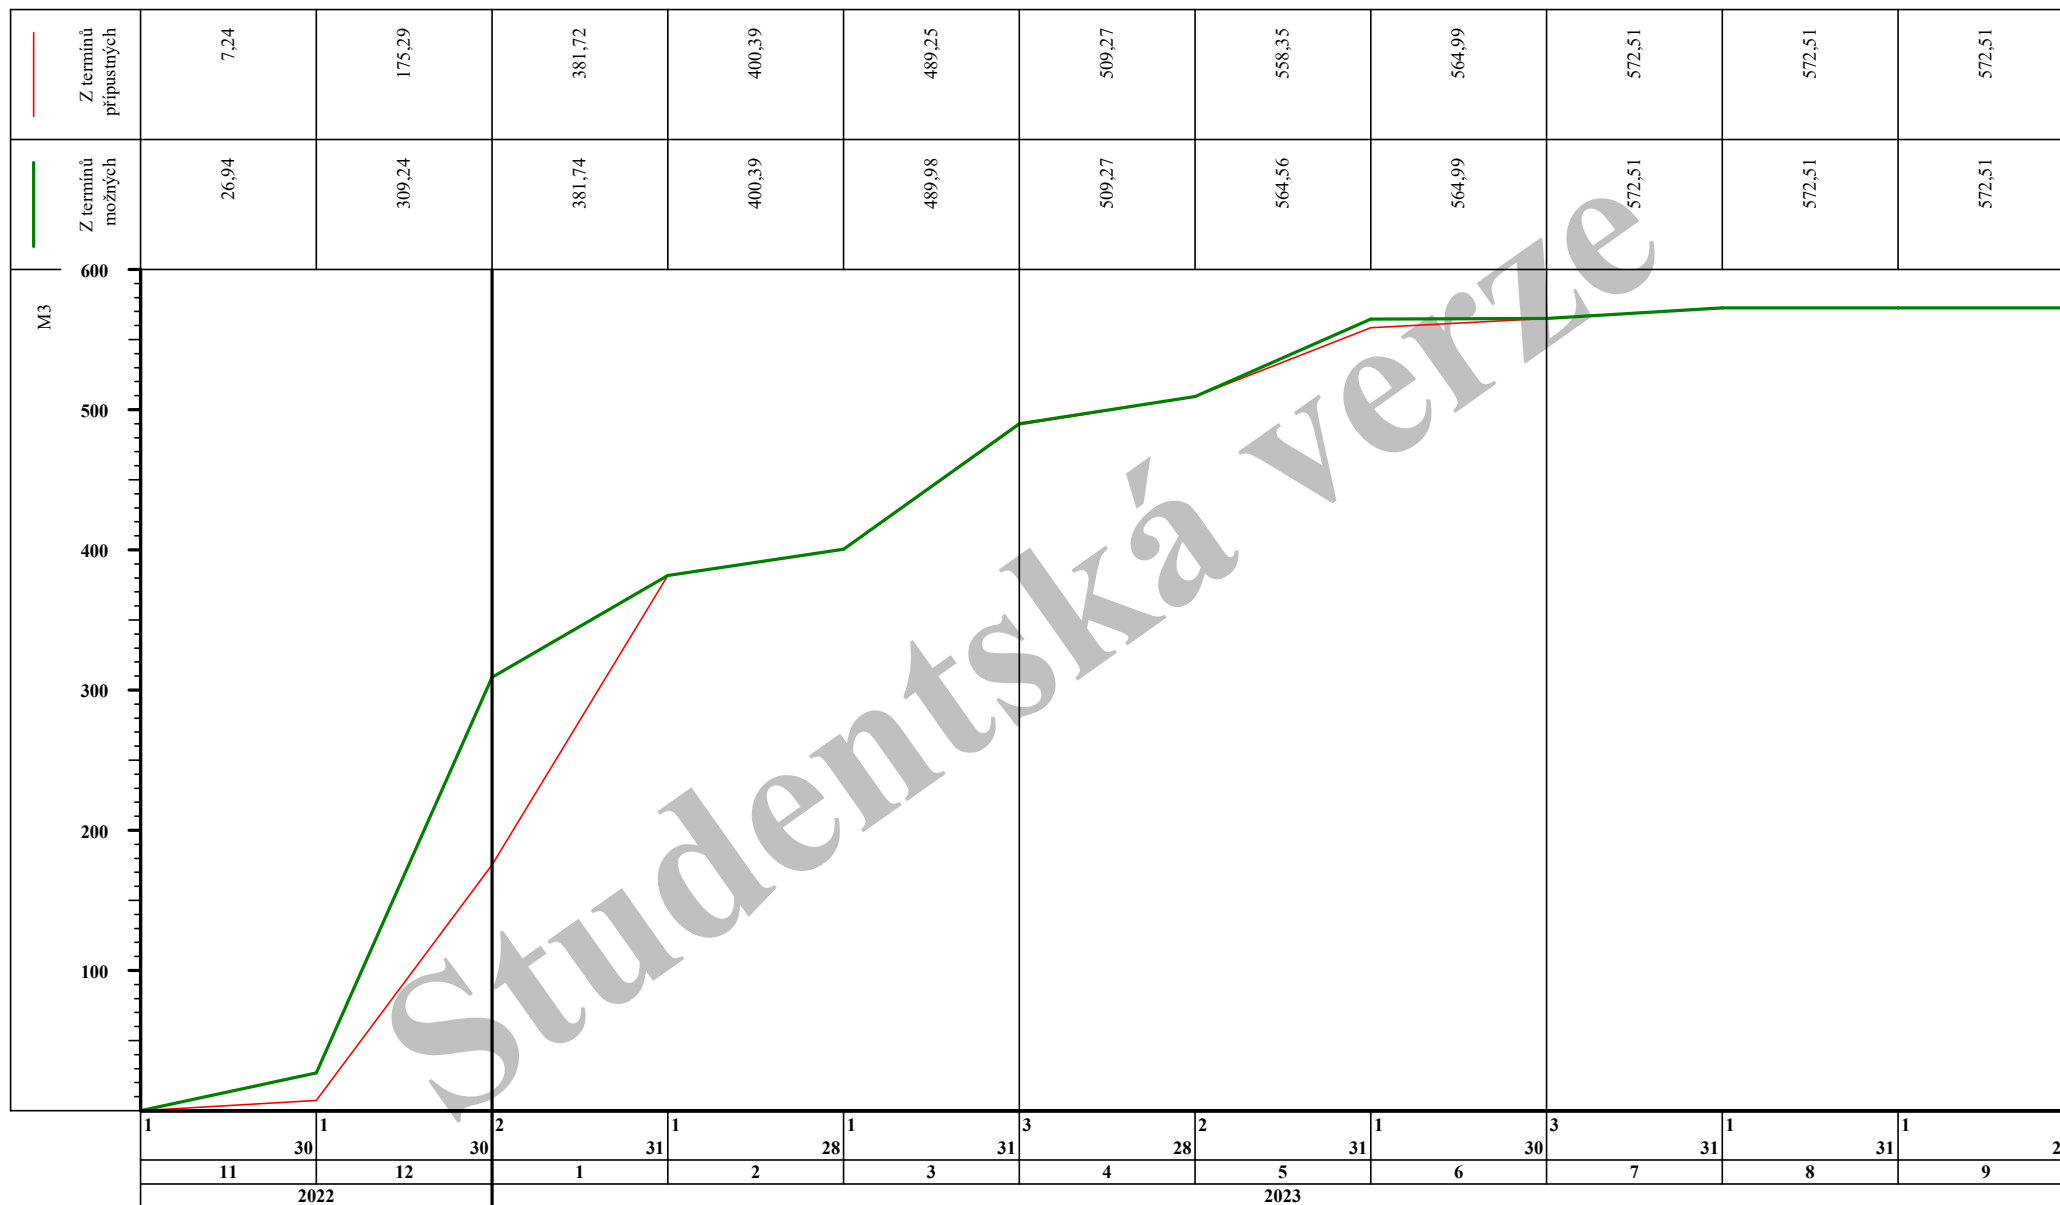



21.12.22


Graf potřeby zdroje H5961 CIHLY PÁLENÉ v měsících [M3] - průběžně

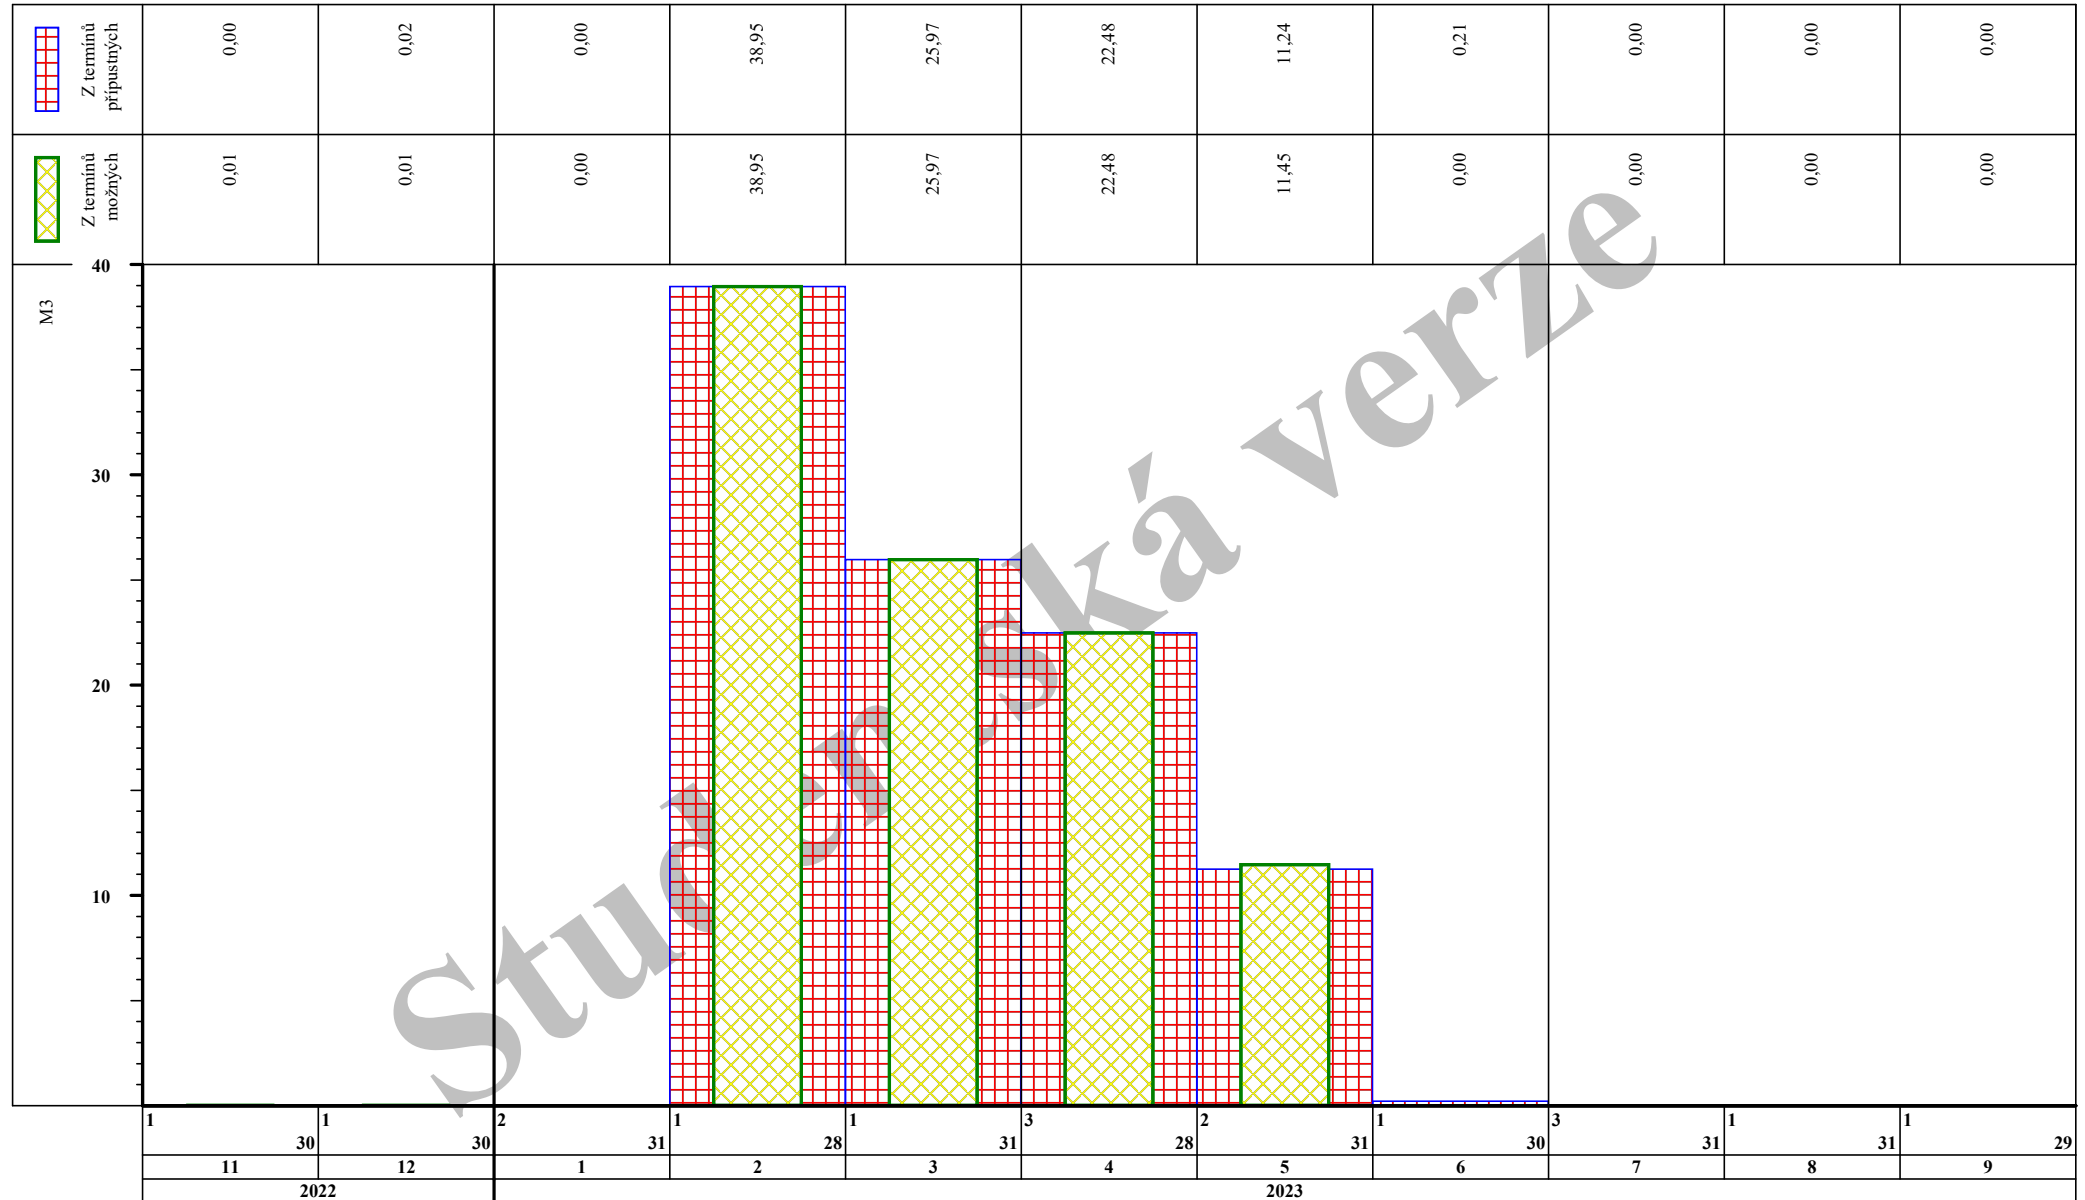



21.12.22

Graf potřeby zdroje H5961 CIHLY PÁLENÉ v měsících [M3] - nasčítaně

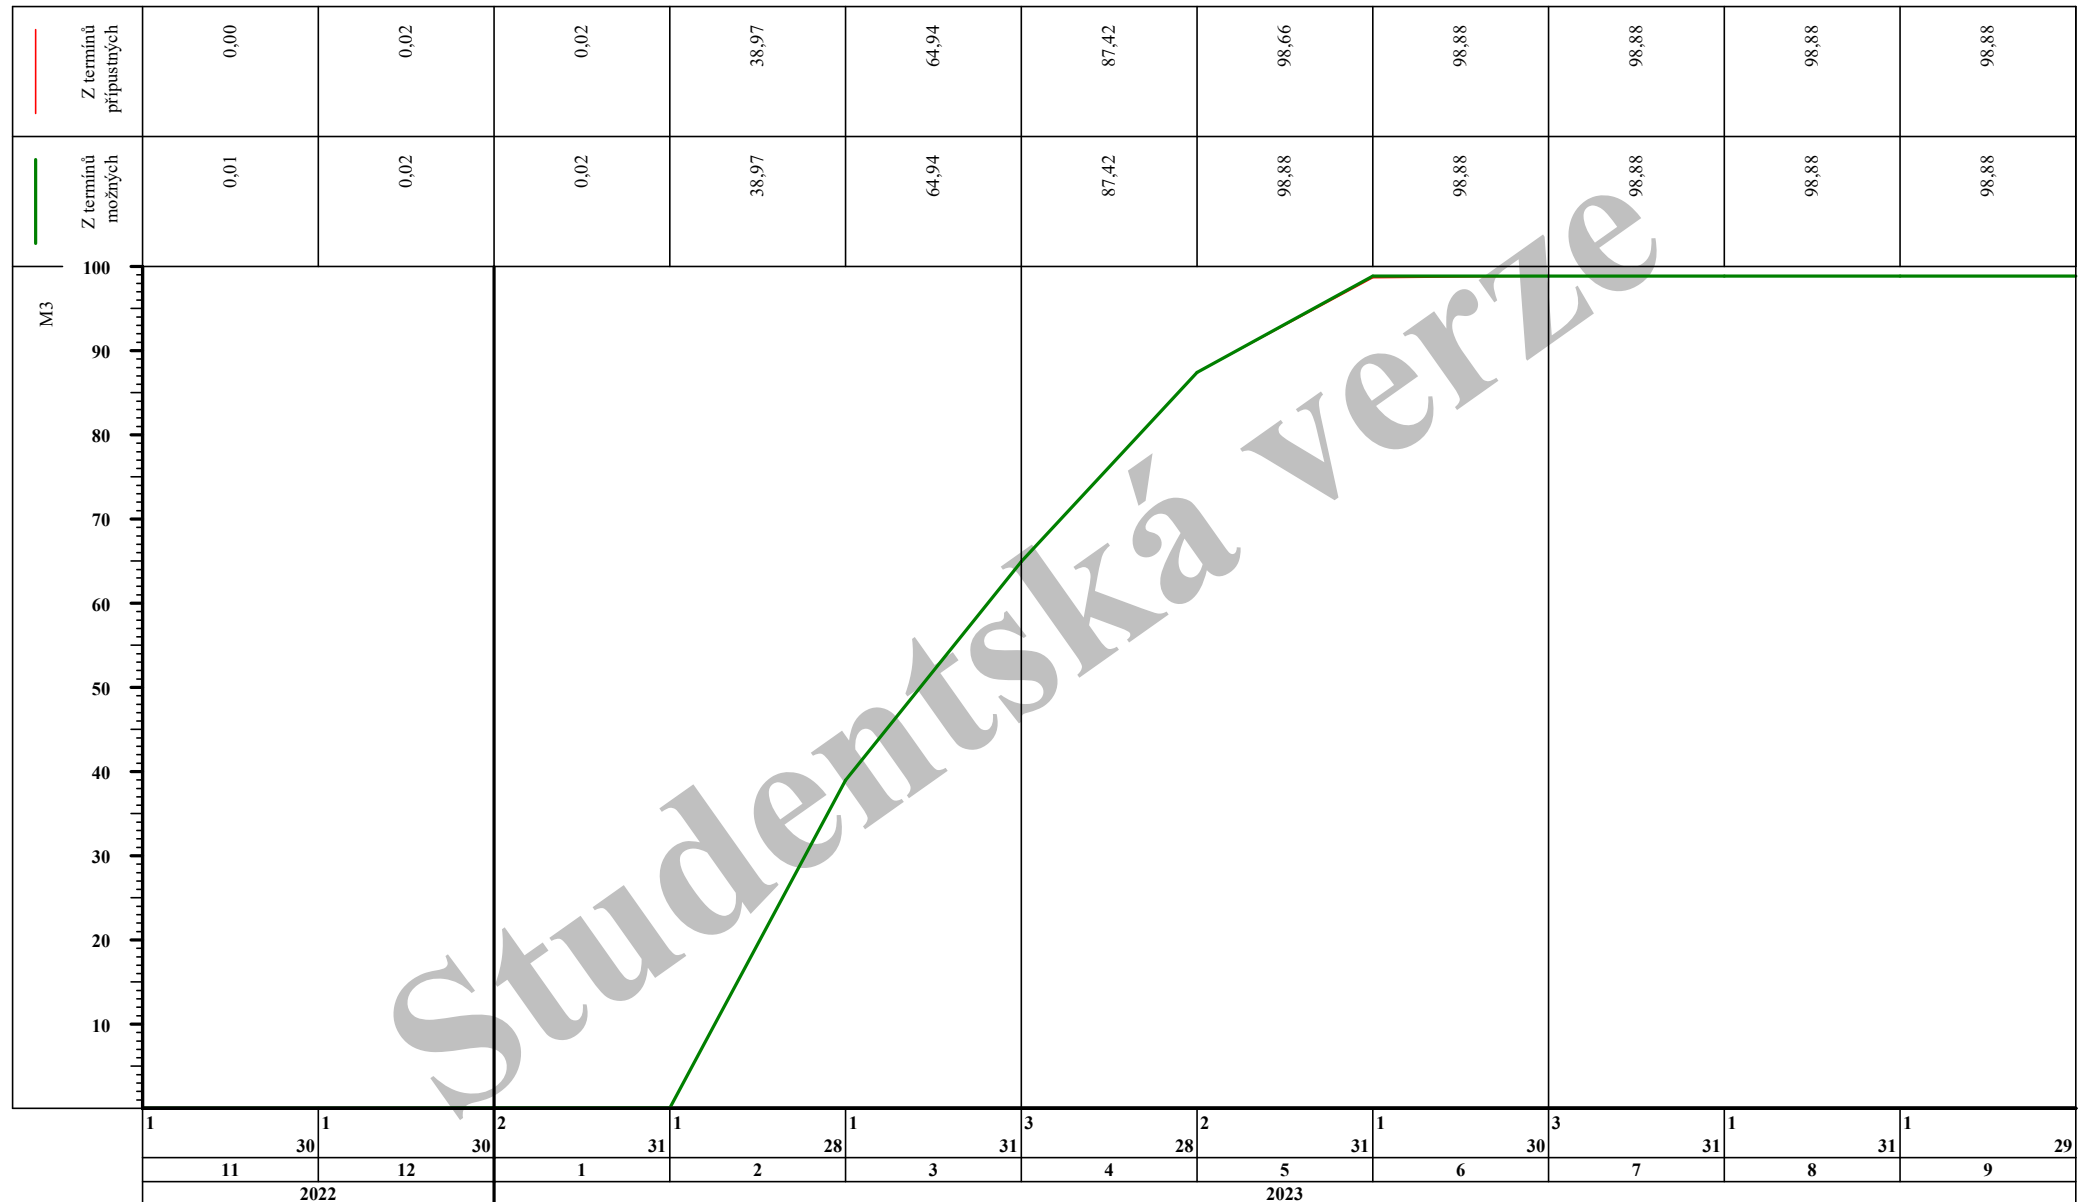

21.12.22

Přípojka voda

Index Dodav.	Název činnosti Směnost	Strojů	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	2022												2023																																								
							11					12					1			2			3			4			5			6			7			8			9																		
							1	7	14	21	28	5	12	19	27	30	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	6	13	20	27	3	6	13	20	27	3	7	14	21	28	5	9	15	22	29	5	9	16	23	30	3	7	14	21	28	31	7	14	21
1015	KOMPAKT. 1 Přípojka voda	1	1	1	1.11.22	4.11.22	KOMPAKT.																																																				
1018	NAKLADAC 1 Přípojka voda	1	1	1	5.12.22	9.12.22	NAKLADAC																																																				
1021	RYPADLO 1 Přípojka voda	1	1	0	1.11.22	4.11.22	RYPADLO																																																				
1024	SKLAPEC 1 Přípojka voda	1	1	1	1.11.22	4.11.22	SKLAPEC																																																				
11015	KOMPAKT. 1 Přípojka kanal	1	1	1	7.11.22	11.11.22	KOMPAKT.																																																				
11021	RYPADLO 1 Přípojka kanal	1	1	0	7.11.22	11.11.22	RYPADLO																																																				
11024	SKLAPEC 1 Přípojka kanal	1	1	1	7.11.22	11.11.22	SKLAPEC																																																				
21006	DOZER 1 Přípojka plyn	1	1	1	27.12.22	30.12.22	DOZER																																																				
21009	GRADER 1 Přípojka plyn	1	1	1	27.12.22	30.12.22	GRADER																																																				
21015	KOMPAKT. 1 Přípojka plyn	1	1	1	14.11.22	18.11.22	KOMPAKT.																																																				
21018	NAKLADAC 1 Přípojka plyn	1	1	1	19.12.22	23.12.22	NAKLADAC																																																				
21021	RYPADLO 1 Přípojka plyn	1	1	0	14.11.22	18.11.22	RYPADLO																																																				
21024	SKLAPEC 1 Přípojka plyn	1	1	1	14.11.22	18.11.22	SKLAPEC																																																				
31006	DOZER 1 Přípojka elektro	1	1	0	9.1.23	13.1.23	DOZER																																																				
31009	GRADER 1 Přípojka elektro	1	1	0	9.1.23	13.1.23	GRADER																																																				
31015	KOMPAKT. 1 Přípojka elektro	1	1	1	21.11.22	25.11.22	KOMPAKT.																																																				
31018	NAKLADAC 1 Přípojka elektro	1	1	0	27.12.22	30.12.22	NAKLADAC																																																				
31021	RYPADLO 1 Přípojka elektro	1	1	0	21.11.22	25.11.22	RYPADLO																																																				
31024	SKLAPEC 1 Přípojka elektro	1	1	1	21.11.22	25.11.22	SKLAPEC																																																				
41000	AUTOJER. 1 Sídlo	3	8	3	13.2.23	7.4.23	AUTOJER.																																																				
41003	BET.CERP 1 Sídlo	1	4	0	12.12.22	6.1.23	BET.CERP																																																				
41006	DOZER 1 Sídlo	1	41	3	1.11.22	11.8.23	DOZER																																																				
41009	GRADER 1 Sídlo	1	2	3	31.7.23	11.8.23	GRADER																																																				
41012	AUTOJER 1 Sídlo	3	8	3	13.2.23	7.4.23	AUTOJER.																																																				
41018	NAKLADAC 1 Sídlo	1	19	8	1.11.22	10.3.23	NAKLADAC																																																				
41021	RYPADLO 1 Sídlo	1	6	0	1.11.22	9.12.22	RYPADLO																																																				
41024	SKLAPEC 1 Sídlo	1	2	1	28.11.22	9.12.22	SKLAPEC																																																				
51006	DOZER 1 Zpevněné plochy	1	2	0	17.4.23	28.4.23	DOZER																																																				
51015	KOMPAKT. 1 Zpevněné plochy	1	2	0	24.4.23	5.5.23	KOMPAKT.																																																				
51018	NAKLADAC 1 Zpevněné plochy	1	3	0	17.4.23	5.5.23	NAKLADAC																																																				
51021	RYPADLO 1 Zpevněné plochy	1	2	0	17.4.23	28.4.23	RYPADLO																																																				

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezervy - - - -, milník - +, vynucený termín - - - -



20.12.22

Graf potřeby stroje AUTOJER. v měsících [strojů] - průběžně

