



Projektový plán týdenního pobytu na lodi La Grace

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem se zaměřením zejména na plánování projektu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, pojmy a postupy projektového managementu a v praktické části jsou tyto pojmy a metody využity na zpracování konkrétního projektu týdenní plavby na lodi La Grace. Hlavním cílem, a také výstupem, práce je projektový plán, který může být využit k realizaci plavby na lodi La Grace či jako inspirace pro naplánování a zrealizování podobné akce.

ABSTRACT

This bachelor's thesis deals with project management, focusing mainly on project planning. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, the methods, concepts, and procedures of project management are described and explained and in the practical part, these concepts and methods are applied to a specific project of a week-long cruise on the ship La Grace. The main objective and also the output of the thesis is a project plan that can be used to implement the La Grace cruise or as an inspiration for planning and implementing a similar event.




ROZPOČET PROJEKTU

VÝDAJE		PŘÍJMY	
pronájem lodi	387 500 Kč	peníze od lidí, co doplňují autobus	56 000 Kč
lodní kasa	142 600 Kč	sponzorský dar	100 000 Kč
pronájem autobusu	120 000 Kč	částka získaná od 31 kadetů	619 000 Kč
pojištění pro 31 kadetů	20 150 Kč		
kemp pro řidiče autobusu	7 900 Kč		
pronájem penzionu	29 350 Kč		
odměna členům projektového týmu	48 000 Kč		
administrativní náklady	7 500 Kč		
režijní náklady	12 000 Kč		
Suma náklady	775 000 Kč		775 000 Kč

CÍL PROJEKTU

Cílem tohoto projektu je naplánování a následně zrealizování týdenního pobytu na lodi La Grace v termínu 23.8. až 1.9.2024 pro 31 osob kadetské posádky s odjezdem z Železného Brodu, následně plavby podél pobřeží Itálie a navrácení opět do Železného Brodu při nepřekročení rozpočtu 20 tisíc Kč na osobu.

GANTTŮV DIAGRAM PROJEKTU

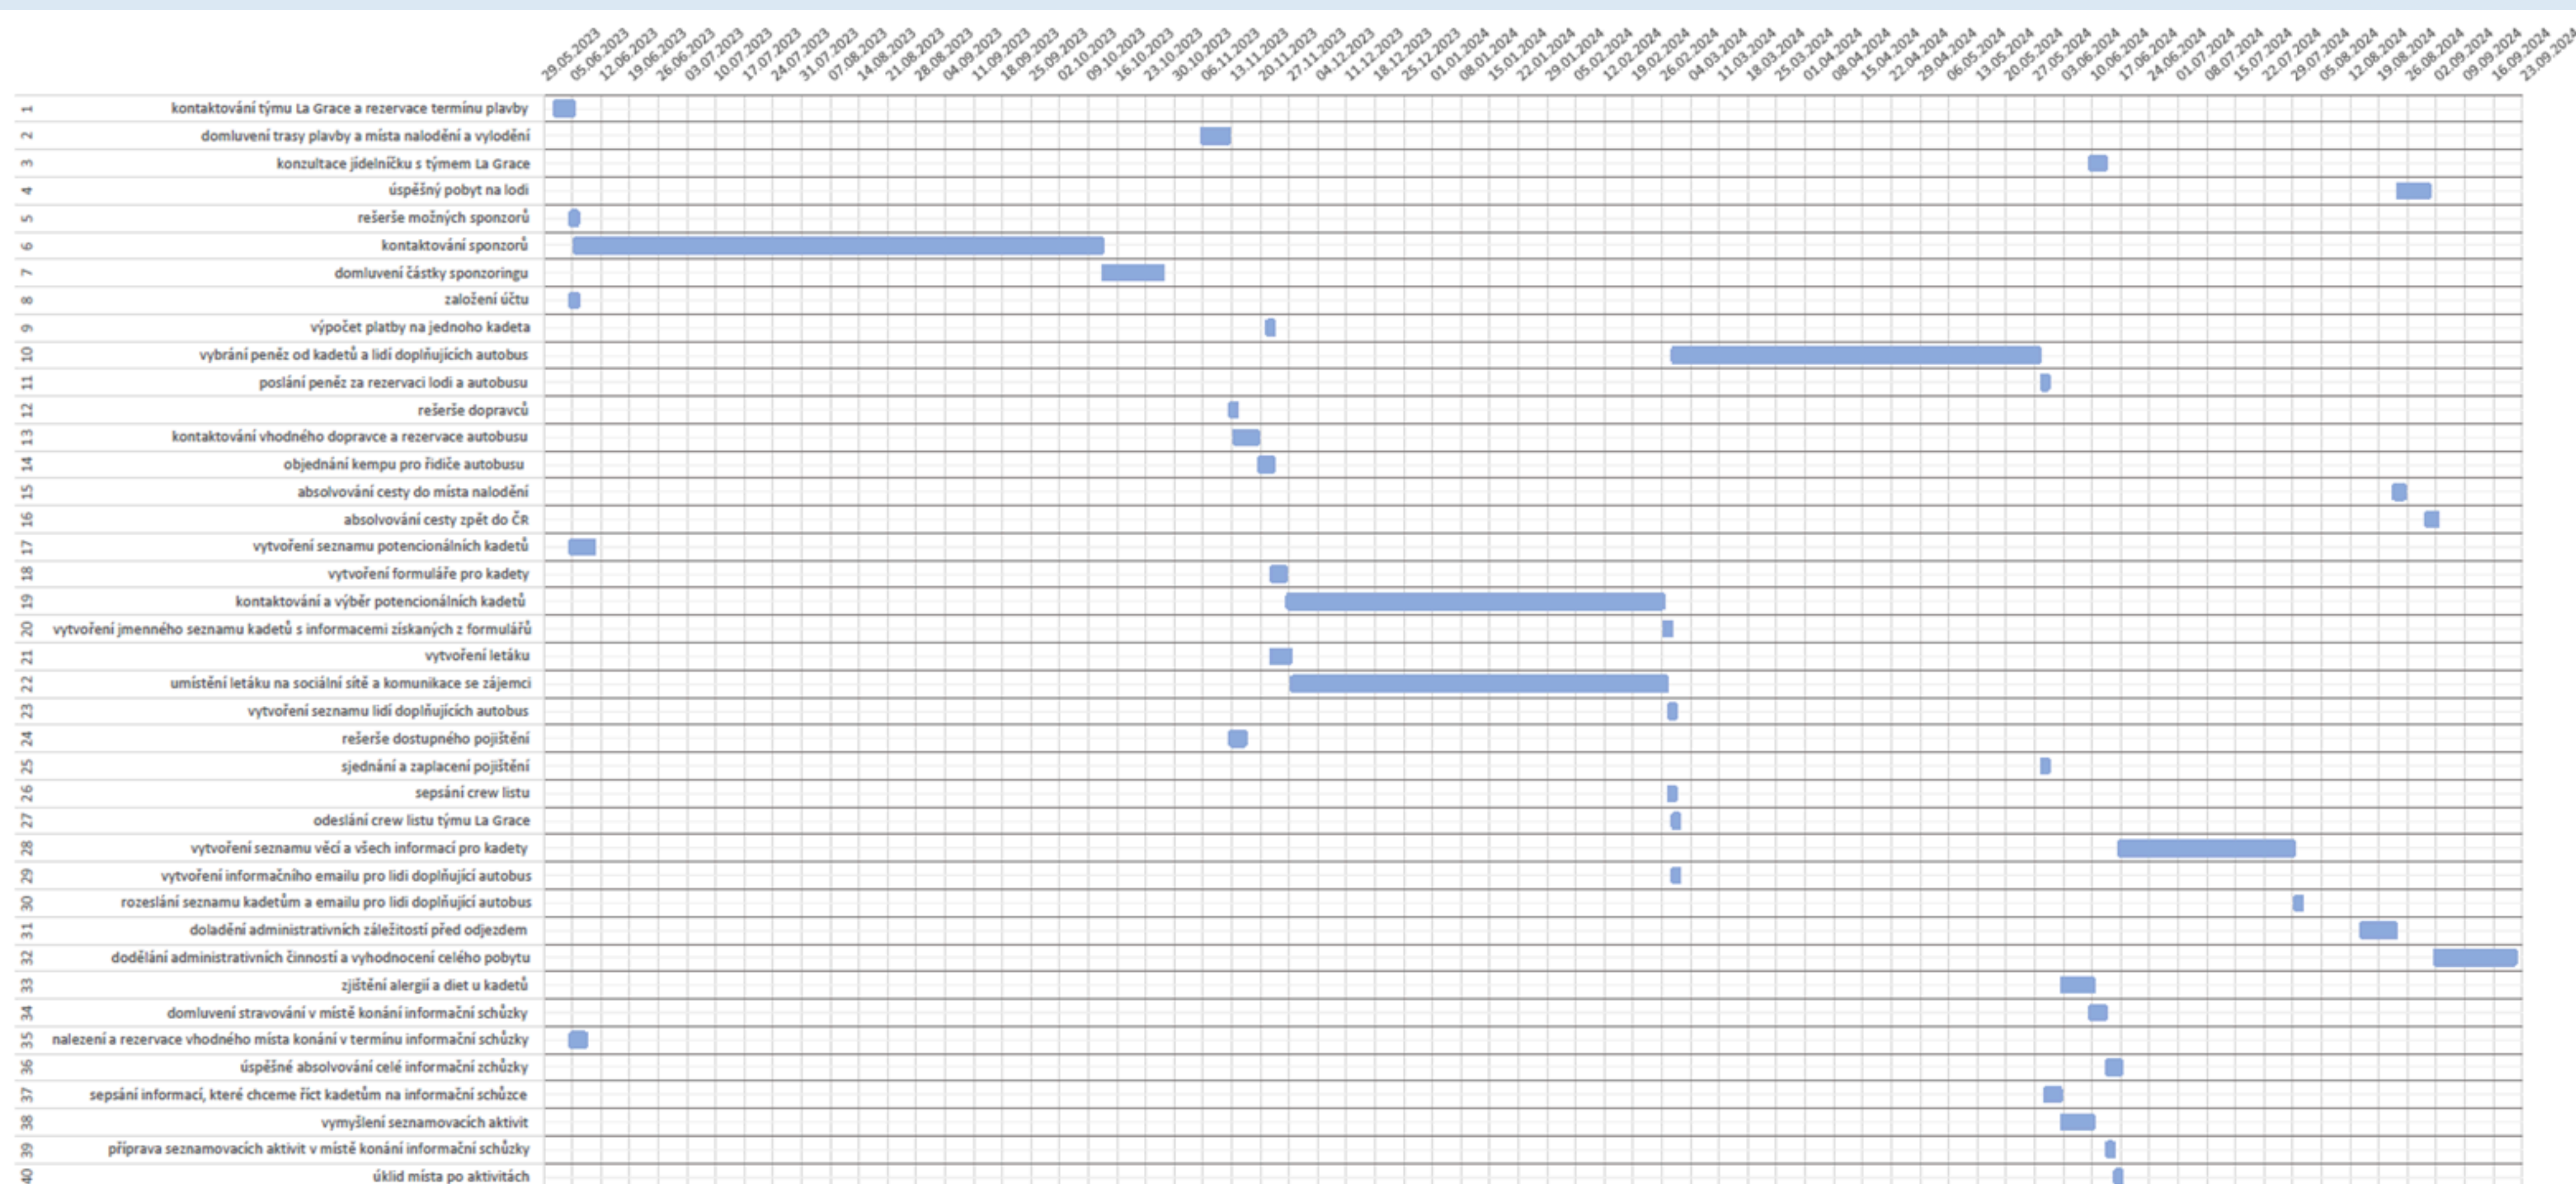

VÝSLEDKY

Z vypracovaného projektu vyplývá, že abychom dosáhli cíle, musíme se věnovat následujícím činnostem. Tedy zařídit rezervaci lodi a domluvit trasu plavby, domluvit si dopravu, sjednat pojištění, oslovit dostatečný počet potenciálních kadetů a lidí na doplnění autobusu, zajistit informační schůzku pro kadety, sehnat sponzory a zajistit spoustu administrativních činností.

Když to vezmeme detailně, zjistíme, že celý projekt tvoří 40 činností, které dohromady čistého času trvají 305 dní. Projekt je rozložen v časovém úseku od 1.6.2023 do 20.9.2024 a je zde počítáno s tím, že projektový tým bude pracovat pouze v pracovní dny, přičemž bude mít celkem 3 týdny volna, kdy se nebude realizovat žádná z aktivit.

Pro naplánování a realizaci projektu potřebujeme projektový tým o 5 členech, z nichž jeden je manažer, tři jsou plnohodnotní členové, přičemž jeden zastává funkci pomyslného účetního a poslední je posila v podobě tzv. brigádníka.

Je zapotřebí sehnat 31 lidí jakožto kadetů, plus nějaké mít jako náhradníky.

Projekt vyjde dohromady na částku 775 000 Kč po sečtení všech výdajů. K tomu, aby mohl být projekt realizován, je zapotřebí sehnat částku 100 000 Kč od sponzorů a zajistit 14 lidí, kteří budou doplňovat autobus a tým nám generovat příjem ve výši 56 000 Kč, kdy každý z těchto lidí zaplatí 4 000 Kč. Při těchto všech parametrech projektu nám vyjde částka na jednoho kadeta celých 19 968 Kč.

MATICE ZAINTERESOVANÝCH STRAN PROJEKTU

