


## Graf čerpání financí

Logistické centrum Plzeň Božkov

Stavební objekt	Postup prací	ROK MĚSÍC TÝDEN	2018																							
			Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>SO 01-04 - Stavební objekty</b>	<b>32 226 991,64 Kč</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HSV - Práce a dodávky HSV	17 099 032,05 Kč		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - Zemní práce	2 041 214,41 Kč																									
2 - Zakládání	2 977 086,11 Kč																									
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 472 988,35 Kč																									
4 - Vodorovné konstrukce	1 150 449,34 Kč																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 268 786,55 Kč																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 507,29 Kč																									
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>15 127 959,59 Kč</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 005 234,30 Kč																									
712 - Povlakové krytiny	1 115 655,56 Kč																									
713 - Izolace tepelné	1 062 378,82 Kč																									
763 - Konstrukce suché výstavby	820 091,55 Kč																									
764 - Konstrukce klempířské	68 564,65 Kč																									
766 - Konstrukce truhlářské	369 171,00 Kč																									
767 - Konstrukce zámečnické	925 363,76 Kč																									
771 - Podlahy z dlaždic	69 407,34 Kč																									
776 - Podlahy povlakové	125 901,60 Kč																									
781 - Dokončovací práce - obklady	105 705,08 Kč																									
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	74 311,31 Kč																									
721 - ZTI - Kanalizace	109 000,00 Kč																									
722 - ZTI - Vodovod	346 000,00 Kč																									
725 - ZTI - Zařizovací předměty	201 000,00 Kč																									
731 - ÚT - Kotelny	101 000,00 Kč																									
733 - ÚT - Rozvodné potrubí	251 000,00 Kč																									
735 - ÚT - Otopná tělesa	86 000,00 Kč																									
741 - Elektroinstalace - Silnoproud	2 117 000,00 Kč																									
742 - Elektroinstalace - Slaboproud	455 000,00 Kč																									
751 - Technologická zařízení - Vzduchotechnika	1 064 000,00 Kč																									
767 - Oplocení	185 000,00 Kč																									
871 - Vedení dálková a přípojná - z plastických hmot	3 932 000,00 Kč																									
882 - Vedení dálková a přípojná - vedení elektro podzemní	95 200,00 Kč																									
894 - Vedení dálková a přípojná - šachty kanalizační	75 000,00 Kč																									
998 - Přesun hmot a manipulace se sutí	368 974,62 Kč																									
<b>00 - Zpevněné plochy</b>	<b>8 676 353,80 Kč</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HSV - Práce a dodávky HSV	8 676 353,80 Kč		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - Zemní práce	2 850 516,47 Kč																									
2 - Zakládání	11 942,00 Kč																									
5 - Komunikace pozemní	5 355 002,26 Kč																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 849,75 Kč																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	252 593,66 Kč																									
998 - Přesun hmot	53 449,66 Kč																									
<b>Suma bez DPH</b>	<b>40 903 345,44 Kč</b>		-	4 729 183 Kč	9 139 922 Kč	10 239 251 Kč	11 206 551 Kč	4 900 629 Kč	687 809 Kč																	
<b>Suma s DPH (21 %)</b>	<b>49 493 047,99 Kč</b>		-	<b>5 722 312 Kč</b>	<b>11 059 306 Kč</b>	<b>12 389 493 Kč</b>	<b>13 559 927 Kč</b>	<b>5 929 761 Kč</b>	<b>832 249 Kč</b>																	
<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>40 903 345 Kč</b>																									
<b>Celková suma s DPH (21 %)</b>	<b>49 493 048 Kč</b>																									

Pozn.: Cenové kalkulace neuvedené v rozpočtu ARS tohoto stavebně technologického projektu vychází z nákladových kalkulací firmy Mobets a.s., která tento projekt realizovala.

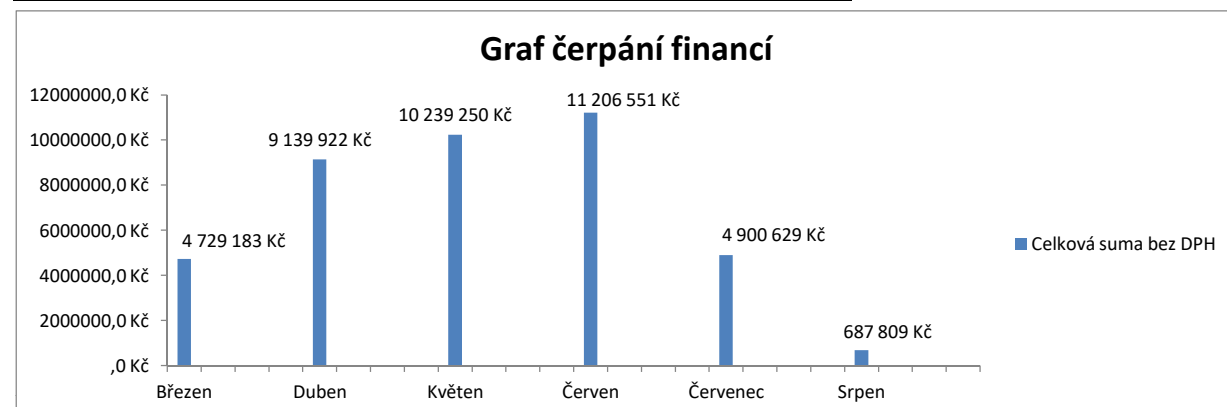

Zpracoval Bc. Dan Kládívko	Konzultant Ing. Karel Polák, PhD.	Rok 2018/2019	Fakulta stavební <b>ČVUT</b> 
Předmět: Diplomová práce	Úloha: Řešení časové struktury		
Výkres: <b>Graf čerpání financí</b>			Meřítko -
			Číslo výkresu 4.3
